



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 23 de novembro 2022.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 229/2022-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 767.876,56	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 23/11/2022	13,90	106.772,00	86,10	R\$ 661.104,56
A liberar 2. ^a Parcela em				
A liberar 3. ^a Parcela em				
A liberar 4. ^a Parcela em				

Valor a ser liberado em 23/11/2022 R\$ 106.772,00

Gestora e fiscal do contrato.

Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato

Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO	0	TRÓCA DE TELHADOS		22/09/22	Nº MEDIÇÃO
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.763.587/0001-96		(SELECIONAR)	0			22/09/2022 a 23/11/2022	1

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 13,90%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
1.1.	TELHADOS	-	-	TOTAL:	767.876,56	-	-	-	-	106.772,00	106.772,06
1.1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	767.876,56	-	-	-	-	106.772,00	106.772,06
1.1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.392,00	62,00	86.304,00	-	696,00	696,00	-	43.152,00	43.152,00
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	4,00	5.568,00	-	720,00	720,00	-	2.880,00	2.880,00
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	7,00	9.744,00	-	720,00	720,00	-	5.040,00	5.040,00
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.392,00	225,00	313.200,00	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	335,00	120,00	40.200,00	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	415,00	75,00	31.125,00	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	558,00	200,00	111.600,00	-	278,50	278,50	-	55.700,00	55.700,00
1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	336,00	129,45	43.495,20	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS), AF 07/2020_P	M2	1.392,00	30,00	41.760,00	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	114,00	86,64	9.876,96	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	5.600,00	1,83	10.248,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	Forro de PVC	-	-	-	60.234,10	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	758,00	2,12	1.606,96	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	758,00	70,03	53.082,74	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	830,00	6,68	5.544,40	-	-	-	-	-	-
1.3.	OUTROS	-	-	-	4.521,30	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020.	M3	93,00	9,70	902,10	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.392,00	2,60	3.619,20	-	-	-	-	-	-

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador	0	Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	0	ITROCA DE TELHAOS	22/09/22	INÍCIO DE OBRA	22/09/22
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	SELECIONAR	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO	1				
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.587/0001-96			22/09/2022 a 23/11/2022						

Realizado Acumulado: 13,90%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtd.)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	767.876,56	-	-	-	-	106.772,00	106.772,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO

Local

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERLANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RTI: 0



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA SÃO LUIS
CONTRATO Nº229/2022/GP**


Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA


Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 106.772,00.

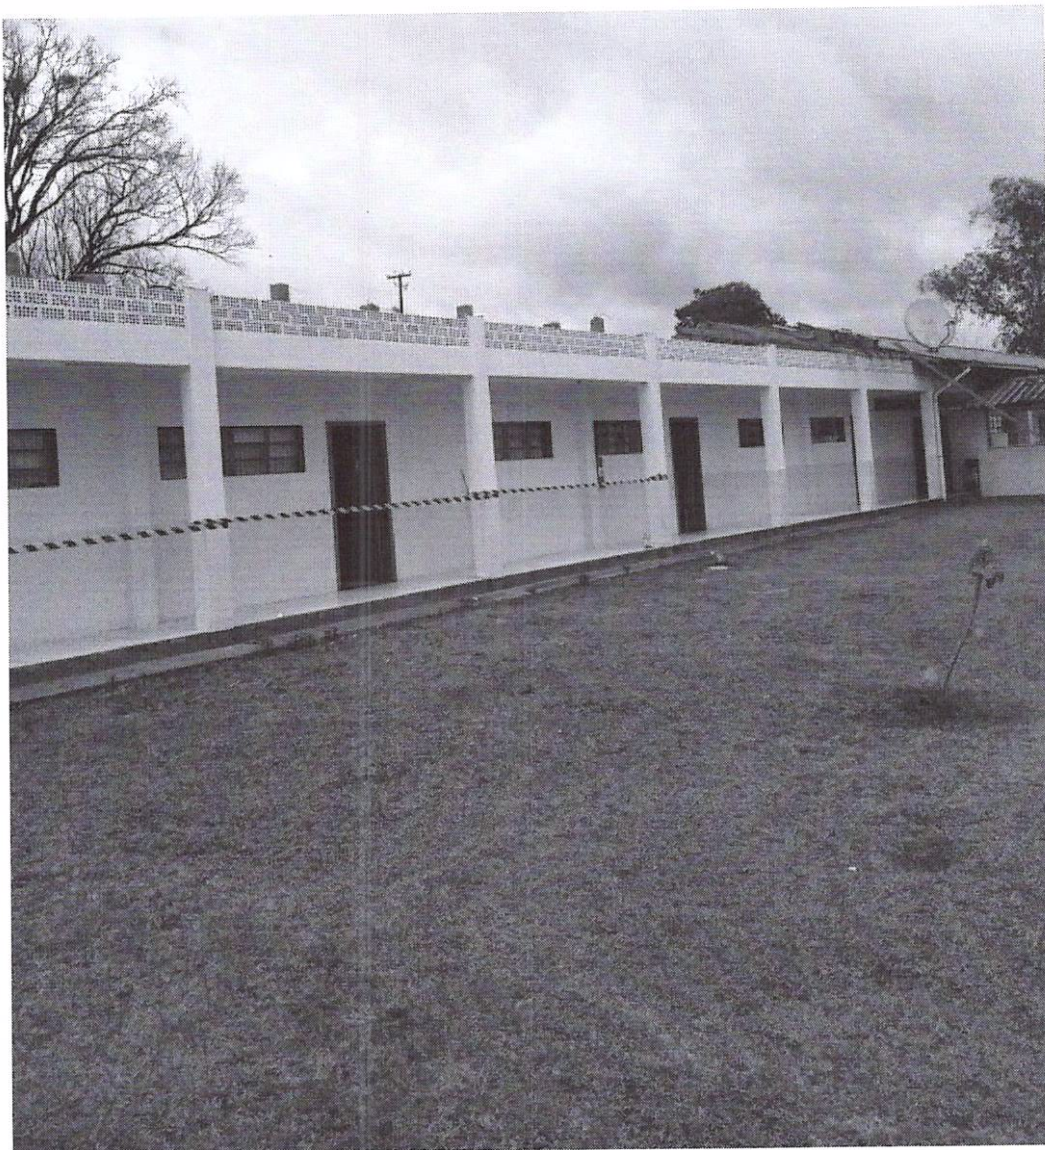


Assinado

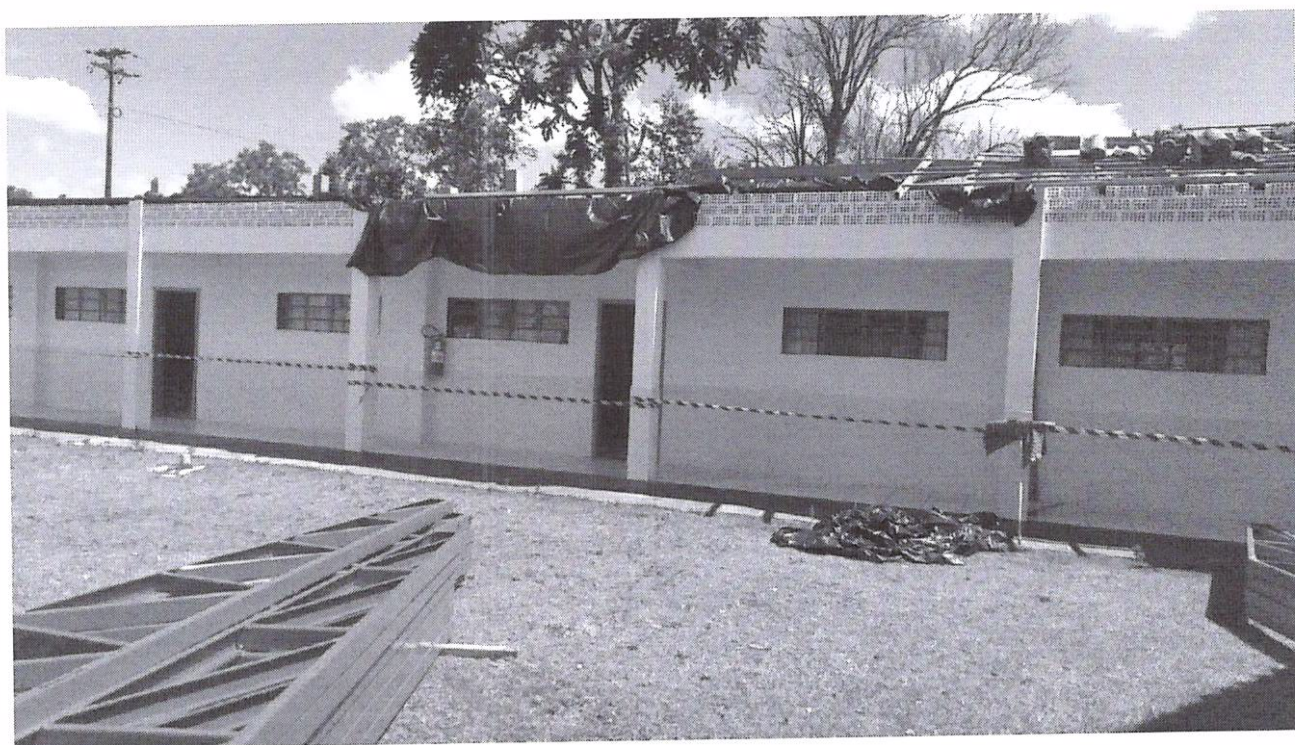


Fernando



Idrunda

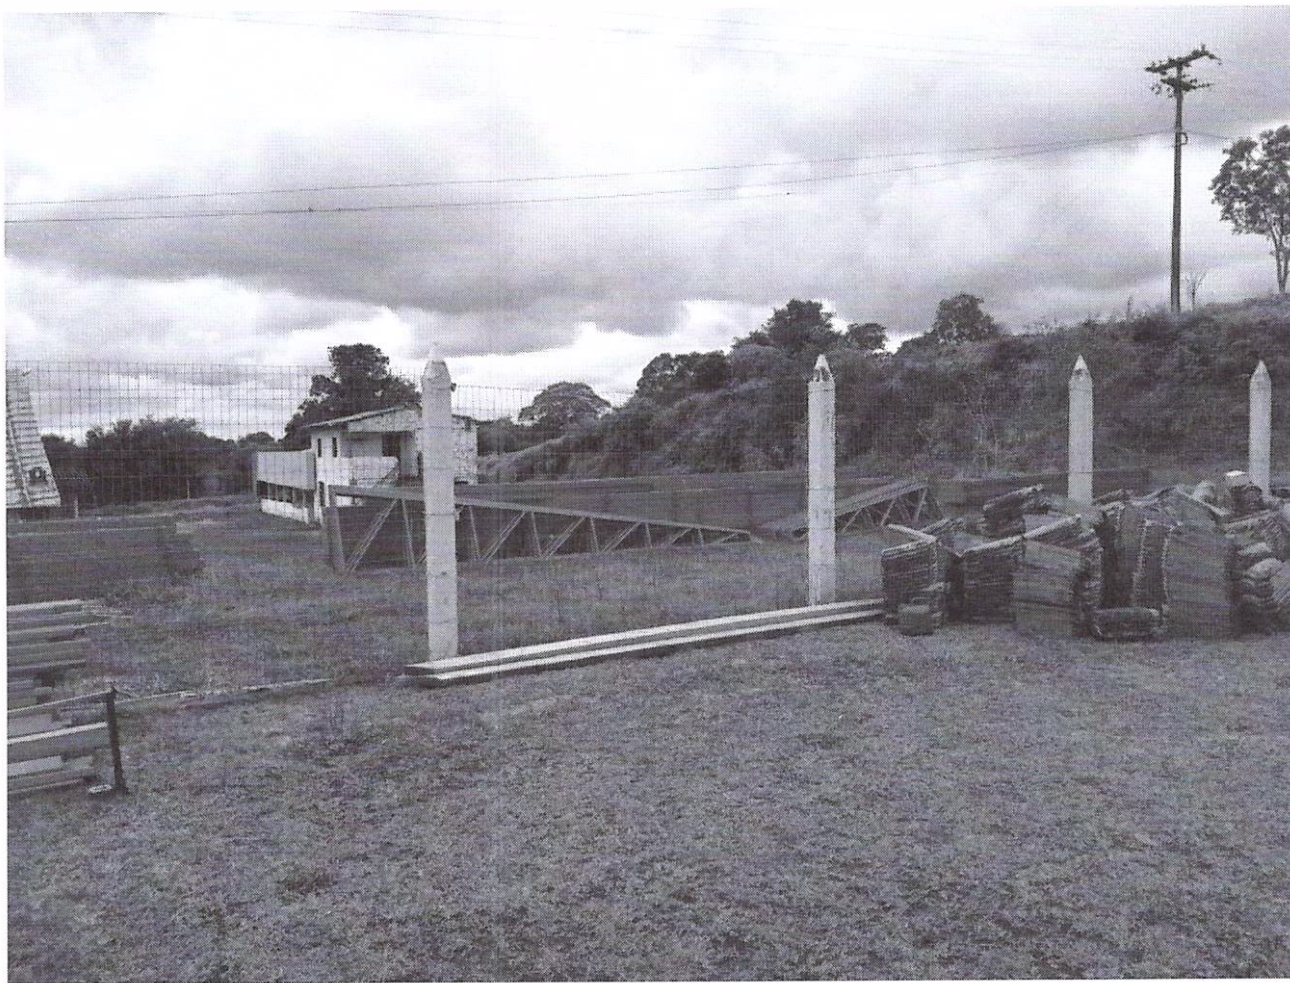

Pato Branco, 23 de novembro de 2022.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 430
Data da emissão da nota 24/11/2022 11:38:25	
Data do fato gerador 24/11/2022 11:38:25	
Código de verificação 9VDVJENV1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 10.783.598/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: R AVENIDA BANDEIRANTES Número: 1271 Bairro: Centro CEP: 86360-000
 Complemento:
 Município: Bandeirantes UF: PR
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3542-4886
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
 CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua Caramuru Bairro: Centro CEP: 85501-064
 Complemento:
 Município: Pato Branco UF: PR
 E-mail: Telefone: (46) 3220-1544 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE À MEDIÇÃO Nº 01:	106.772,0000	1,0000	106.772,0000	64.063,20x2,00 =	1.281,26

Período da Medição: 22/09/2022 a 23/11/2022.

OBJETO:
 Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CONTRATO Nº 229/2022/GP

LOCAL DA EXECUÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ

ART DE OBRA OU SERVIÇO Nº 1720226002067

Responsável Técnico: Leonardo de Souza Brognoli $\checkmark$ CREA PR 201140/D

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO: CEF (104) $\checkmark$ AG: 382 $\checkmark$ C/C: 2399-2

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	26/12/2022	A prazo	105.490,74								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 106.772,00		Valor líquido = R\$ 105.490,74			

Códigos dos serviços:

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	42.708,80	64.063,20	1.281,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 430
Data da emissão da nota	24/11/2022 11:38:25
Data do fato gerador	24/11/2022 11:38:25
Código de verificação	9VDVJENV1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 10.783.598/0001-96 Inscrição municipal:
Endereço: R AVENIDA BANDEIRANTES Número: 1271 Bairro: Centro CEP: 86360-000
Complemento:
Município: Bandeirantes UF: PR
E-mail: Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (43) 3542-4886
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54 Inscrição municipal:
Endereço: Rua Caramuru Bairro: Centro CEP: 85501-064
Complemento:
Município: Pato Branco UF: PR
E-mail: Telefone: (46) 3220-1544 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Pato Branco

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
REFERENTE À MEDIÇÃO Nº 01:
CONTRATO Nº 229/2022/GP - E.M SÃO LUIZ

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: CEF (104) AG: 382 C/C: 2399-2

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.616,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.658,62 (4,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade
