



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento Instalações de Prevenção de Incêndio - Centro de Eventos	Início de Obra 06/09/23
Nº CTEF 117/2023	Empresa Executora ARTEPI ENGENHARIA LTDA	CNPJ 02.667.088/0001-25	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE												
TOTAL:						283.816,31	72,31	27,69	100,00	205.239,23	78.577,08	283.816,31
1.	CENTRO DE EVENTOS - ADITIVO RETIFICADO				283.816,31	72,31	27,69	100,00	205.239,23	78.577,08	283.816,31	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				17.228,80	68,18	31,82	100,00	11.746,60	5.482,20	17.228,80	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (INCLUINDO ENGENHEIRO 30H/SEMANAIS, MESTRE DE OBRA 30H/SEMANAIS E APONTADOR 30H/SEMANAIS)				17.228,80	68,18	31,82	100,00	11.746,60	5.482,20	17.228,80	
1.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE BOMBA DE INCÊNDIO				72.466,99	100,00	-	100,00	72.466,99	-	72.466,99	
1.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				634,88	100,00	-	100,00	634,88	-	634,88	
1.2.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				1.850,88	100,00	-	100,00	1.850,88	-	1.850,88	
1.2.0.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020				2.087,52	100,00	-	100,00	2.087,52	-	2.087,52	
1.2.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				50.212,80	100,00	-	100,00	50.212,80	-	50.212,80	
1.2.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				9.376,00	100,00	-	100,00	9.376,00	-	9.376,00	
1.2.0.6.	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				61,26	100,00	-	100,00	61,26	-	61,26	
1.2.0.7.	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				14,88	100,00	-	100,00	14,88	-	14,88	
1.2.0.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				2.105,00	100,00	-	100,00	2.105,00	-	2.105,00	
1.2.0.9.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				763,71	100,00	-	100,00	763,71	-	763,71	
1.2.0.10.	QUADRO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO - MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				5.360,06	100,00	-	100,00	5.360,06	-	5.360,06	
1.3.	FECHAMENTO EM GESSO PARTE SUPERIOR DAS PORTAS CORTA-FOGO				6.678,11	100,00	-	100,00	6.678,11	-	6.678,11	
1.3.0.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO TRRF 60 MIN, COR ROSA, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.				4.406,69	100,00	-	100,00	4.406,69	-	4.406,69	
1.3.0.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				201,92	100,00	-	100,00	201,92	-	201,92	
1.3.0.3.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016				945,52	100,00	-	100,00	945,52	-	945,52	
1.3.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				1.123,98	100,00	-	100,00	1.123,98	-	1.123,98	
1.4.	RECOMPOSIÇÃO DO FORRO EM GESSO DAS DUAS SALAS MULTIUSO				8.708,29	59,31	40,69	100,00	5.164,99	3.543,30	8.708,29	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS	06/09/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
117/2023	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	02.667.088/0001-25	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			13/08/2024 a 14/10/2024		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE					TOTAL:	283.816,31	72,31	27,69	100,00	205.239,23	78.577,08	283.816,31
1.4.0.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				119,14	100,00	-	100,00	119,14	-	119,14	
1.4.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				239,38	100,00	-	100,00	239,38	-	239,38	
1.4.0.3.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS				4.806,47	100,00	-	100,00	4.806,47	-	4.806,47	
1.4.0.4.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				224,07	-	100,00	100,00	-	224,07	224,07	
1.4.0.5.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				1.588,68	-	100,00	100,00	-	1.588,68	1.588,68	
1.4.0.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				1.135,08	-	100,00	100,00	-	1.135,08	1.135,08	
1.4.0.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				595,47	-	100,00	100,00	-	595,47	595,47	
1.5.	RAMPA DE CONCRETO REVESTIDA DE GRANITO				2.038,22	100,00	-	100,00	2.038,22	-	2.038,22	
1.5.0.1.	RAMPA DE CONCRETO REVESTIDA DE GRANITO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO				2.038,22	100,00	-	100,00	2.038,22	-	2.038,22	
1.6.	LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO				11.085,20	100,00	-	100,00	11.085,20	-	11.085,20	
1.6.0.1.	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SLIM FU 50X25 CM VERDE C/ SELETOR E ADESIVO				11.085,20	100,00	-	100,00	11.085,20	-	11.085,20	
1.7.	READEQUAÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA				133.960,26	50,44	49,56	100,00	67.572,65	66.387,61	133.960,26	
1.7.1.	Paredes Divisórias				20.614,02	52,64	47,36	100,00	10.850,94	9.763,08	20.614,02	
1.7.1.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS				12.056,60	90,00	10,00	100,00	10.850,94	1.205,66	12.056,60	
1.7.1.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				470,20	-	100,00	100,00	-	470,20	470,20	
1.7.1.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				2.208,46	-	100,00	100,00	-	2.208,46	2.208,46	
1.7.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				2.418,91	-	100,00	100,00	-	2.418,91	2.418,91	
1.7.1.5.	RODAPÊ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020				3.459,85	-	100,00	100,00	-	3.459,85	3.459,85	
1.7.2.	Recomposição do forro em gesso para readequação das luminárias				4.039,40	-	100,00	100,00	-	4.039,40	4.039,40	
1.7.2.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS				879,50	-	100,00	100,00	-	879,50	879,50	
1.7.2.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				41,00	-	100,00	100,00	-	41,00	41,00	
1.7.2.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				290,70	-	100,00	100,00	-	290,70	290,70	
1.7.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				2.440,48	-	100,00	100,00	-	2.440,48	2.440,48	
1.7.2.5.	REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS PLAFON LED				387,72	-	100,00	100,00	-	387,72	387,72	
1.7.3.	Portas				9.051,24	-	100,00	100,00	-	9.051,24	9.051,24	
1.7.3.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				8.782,32	-	100,00	100,00	-	8.782,32	8.782,32	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS	06/09/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
117/2023	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	02.667.088/0001-25	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			13/08/2024 a 14/10/2024		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE										
TOTAL:				283.816,31	72,31	27,69	100,00	205.239,23	78.577,08	283.816,31
1.7.3.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021			150,44	-	100,00	100,00	-	150,44	150,44
1.7.3.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021			118,48	-	100,00	100,00	-	118,48	118,48
1.7.4.	Ar Condicionado			53.957,68	27,40	72,60	100,00	14.785,94	39.171,74	53.957,68
1.7.4.1.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.185,00	100,00	-	100,00	1.185,00	-	1.185,00
1.7.4.2.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.571,85	100,00	-	100,00	1.571,85	-	1.571,85
1.7.4.3.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.057,50	100,00	-	100,00	1.057,50	-	1.057,50
1.7.4.4.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 5/8", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.553,75	100,00	-	100,00	2.553,75	-	2.553,75
1.7.4.5.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021			4.607,84	100,00	-	100,00	4.607,84	-	4.607,84
1.7.4.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			1.428,00	100,00	-	100,00	1.428,00	-	1.428,00
1.7.4.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			2.382,00	100,00	-	100,00	2.382,00	-	2.382,00
1.7.4.8.	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			36.626,20	-	100,00	100,00	-	36.626,20	36.626,20
1.7.4.9.	SUPORTE EM AÇO PARA EVAPORADORA			2.042,56	-	100,00	100,00	-	2.042,56	2.042,56
1.7.4.10.	SUPORTE EM AÇO PARA APOIO DAS CONDENSADORAS			502,98	-	100,00	100,00	-	502,98	502,98
1.7.5.	Instalações Elétricas			46.297,92	90,58	9,42	100,00	41.935,77	4.362,15	46.297,92
1.7.5.1.	LUMINÁRIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO BRANCO 40X40 - 36W - TEMPERATURA 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.676,42	100,00	-	100,00	2.676,42	-	2.676,42
1.7.5.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			10.234,00	90,00	10,00	100,00	9.210,60	1.023,40	10.234,00
1.7.5.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			23.859,00	90,00	10,00	100,00	21.473,10	2.385,90	23.859,00
1.7.5.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			9.528,50	90,00	10,00	100,00	8.575,65	952,85	9.528,50
1.8.	MOCHETA PARA TUBULAÇÃO PLUVIAL			654,81	100,00	-	100,00	654,81	-	654,81
1.8.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			66,52	100,00	-	100,00	66,52	-	66,52
1.8.0.2.	REQUADRO E ACABAMENTO PARA PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO			524,00	100,00	-	100,00	524,00	-	524,00



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 06/09/23
Nº CTEF 117/2023	EMPRESA EXECUTORA ARTEPI ENGENHARIA LTDA	CNPJ 02.667.088/0001-25	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 13/08/2024 a 14/10/2024
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE					TOTAL:	283.816,31	72,31	27,69	100,00	205.239,23	78.577,08	283.816,31
1.8.0.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014				5,93	100,00	-	100,00	5,93	-	5,93	
1.8.0.4.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014				27,85	100,00	-	100,00	27,85	-	27,85	
1.8.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014				30,51	100,00	-	100,00	30,51	-	30,51	
1.9.	SISTEMA DE ELETROIMÃS PARA PORTA CORTA-FOGO				30.995,63	89,79	10,21	100,00	27.831,66	3.163,97	30.995,63	
1.9.0.1.	QUADRO DE ACIONAMENTO DOS ELETROIMÃS - MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				7.121,07	100,00	-	100,00	7.121,07	-	7.121,07	
1.9.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				13.328,00	100,00	-	100,00	13.328,00	-	13.328,00	
1.9.0.3.	BRAÇOS DE FIXAÇÃO PARA ELETROIMÃS EM FERRO GALVANIZADO				10.546,56	70,00	30,00	100,00	7.382,59	3.163,97	10.546,56	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.



Documento assinado digitalmente
FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 16/10/2024 09:23:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PATO BRANCO - PR
Local

segunda-feira, 14 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 107.389/D
ART/RRT: 0

Execução do sistema de prevenção de incêndio e a desastres, execução das salas de apoio, execução do sistema SPDA do reservatório e execução do sistema elétrico do mezanino, salas de apoio e pontos necessários para o sistema de prevenção de incêndio, no Centro de Eventos de Pato Branco com área total de 8.086,00m², atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.


CONTRATO Nº117/2023/GP

Relatório de Medição nº 02 – Aditivo



Empresa Contratada: Artepi Engenharia Ltda.


Responsável: João da Silva Duarte – CREA-SC 1733432/D


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a segunda medição referente ao aditivo 01, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

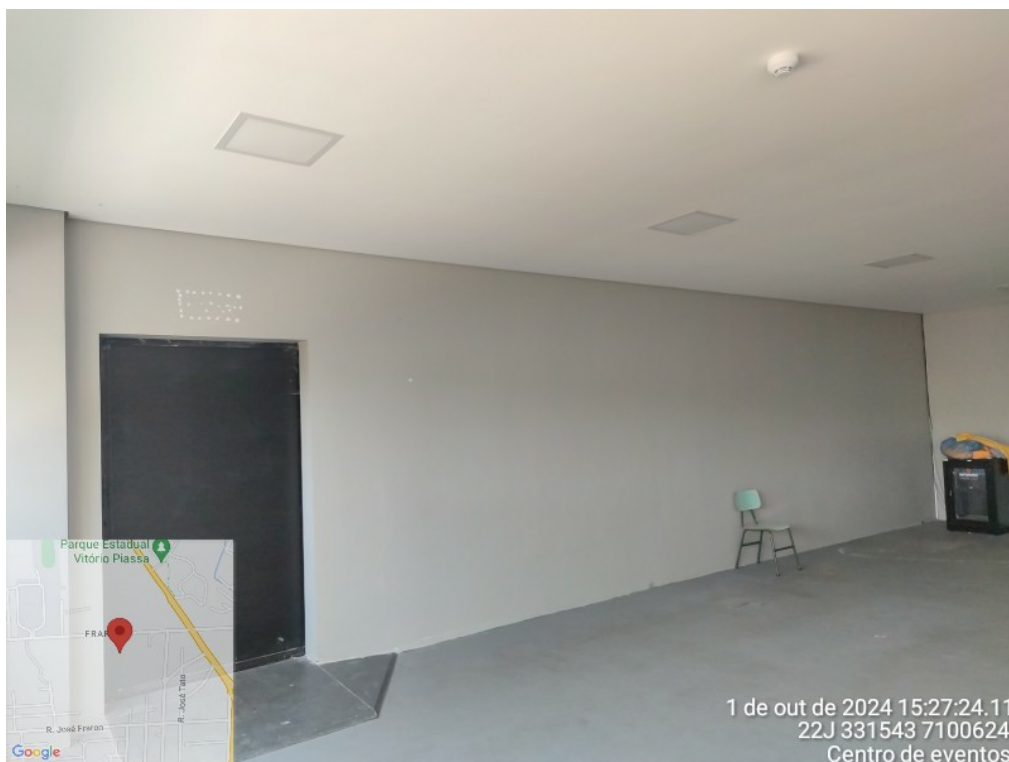






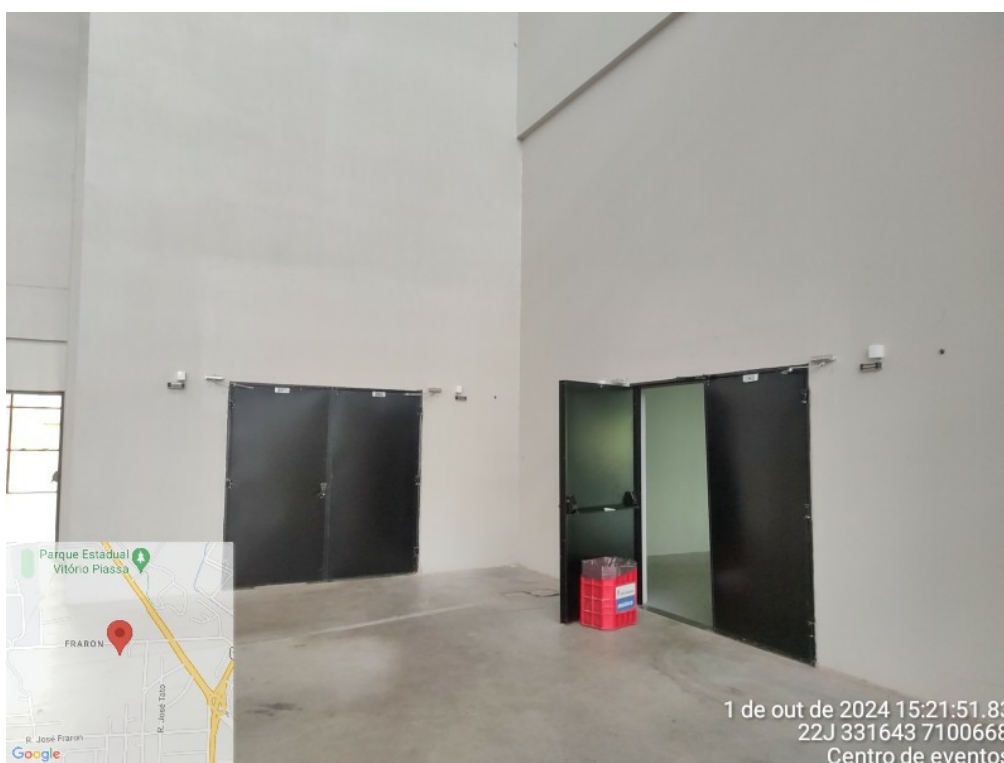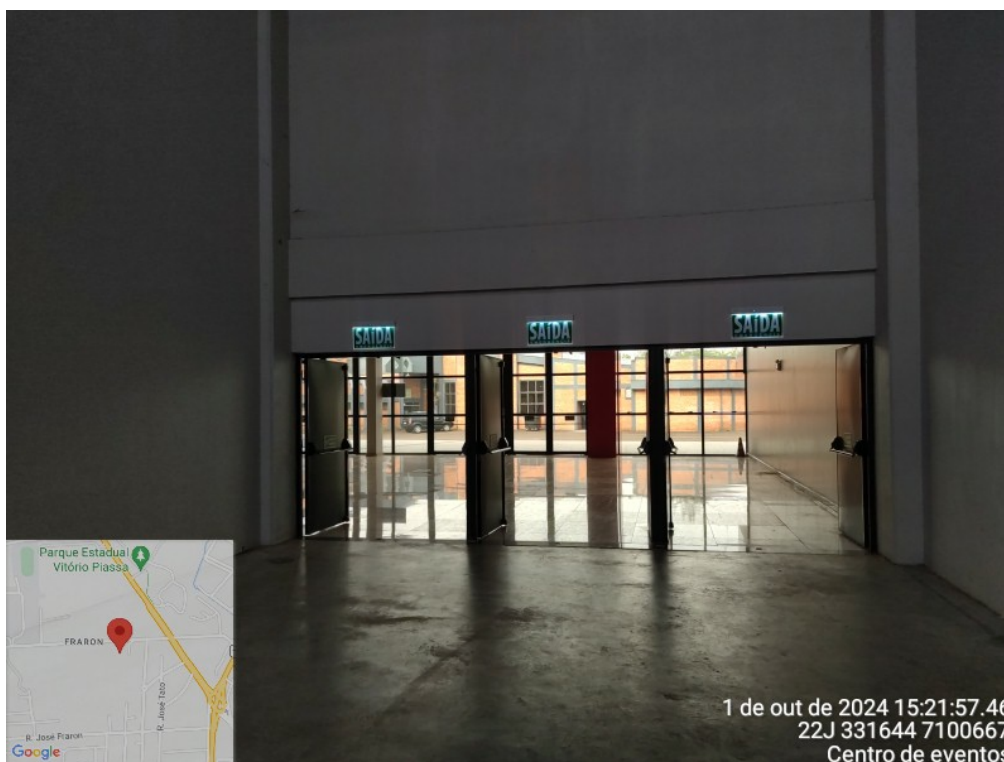


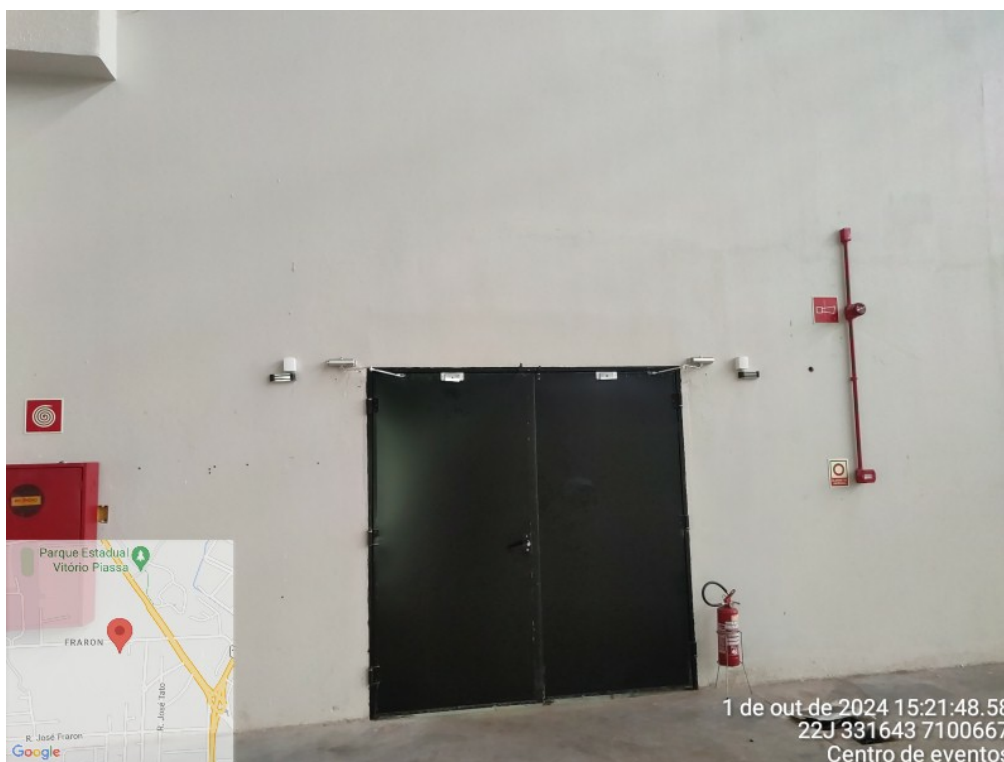


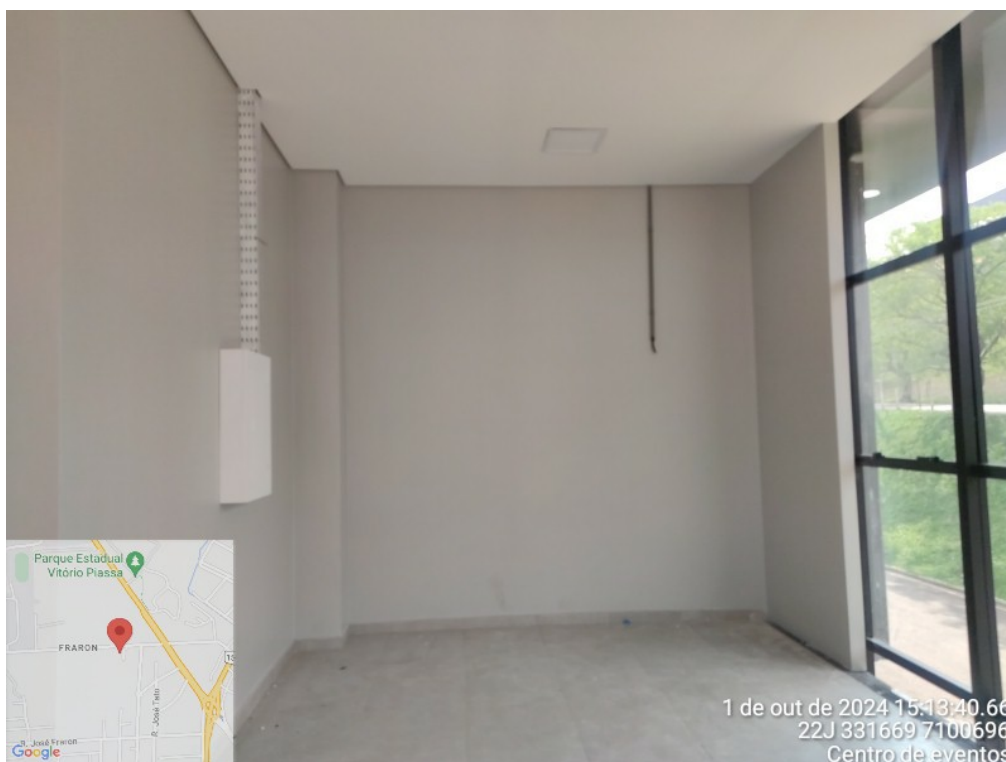

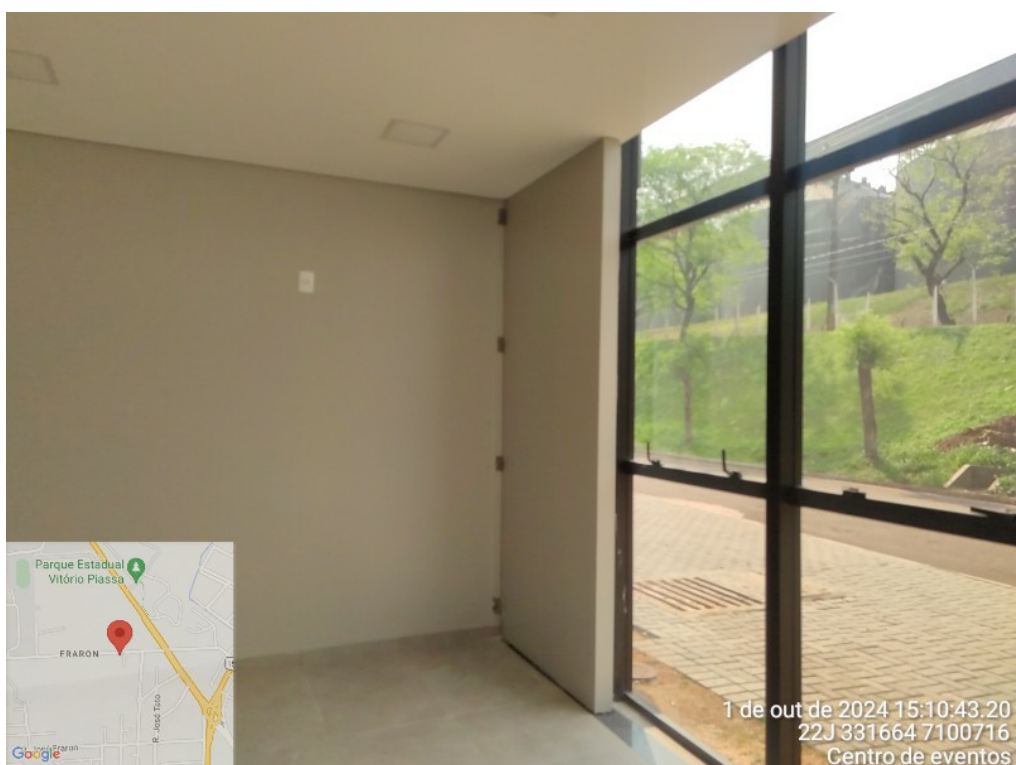

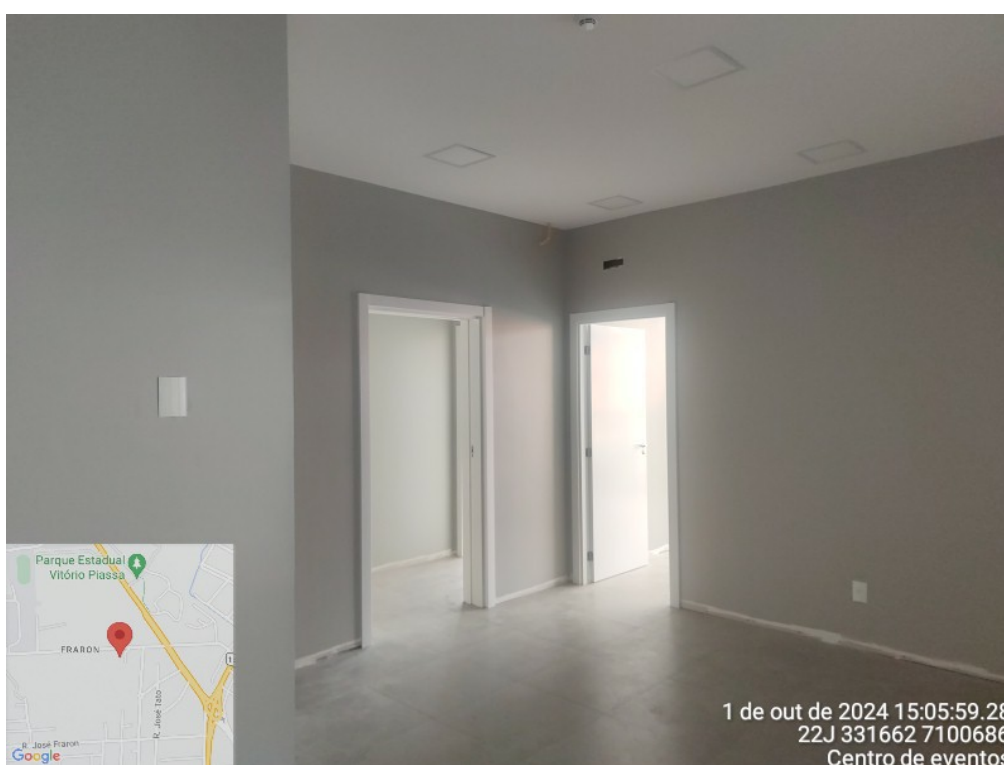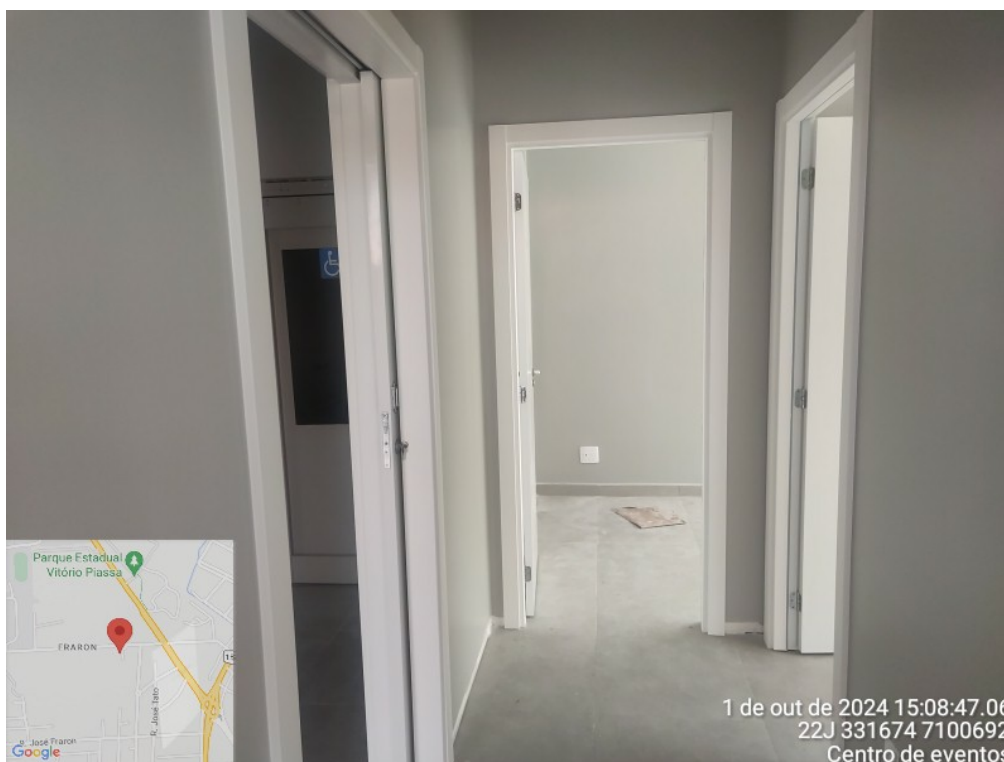

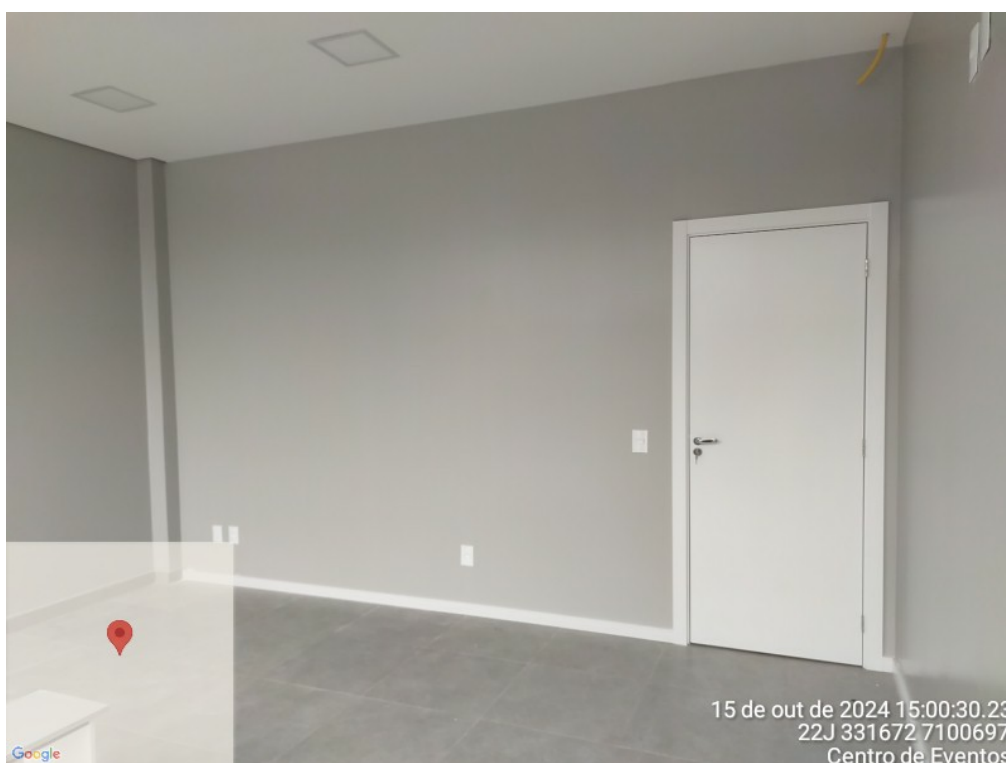

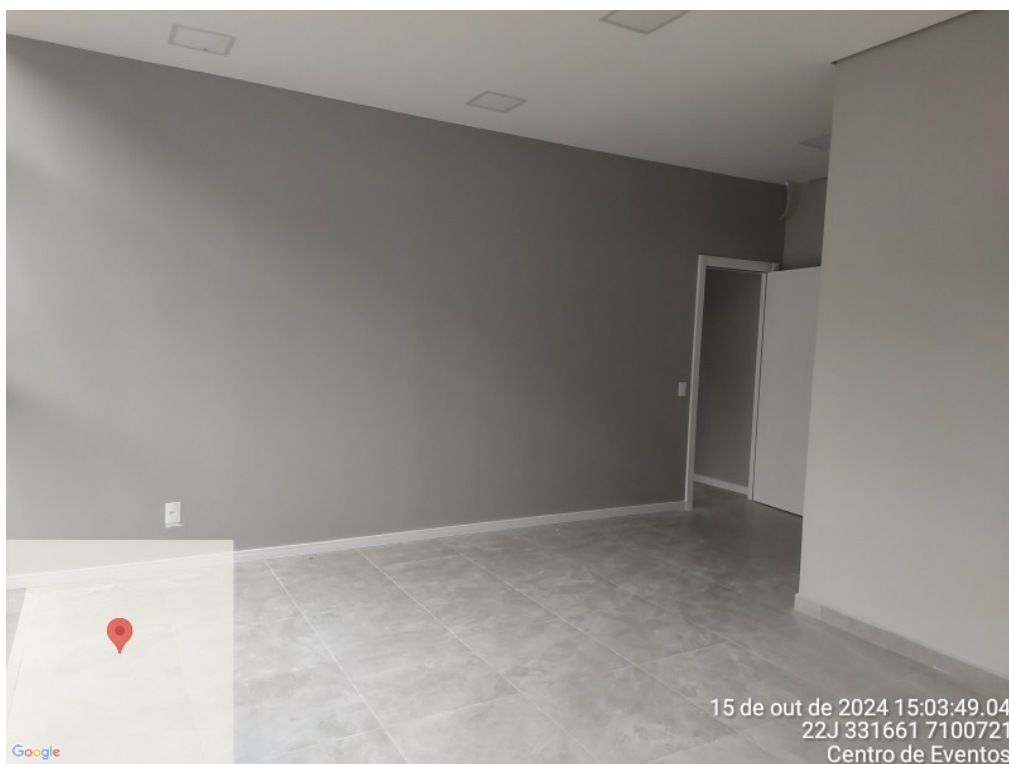

Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 78.577,08**.

Pato Branco, 14 de Outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA ZIANNI MANARIM**
Data: 16/10/2024 09:23:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
