



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop			
									PARCELA	2ª	DATA	03/02/2025 - seg			
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO							SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		
SUBPROJETO:		PRAÇA - Sudoeste							Lote	1	Nº	17/2024		Nº	
FIRMA EMPREITEIRA:		ERGE CONSTRUTORA EIRELI							Ano	2024	DATA:	09/02/2024		DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO						
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-			
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	-			
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	161,60	100,00%	0,0212	2,12%	70,63	11.413,81	11.413,81	-			
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-			
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-			
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-				-	-	-	-			
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	94,45	100,00%	0,0260	2,60%	148,60	14.035,27	14.035,27	-			
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-			
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0166	1,66%	1.493,67	8.962,02	8.962,02	-			
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-			
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0058	0,58%	3.120,36	3.120,36	3.120,36	-			
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						-	-	-	-			
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-			
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-	-	-	-			
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,75	100,00%	0,0004	0,04%	16,97	199,40	199,40	-			
	2.1.6		REATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-			
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,52	100,00%	0,0002	0,02%	38,96	98,18	98,18	-			
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-			
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-			
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	146,00	100,00%	0,0026	0,26%	9,50	1.387,00	1.387,00	-			
	2.3.9		TUBOS DE CONCRETO		-				-	-	-	-			
	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	130,60	100,00%	0,0192	1,92%	79,17	10.339,60	10.339,60	-			
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-			
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-				-	-	-	-			
	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.5 M. AF_12/2020	UN	2,00	100,00%	0,0012	0,12%	330,30	660,60	660,60	-			
	2.4.7		RALOS		-				-	-	-	-			
	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	100,00%			20,70	20,70	20,70	-			



ESTADO DO PARANÁ

Página 2 de 6



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	2ª	DATA	03/02/2025 - seg
									CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
									Nº	17/2024	Nº	
									DATA:	09/02/2024	DATA	
MUNICÍPIO:									Mês			
SUBPROJETO:									Fev			
FIRMA EMPREITEIRA:									Ano			
PATO BRANCO									2024			
PRAÇA - Sudoeste									74			
ERGE CONSTRUTORA EIRELI									1			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	100,00%	0,0003	0,03%	18,00	162,00	162,00	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	100,00%	0,0003	0,03%	23,66	141,96	141,96	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	100,00%	0,0021	0,21%	4,62	1.155,00	1.155,00	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	100,00%	0,0004	0,04%	10,70	224,70	224,70	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	100,00%	0,0015	0,15%	112,77	789,39	789,39	-
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0015	0,15%	797,60	797,60	797,60	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%			12,69	12,69	12,69	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	81,36	81,36	81,36	-
	8.2.11.3		TRIPOLARES		-				-	-	-	-
	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100,00%	0,0003	0,03%	83,30	166,60	166,60	-
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	45,14	45,14	45,14	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	16.105.0000	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.614,11	2.614,11	2.614,11	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67	UNID	17,00	100,00%	0,0381	3,81%	1.208,12	20.538,04	20.538,04	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETOES LED 200W IP-67	UNID	4,00	100,00%	0,0188	1,88%	2.541,43	10.165,72	10.165,72	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO	Amsop	
									Mês	Fev	PARCELA	2ª	DATA	03/02/2025 - seg
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO							SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:		PRAÇA - Sudoeste							Lote	1	Nº	17/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:		ERGE CONSTRUTORA EIRELI							Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00	100,00%	0,0042	0,42%	125,43	2.257,74	2.257,74	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CABO DE ALUMINIO SINGELO UNIPOLAR 10 MM² - ISOLADO XLPE - 0,6/1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.100,00	100,00%	0,0148	1,48%	7,25	7.975,00	7.975,00	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%	0,0004	0,04%	95,99	191,98	191,98	-		
8	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-	-	-		
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-		
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-				-	-	-	-		
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	178,53	178,53	178,53	-		
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-		
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	285,97	285,97	285,97	-		
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	159,78	159,78	159,78	-		
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	98,63	98,63	98,63	-		
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-		
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-		
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	61,10	100,00%	0,0017	0,17%	14,91	911,00	911,00	-		
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	-		
	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	100,00%			12,31	24,62	24,62	-		
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	100,00%			11,37	22,74	22,74	-		
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-		
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,50	100,00%	0,0002	0,02%	43,55	108,88	108,88	-		
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-		
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,38	30,38	30,38	-		
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	29,50	29,50	29,50	-		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0016	0,16%	876,49	876,49	876,49	-		



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
									Mês	Fev	PARCELA	2ª	DATA	03/02/2025 - seg
									SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO							Lote	1	Nº	17/2024	Nº	
SUBPROJETO:		PRAÇA - Sudoeste							Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	
FIRMA EMPREITERA:		ERGE CONSTRUTORA EIRELI												
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
9	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-		
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-				-	-	-	-		
	10.1.2		CHAPISCO		-				-	-	-	-		
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	91,60	100,00%	0,0013	0,13%	7,76	710,81	710,81	-		
	10.1.3		EMBOCO		-				-	-	-	-		
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	91,60	100,00%	0,0102	1,02%	59,93	5.489,59	5.489,59	-		
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-		
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-		
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	748,00	100,00%	0,0540	5,40%	38,94	29.127,12	29.127,12	-		
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	748,00	100,00%	0,1150	11,50%	82,92	62.024,16	62.024,16	-		
	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	112,00	100,00%	0,0201	2,01%	96,57	10.815,84	10.815,84	-		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	105,00	100,00%	0,0163	1,63%	83,87	8.806,35	8.806,35	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	41,00	100,00%	0,0079	0,79%	104,59	4.288,19	4.288,19	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DILUENTE	M2	748,00	100,00%	0,1255	12,55%	90,48	67.679,04	67.679,04	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	112,00	100,00%	0,0547	5,47%	263,69	29.533,28	29.533,28	-		
10	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-		
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-		
	11.1.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-		
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.559,50	100,00%	0,0013	0,13%	0,46	717,37	717,37	-		
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-		
	11.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-		
	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	150,00	100,00%	0,0011	0,11%	3,83	574,50	574,50	-		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-		



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Fev	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PRAÇA - Sudoeste	SAM	74	PARCELA	2ª	DATA	03/02/2025 - seg
FIRMA EMPREITEIRA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI	Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:		Nº	
		Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2,00	100,00%	0,0088	0,88%	2.361,59	4.723,18	4.723,18	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0051	0,51%	2.729,61	2.729,61	2.729,61	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	2,00	100,00%	0,0078	0,78%	2.092,58	4.185,16	4.185,16	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PLAYGROUND TRÊS TORRES - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%	0,0808	8,08%	43.566,49	43.566,49	43.566,49	-
11	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	748,00	100,00%	0,0033	0,33%	2,37	1.772,76	1.772,76	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-

GLOBAL - LOTE 1					% PREVISTO	26,56%	% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	539.437,44	539.437,44	-
-----------------	--	--	--	--	------------	--------	---------------	---------	-------	------------	------------	---

OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$539.437,44	
									Medição Acumulada:		539.437,44	
									Total Anterior:		360.618,70	
									Valor Desta Medição:		R\$178.818,74	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
MARCOS VINICIUS GOMES 07976998994				gov.br Documento assinado digitalmente KRIZIA LACERDA TONACO NORONHA Data: 14/03/2025 15:07:10-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br				GERI NATALINO DUTRA:6484713693 4				
ERGE CONSTRUTORA EIRELI MARCOS VINICIUS GOMES ARQ.URB. CAU A129307-9				PREF. MUN. DE PATO BRANCO FISCAL: Krizia Lacerda Tonaco Noronha ENGº CIVIL - CREA TO -206973/D				PREFEITO DE PATO BRANCO GERI DUTRA				

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medicação:	74 / 1 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI
Contrato N°:	17/2024
Data da Vistoria:	03/02/2025

Objeto:

Revitalização da Praça Sudoeste, contendo: quadrapoliesportiva, playground, área de convivência e acessos em paver.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **10/02/2024** até **03/02/2025**.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | Placa de obra




1 | QR CODE



5 | Mapa



1 | Quadra

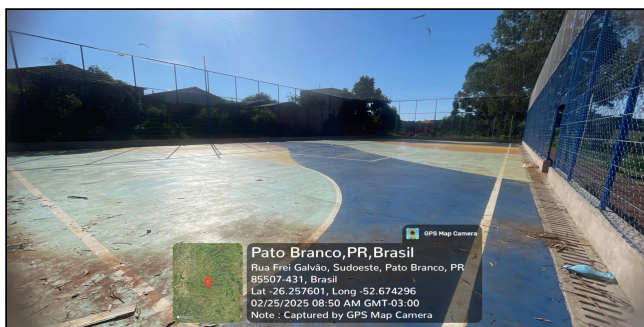

2 | Piso de concreto



3 | Piso permeável



4 | Playground



5 | Piso emborrachado



6 | Alambrado com tela



7 | Rede de polietileno



8 | Passeio



9 | Banco de concreto



10 | Bebedouro

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19325/medicao/14361/relatorio-fotografico/3501>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 14 de março de 2025.

Krizia Lacerda Tonaco Noronha
engenheiro civil

Registro no Órgão de Classe: CREA TO 206973/D



Documento assinado digitalmente

KRIZIA LACERDA TONACO NORONHA

Data: 14/03/2025 08:34:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
