

Nº	CÓDIGO	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Inluên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.6.1		1,00		0,0003		203,92	-	203,92	203,92
7	9							-	-	-
	95635	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	239,19	239,19	239,19	-
	91785	M	140,00		0,0108		57,02	-	7.982,80	7.982,80
	91795	M	1,50		0,0002		93,90	-	140,85	140,85
	9.5.1	JNIDADI	1,00		0,0053		3.911,98	-	3.911,98	3.911,98
8	10							-	-	-
	98557	M2	34,56		0,0022		47,63	-	1.646,09	1.646,09
	92396	M2	500,00		0,0473		70,07	-	35.035,00	35.035,00
	93679	M2	146,18		0,0151		76,57	-	11.193,00	11.193,00
	94994	M2	100,00		0,0184		136,27	-	13.627,00	13.627,00
	10.7.1	M2	100,00		0,0385		285,02	-	28.502,00	28.502,00
9	11							-	-	-
	100576	M2	641,17		0,0024		2,76	-	1.769,63	1.769,63
	531000	m3	76,94		0,0179		172,36	-	13.261,38	13.261,38
	98504	M2	290,07		0,0052		13,15	-	3.814,42	3.814,42
	98525	M2	1.524,60	100,00%	0,0009	0,09%	0,45	686,07	686,07	-
	11.3.1	M	352,32		0,0088		18,39	-	6.479,16	6.479,16
	11.3.2	M2	641,17	95,00%	0,1119	10,63%	129,23	78.715,48	82.858,40	4.142,92
	11.3.3	M3	32,05		0,0047		108,53	-	3.478,39	3.478,39
	11.3.4	PAR	1,00		0,0148		10.983,56	-	10.983,56	10.983,56
	11.3.5	JNIDADI	11,00		0,0082		555,14	-	6.106,54	6.106,54
	11.3.6	JNIDADI	6,00		0,0212		2.610,32	-	15.661,92	15.661,92
	11.3.7	JNIDADI	12,00		0,0318		1.962,49	-	23.549,88	23.549,88
	11.3.8	JNIDADI	1,00		0,0065		4.802,04	-	4.802,04	4.802,04
10	12							-	-	-
	12.4.1	M2	968,24		0,0009		0,65	-	629,36	629,36
								-	-	-
			% PREVISTO:	46,50%	% EXECUTADO:	30,15%	SOMAS	223.181,02	740.193,94	517.012,92


OBSERVAÇÕES:		Valor Total do Contrato:	R\$740.193,94
VIGENCIA 26/02/2024		Medição Acumulada:	R\$223.181,02
EXECUÇÃO 18/09/2023		Total Anterior:	
		Valor Desta Medição:	R\$223.181,02

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos):			
<p>MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994 Arq Marcos V GOMES - CAU A129307-9 AMG ENGENHARIA EIRELI</p>	<p>JAKELINE LOUREIRO:09802974943 Assinado de forma digital por JAKELINE LOUREIRO:09802974943 Data: 2023.09.28 08:31:19 -03'00'</p> <p>Eng Jakeline Loureir - CREA 185508/D Responsável pela Fiscalização - Prefeitura</p>	<p>ROBSON CANTU:44143664968 Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968 Data: 2023.09.01 16:11:54 -03'00'</p> <p>Robson Cantu Prefeito Municipal</p>	

MUNICÍPIO	PATO BRANCO - PR
PROJETO/LOTE	63 / 1
PROGRAMA	PROGRAMA TRANAFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
CONTRATADA	AMG ENGENHARIA EIRELI
CONTRATO Nº	19/2023
OBJETO	MEU CAMPINHO
MEDIÇÃO Nº	01
DATA DA VISTORIA	23/08/2023

O objeto do presente Contrato é a execução de o a Construção de Meu campinho – Baixo Planalto -- Loteamento Paulo Afonso com área construída de 2.279.67 m: contendo instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fachos; instalações elétricas; instalações hidráulicas; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final da obra e demais itens e especificações constantes no projeto, com recursos do Convênio n° 1 091/2022 celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo Paranaidade e o Município de Pato Branco, em atendimento as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. ° 16/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.

MAPA / CROQUI / PLANTA BAIXA COM A MARCAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO

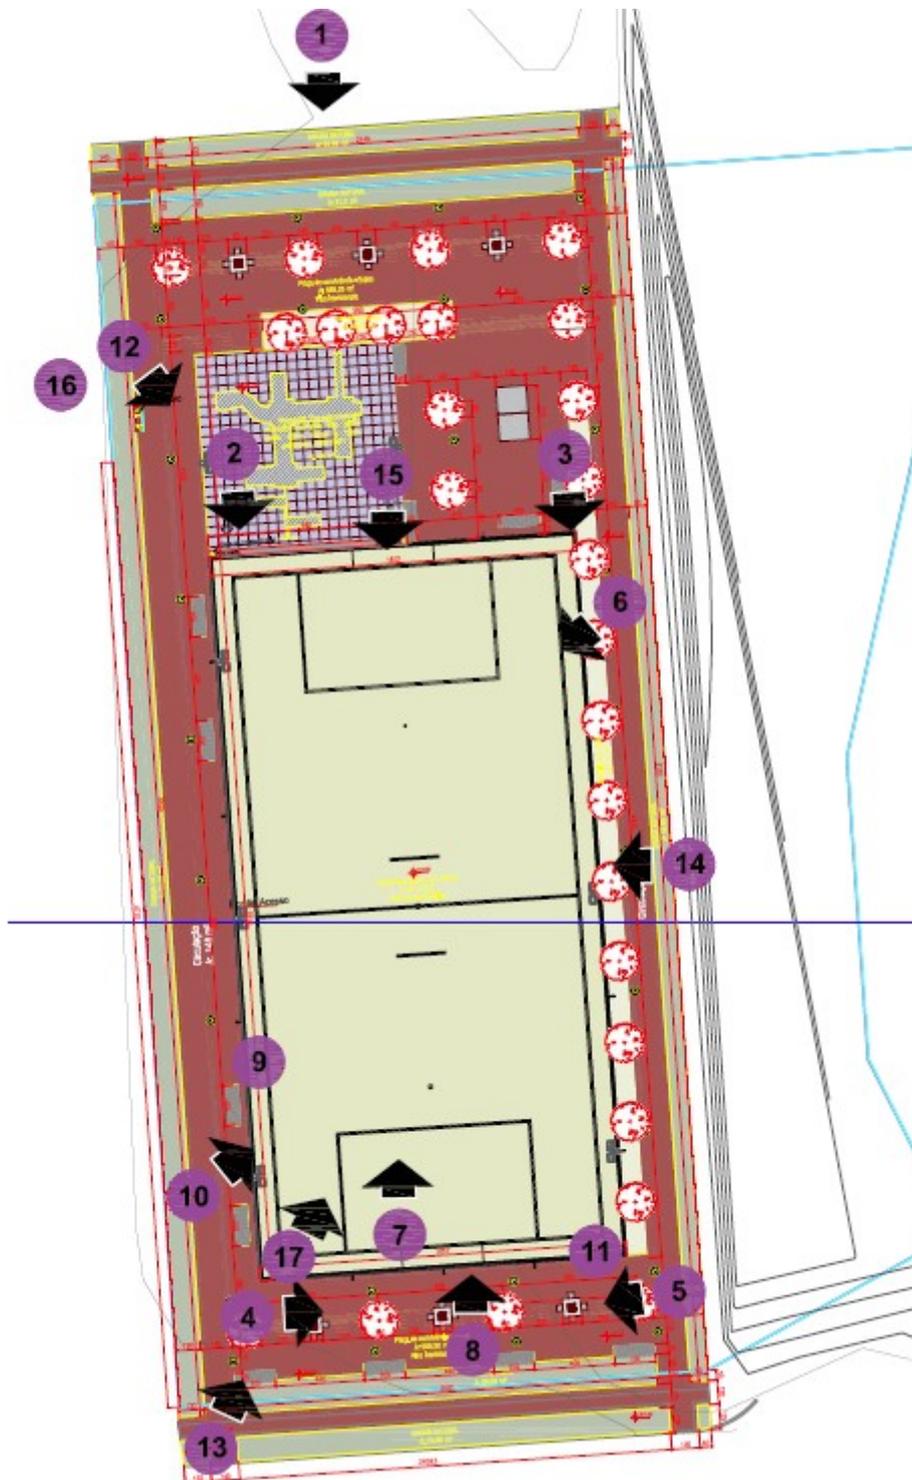

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada até 23/08/2023.

SERVIÇOS EXECUTADOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA



2. MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS





03- Tubulação de PVC corrugado flexível perfurado DN 100.



04-Tubos de concreto (simples) para redes coletoras de água pluvial



05-Tubos de concreto (simples) para redes coletoras de água pluvial

	<p>06- Manta Drenante Geotêxtil não tecido 100% Poliéster.</p>
	<p>07- Cargas de terras para aterro de solo argiloso.</p>
	<p>08- Execução de aterro com compactação</p>

3. FUNDAÇÕES

4. ESTRUTURAS

 <p>23 de ago. de 2023 17:16:08 Meu Campinho Paulo Afonso</p>	<p>09- Viga Baldrame com Formas Concretada</p>
	<p>10- Concretagem Vigas Baldrame</p>
	<p>11- Formas e Armação de viga baldrame. Ferragem CA-8 MM e CA-60 5 MM.</p>

5. ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS



23 de ago. de 2023 17:15:47
 Rua Áurea Zandoná
 Planalto
 Pato Branco PR
 85509-210
 Brasil
 Meu Câmpinho Paulo Afonso

12- Alambrado em tubos de aço galvanizados 2 1/2" com tela de arame

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

7. INSTAL. HIDRÁULICAS, GAS GLP, INCÊNDIO E APARELHOS

8. REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

9. PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS



13- Regularização e compactação de solo



14- Manta drenante + agregados



15- Base compactada



16- Base com agregados de diferentes granulométricas

 <p style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 23 de ago. de 2023 17:16:35 Rua Deodora Kogi Planalto Pato Branco PR 85509-210 Brasil Meu Campinho Paulo Afonso </p>	<p>17- Grama sintética</p>
---	----------------------------

10. DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)

Pato Branco, 23 de Agosto de 2023.

JAKELINE
LOUREIRO:0980
2974943

Assinado de forma digital
 por JAKELINE
 LOUREIRO:09802974943
 Dados: 2023.08.29 18:36:39
 -03'00'

Jakeline Loureiro
CREA-PR 15508/D
ART 1720233134321
