



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: 9 Período: 31/01/2024 a 08/03/2024 % Realizado Período.: 7,62% % Realizado Acum.: 68,98%

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamen to	travamento do banzo inferior	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços Preliminares	2																								
3	Movimentação de terra - escavação	1																								
4	Movimentação de terra - reaterro																									
5	Locação da obra	1																								
6	Fundações - Movimentação de terra - Blocos		1	1	1	1	1	1	1																	
7	Fundações - Movimentação de terra - Baldrar																									
8	Fundações - Estacas		3	2	2	2	2	1	3																	
9	Fundações - Blocos		3	3	4	3	4	3	4																	
10	Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames		6	5	6	6																				
11	Estrutura moldada in loco - Pilares																									
12	Estrutura moldada in loco - Vigas																									
13	Estrutura moldada in loco - Escadas																									
14	Estrutura moldada in loco - Lajes maciças																									
15	Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar		6	5																						
16	Estrutura pré-moldada - Pilares		4	3	4	4	4	4	4																	
17	Estrutura pré-moldada - Vigas		4	3	4	4	4	4	4																	
18	Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré		5	5	6	6	5	6																		
19	Estrutura pré-moldada - Laje arquibancada		5	5	6	6	5	6																		
20	Estrutura pré-moldada - Laje alveolar		4	3			4	4																		
21	Impermeabilizações																									
22	Alvenarias, vergas e contravergas		8	9																						
23	Alvenarias - peitoril em granito																									
24	Divisórias																									
25	Instalações hidrossanitárias - movimentação																									
26	Ramal de distribuição de água																									
27	Tubulação PVC soldável e registros																									
28	Bomba Centrífuga																									
29	Reservatório para armazenamento de água																									
30	Kit cavalete entrada de água																									
31	Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto																									
32	Tubulação 150mm - Esgoto																									
33	Caixas enterradas - inc. caixa de gordura																									
34	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																									
35	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																									
36	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - ci																									
37	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - C																									
38	Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulaçã																									
39	Instalações elétricas - movimentação de terra																									
40	Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins																									

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSITANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1060756-29	874951	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ARENA PATO BRANCO	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	370/2022-GP

Medição:	9	Período:	31/01/2024 a 08/03/2024	% Realizado Período.:	7,62%	% Realizado Acum.:	68,98%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	--------

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamen to	travamento do braço inferior										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
41	Instalações elétricas - conexões para eletrodutos																											
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes																											
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição																											
44	Instalações elétricas - Disjuntores																											
45	Instalações elétricas - Suporte e vergalhão																											
46	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5																											
47	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16,																											
48	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95,																											
49	Instalações elétricas - Caixas enterradas																											
50	Instalações elétricas - Interruptores e tomada																											
51	Instalações elétricas - Eletrocalhas																											
52	Instalações elétricas - Luminárias																											
53	Instalações elétricas - Refletores																											
54	Instalações elétricas - Entrada de energia																											
55	SPDA - Terminál aéreo e malha superior																											
56	SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior																											
57	SPDA - Barra chata de alumínio																											
58	SPDA - Descidas																											
59	SPDA - Caixas enterradas e caixa de equiporo																											
60	PSCIP - Abrigos																											
61	PSCIP - Bomba de Incêndio																											
62	PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões																											
63	PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões																											
64	PSCIP - Reservatório, registros e conexões																											
65	PSCIP - Recalque no passeio																											
66	PSCIP - Acionador manual de bomba de incêndio																											
67	PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça																											
68	PSCIP - Barras anti-pânico																											
69	PSCIP - Extintores e sinalização																											
70	Revestimentos - fechamento lateral em telha																											
71	Revestimentos - paredes internas (chapisco e																											
72	Revestimentos - paredes fachada (chapisco e																											
73	Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)																											
74	Revetimentos - Pisos - Lastro																											
75	Revestimentos - Pisos - Regularização, reves																											
76	Revestimentos - Pisos - Piso industrial em C/																											
77	Revestimentos - Pisos - Acabamento polido																											
78	Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante																											
79	Revestimentos - Forro e teto																											
80	Cobertura - Trelças principais	8	7	8	7	8	7			7																		

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1060756-29	874951	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ARENA PATO BRANCO	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	370/2022-GP

Medição:	9	Período:	31/01/2024 a 08/03/2024	% Realizado Período.:	7,62%	% Realizado Acum.:	68,98%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	--------

Nº do Evento	Título dos Eventos
81	Cobertura - Coberturas Laterais
82	Cobertura - Terças
83	Cobertura - Contraventamento
85	Cobertura - Telhamento
86	Cobertura - Calha em chapa de aço galv.
87	Cobertura - Calha em concreto
88	Cobertura - Rufo em granito
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro
93	Portico em ACM
94	Esquadrias - Portas
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores
96	Corrimão simples em aço
97	Guarda corpo de aço galvanizado
98	Guarda corpo em ACM
99	Barreira em aço galvanizado
100	Louças
101	Metals e acessórios
102	Pintura - Paredes
103	Pintura - Tetos
104	Serviços Finais

		Data das Medições											
		14/04/2023	12/06/2023	24/07/2023	12/09/2023	06/11/2023	04/12/2023	20/12/2023	30/01/2024	08/03/2024			
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	3,78%	4,56%	6,75%	14,02%	5,37%	6,21%	10,19%	10,48%	7,62%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	1.029.895,19	1.245.133,16	1.841.477,39	3.824.456,37	1.464.963,81	1.694.832,59	2.778.577,96	2.858.186,88	2.078.195,66	-	-	-
Acumulado:	%	3,78%	8,34%	15,09%	29,11%	34,48%	40,70%	50,88%	61,36%	68,98%	68,98%	68,98%	68,98%
	R\$	1.029.895,19	2.275.028,35	4.116.505,74	7.940.962,11	9.405.925,92	11.100.758,51	13.879.336,47	16.737.523,35	18.815.719,01	18.815.719,01	18.815.719,01	18.815.719,01

PATO BRANCO/PR

Local

sexta-feira, 8 de março de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: PR-107389/D

ART/RRT: 1720230911254

Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

CONTRATO Nº370/2022-GP

Relatório de Medição nº 09

Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Responsável: Sálvio Pedro Machado


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a nona medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:









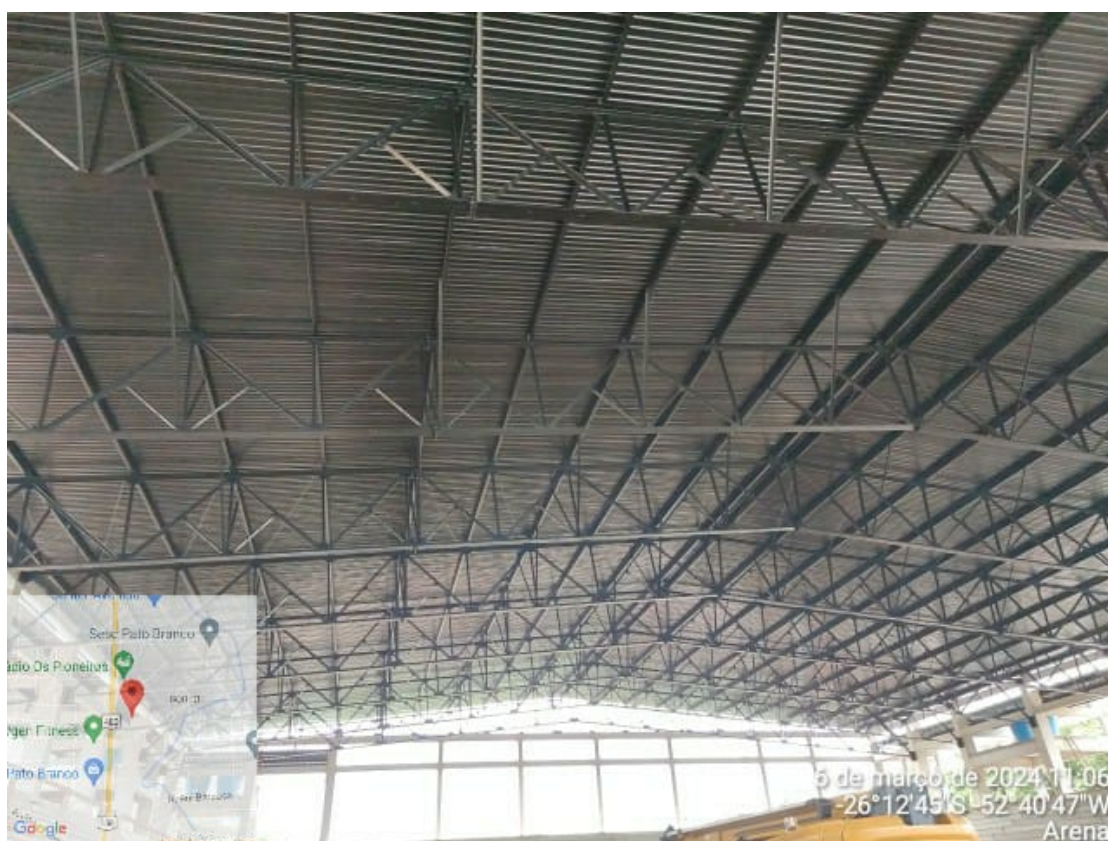





Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 2.078.195,66**.

Pato Branco, 08 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA ZIANNI MANARIM**
Data: 08/03/2024 15:08:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
