



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 23 de janeiro 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA

CNPJ Nº 10.783.598/0001-96


Contrato nº 229/2022-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 767.876,56	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 23/11/2022	13,90	106.772,00	86,10	R\$ 661.104,56
A liberar 2. ^a Parcela em 13/12/2022	58,10	339.399,30	41,90	R\$ 321.705,26
A liberar 3. ^a Parcela em 23/01/2023	84,09	199.542,92	15,91	R\$ 122.162,34
A liberar 4. ^a Parcela em				

Valor a ser liberado em 23/01/2023 R\$ 199.542,92

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPRONENTE / TOMADOR	Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDICÃO
0	0	LINCOLN FERRNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	0	0	0 TROCA DE TELHADOS	14/12/2022 a 23/01/2023	22/09/22
		CNPJ	10.783.587/0001-96	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)			3

Realizado Acumulado: 84,09%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtd.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	767.876,56	-	-	-	446.171,30	199.542,92	645.714,22
1.1.	TELHADOS	-	-	-	767.876,56	-	-	-	446.171,30	199.542,92	645.714,22
1.1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	703.121,16	-	-	-	442.948,00	196.637,96	639.585,96
1.1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1.392,00	62,00	86.304,00	1.042,00	350,00	1.392,00	64.604,00	21.700,00	86.304,00
1.1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	4,00	5.568,00	1.042,00	350,00	1.392,00	4.168,00	1.400,00	5.568,00
1.1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	7,00	9.744,00	1.042,00	350,00	1.392,00	7.294,00	2.450,00	9.744,00
1.1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1.392,00	225,00	313.200,00	1.042,00	350,00	1.392,00	234.450,00	78.750,00	313.200,00
1.1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	335,00	120,00	40.200,00	-	168,00	168,00	-	20.160,00	20.160,00
1.1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	415,00	75,00	31.125,00	-	415,00	415,00	-	31.125,00	31.125,00
1.1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	558,00	200,00	111.600,00	433,50	124,50	558,00	86.700,00	24.900,00	111.600,00
1.1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	336,00	129,45	43.495,20	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 07/2020_P	M2	1.392,00	30,00	41.760,00	1.042,00	350,00	1.392,00	31.260,00	10.500,00	41.760,00
1.1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	114,00	86,64	9.876,96	79,00	35,00	114,00	6.844,56	3.032,40	9.876,96
1.1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRAUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	5.600,00	1,83	10.248,00	4.168,00	1.432,00	5.600,00	7.627,44	2.620,56	10.248,00
1.2.	Forno de PVC	-	-	-	60.234,10	-	-	-	-	1.606,96	1.606,96
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	758,00	2,12	1.606,96	-	758,00	758,00	-	1.606,96	1.606,96
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 09/2017_P	M2	758,00	70,03	53.082,74	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	830,00	6,68	5.544,40	-	-	-	-	-	-
1.3.	OUTROS	-	-	-	4.521,30	-	-	-	3.223,30	1.298,00	4.521,30
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	93,00	9,70	902,10	53,00	40,00	93,00	514,10	388,00	902,10
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.392,00	2,60	3.619,20	1.042,00	350,00	1.392,00	2.709,20	910,00	3.619,20

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador	0	Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	0	INÍCIO DE OBRA	22/09/22
Nº CTEF	0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	0	TROCA DE TELHADOS	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO	3
		LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.587/0001-96	(SELECIONAR)			14/12/2022 a 23/01/2023		

Realizado Acumulado : 84,09%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtd.)					Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:				TOTAL:	767.878,56	-	-	-	446.171,30	199.542,92	645.714,22	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
segunda-feira, 23 de janeiro de 2023
Data

Responsible Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERLANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RTT: 0



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA SÃO LUIS
CONTRATO Nº229/2022/GP**


Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 199.542,92.

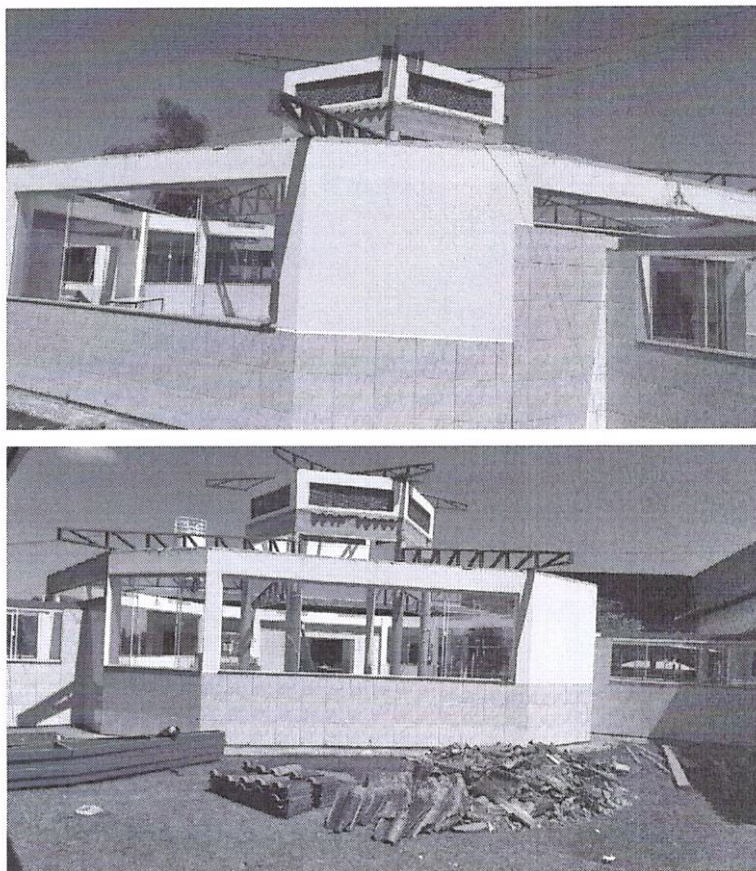


Aderiando





Pato Branco, 23 de janeiro de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
