



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 27 de julho 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 24/2023-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 556.104,98	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 18/04/2023	86,10	504.662,80	13,90	R\$ 51.442,18
A liberar 2. ^a Parcela em 27/07/2023	13,90	51.442,18	-	-

Valor a ser liberado em 27/07/2023 R\$ 51.442,18

Gestora e fiscal do contrato.

Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato

Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Seleção de Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
0		0		0		0		00001/00	
Nº CTEF		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
0		0		(SELECIONAR)		19/04/2023 a 27/07/2023		2	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:							
1.1.	TELHADOS	-	-	-	556.104,98	-	-	-	504.662,80	51.442,18	556.104,98
1.1.1.	ESTRUTURA DO TELhado e Telhamento	-	-	-	553.673,98	-	-	-	504.662,80	49.071,18	553.673,98
1.1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	985,00	62,00	61.070,00	985,00	-	985,00	61.070,00	-	61.070,00
1.1.2.	AF 07/2019	M2	985,00	225,00	221.625,00	900,00	85,00	985,00	202.500,00	19.125,00	221.625,00
1.1.3.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	232,00	120,00	27.840,00	-	232,00	232,00	-	27.840,00	27.840,00
1.1.4.	AF 07/2019	M2	985,00	200,00	197.000,00	985,00	-	985,00	197.000,00	-	197.000,00
1.1.5.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	985,00	30,00	29.550,00	985,00	-	985,00	29.550,00	-	29.550,00
1.1.6.	AF 07/2019	M	32,00	86,64	2.772,48	20,00	12,00	32,00	1.732,80	1.039,68	2.772,48
1.1.7.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	7.550,00	1,93	13.816,50	7.000,00	550,00	7.550,00	12.810,00	1.006,50	13.816,50
1.2.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUÉLAS DE VEDAÇÃO	CJ	7.550,00	1,93	13.816,50	7.000,00	550,00	7.550,00	12.810,00	1.006,50	13.816,50
1.2.1.	OUTROS	M2	935,00	2,60	2.431,00	-	-	-	-	2.431,00	2.431,00
1.2.1.1.	LMPEZA DE OBRA	M2	935,00	2,60	2.431,00	-	-	-	-	2.431,00	2.431,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
Data
quinta-feira, 27 de julho de 2023

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERIANANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREACAU: 112602-0/D
ARTIRRT: 0



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADOS – CMEI BAIRRO PLANALTO

CONTRATO Nº 24/2023/GP


Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA


Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 51.442,18.

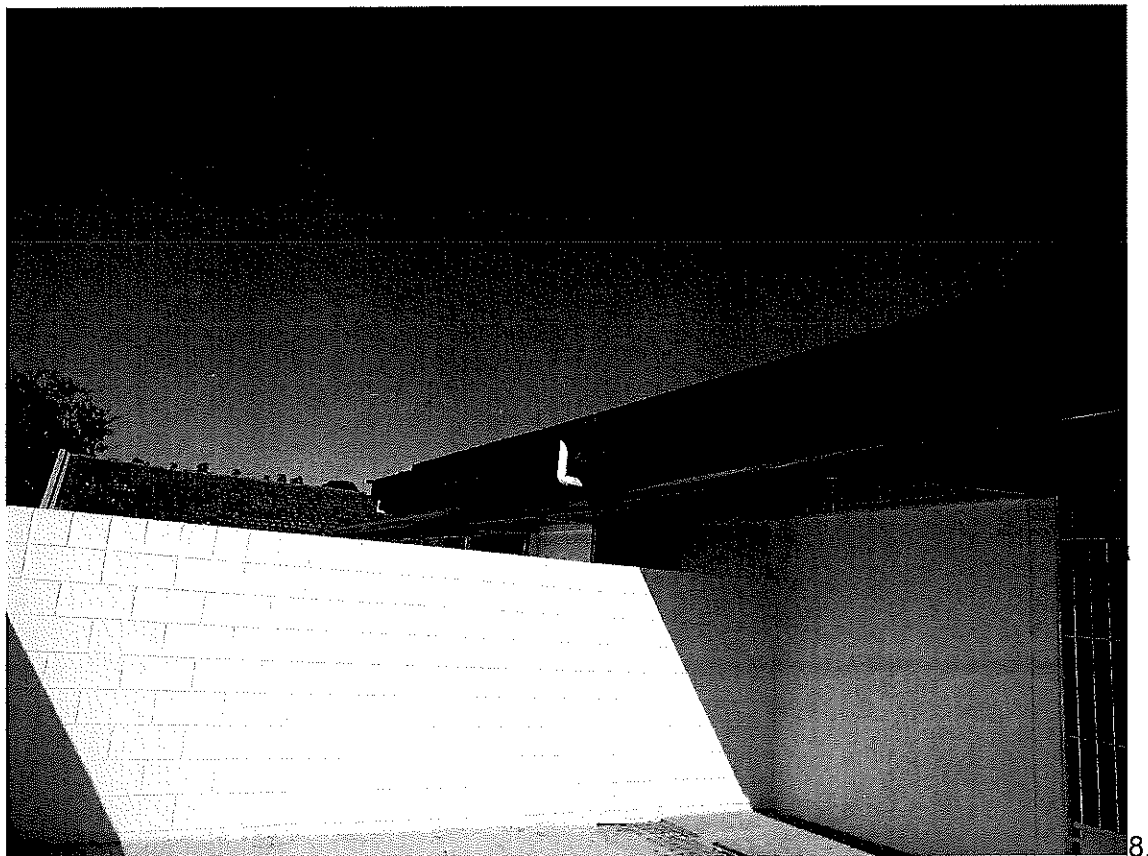



8.

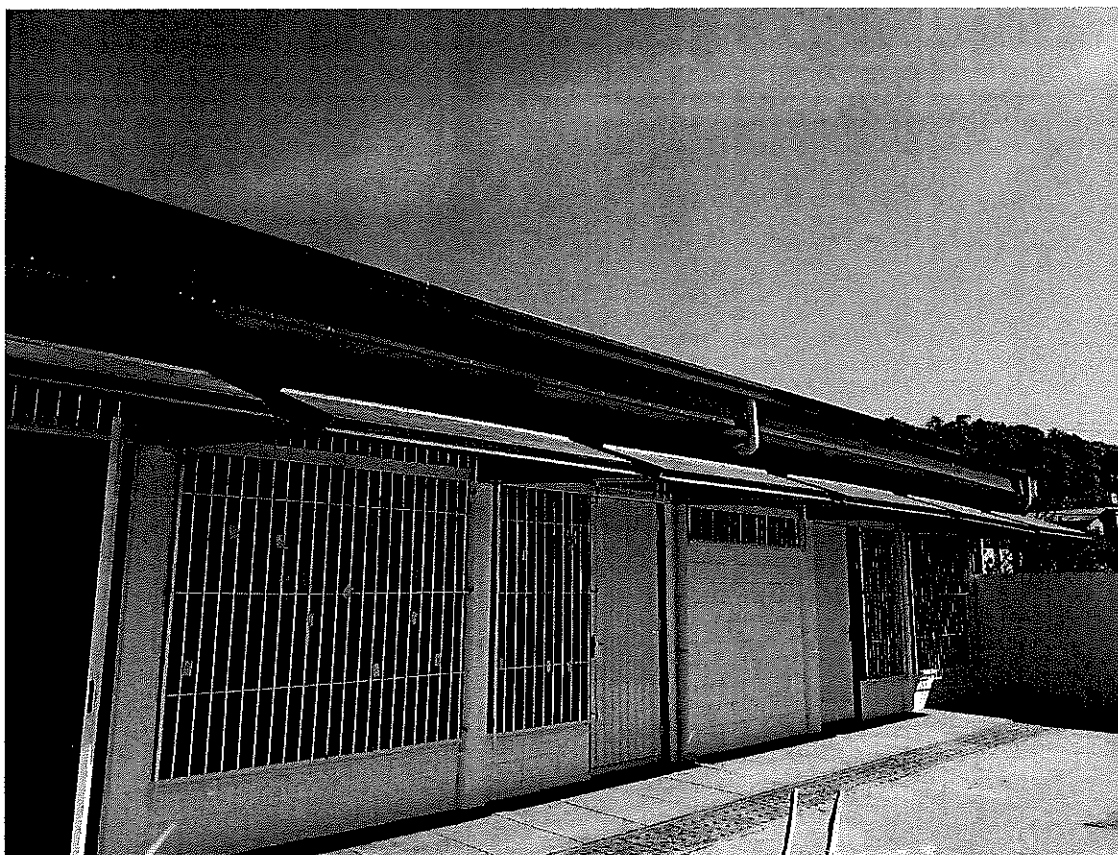







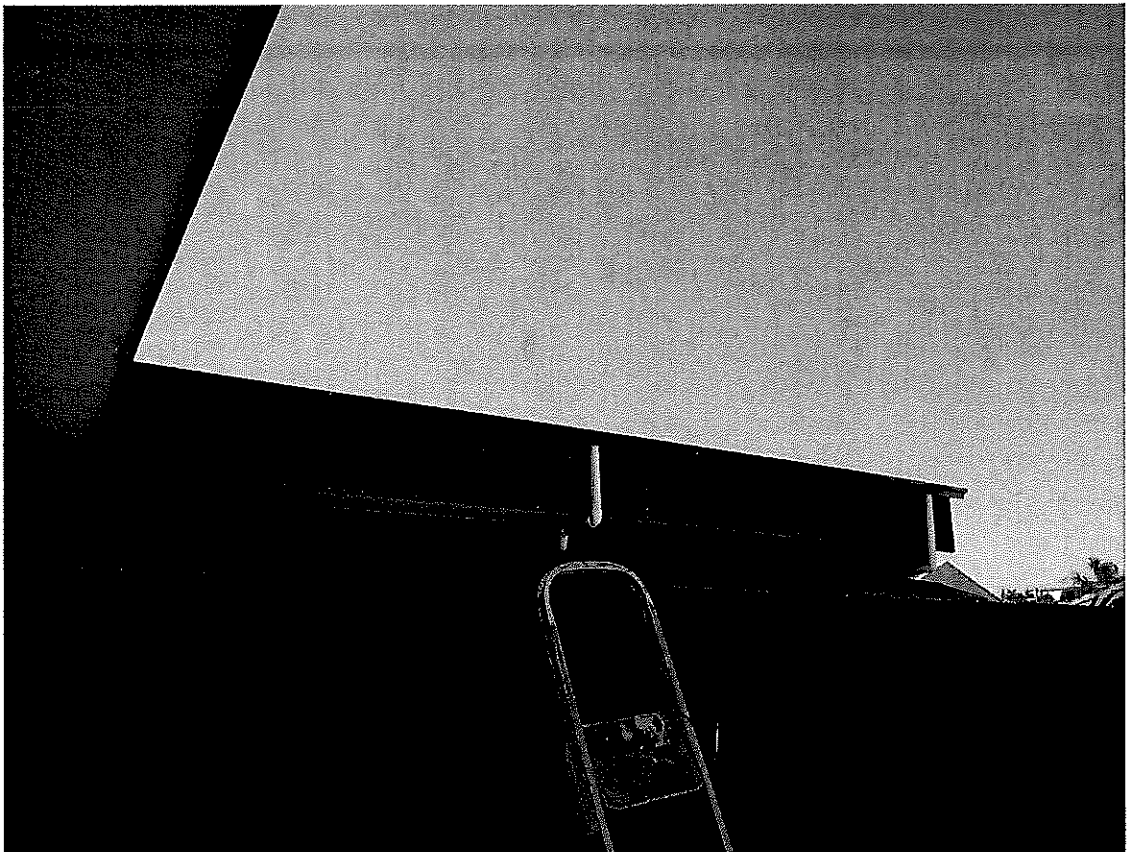


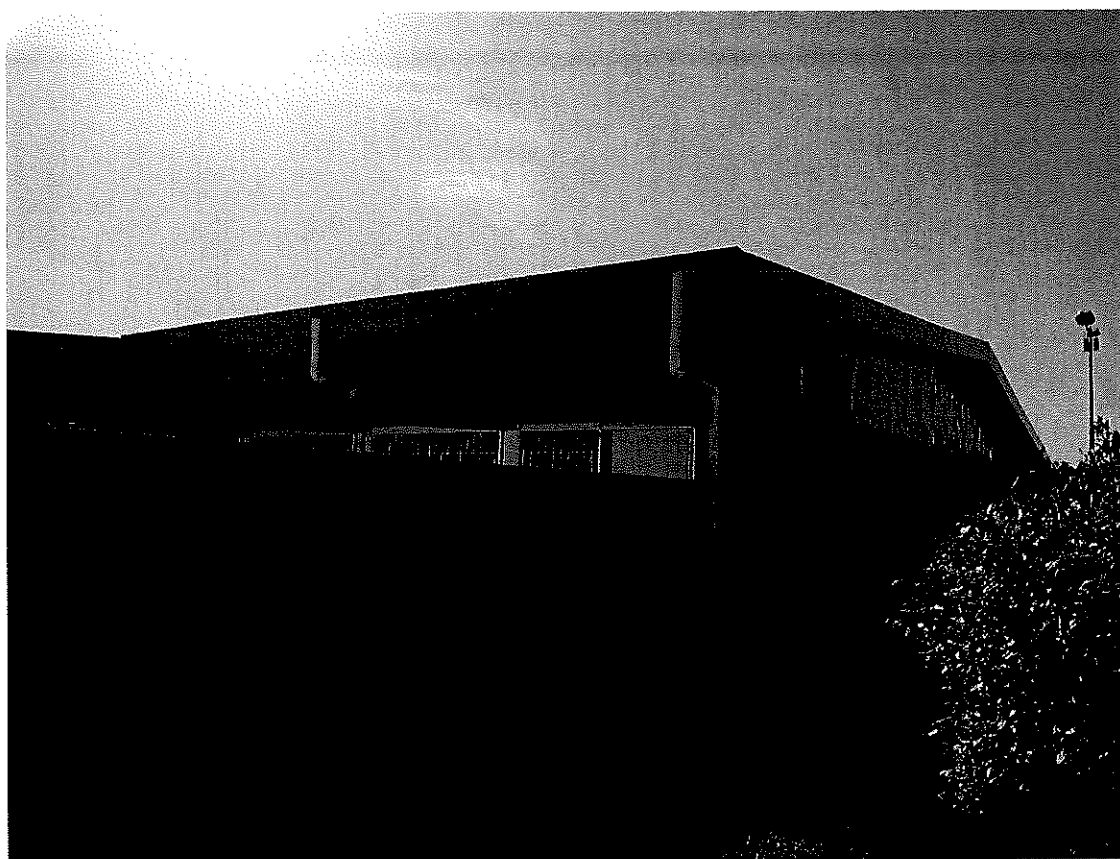

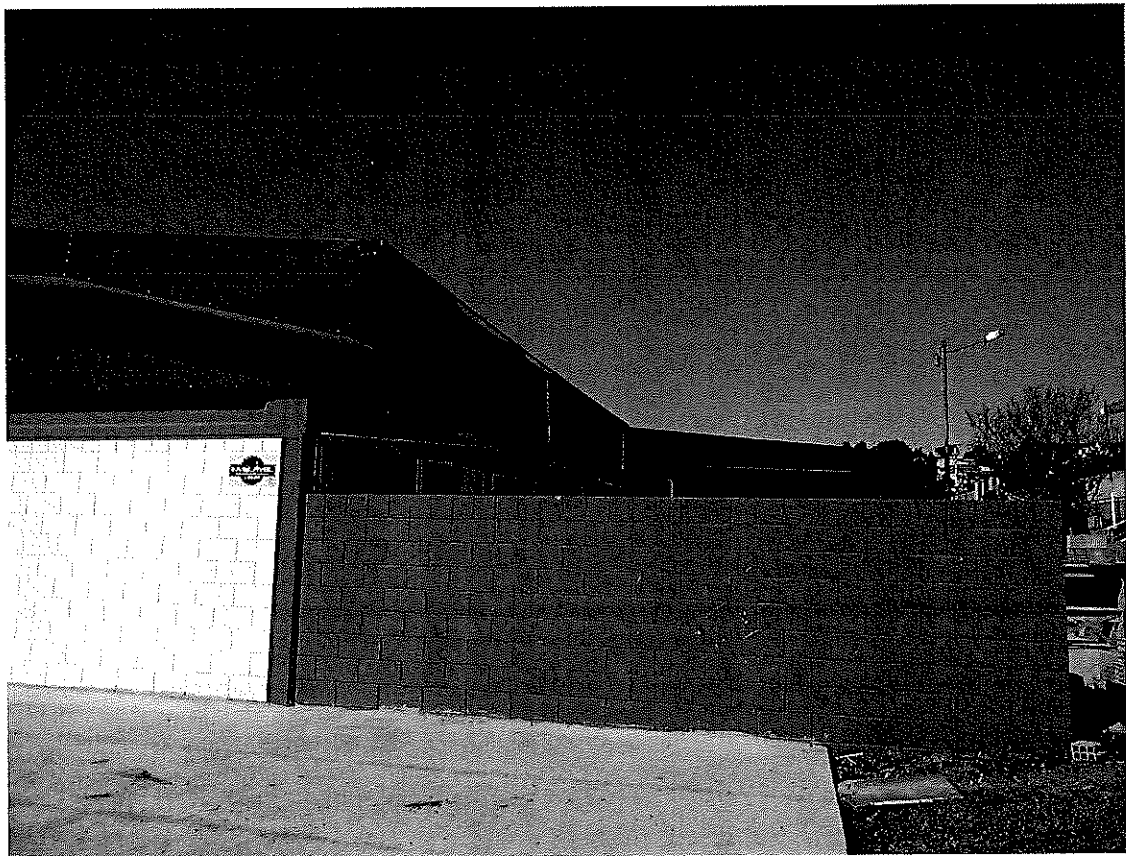

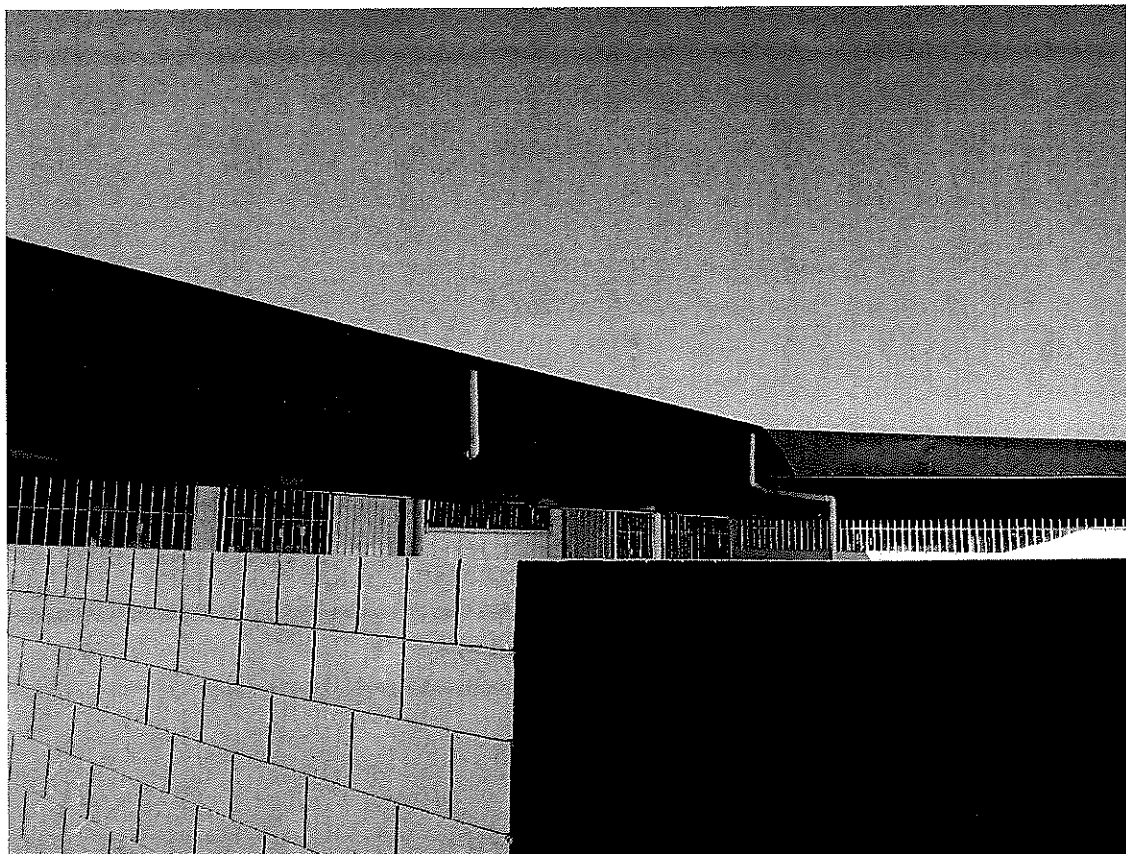

Pato Branco, 27 de julho de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
