



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: **6** Período: **07/11/2023 a 06/12/2023** % Realizado Período.: **6,21%** % Realizado Acum.: **40,70%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banzo inferior	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços Preliminares	2																								
3	Movimentação de terra - escavação	1																								
4	Movimentação de terra - reaterro																									
5	Locação da obra	1																								
6	Fundações - Movimentação de terra - Blocos		1	1	1	1	1	1	1																	
7	Fundações - Movimentação de terra - Baldrames																									
8	Fundações - Estacas		3	2	2	2	2	1	3																	
9	Fundações - Blocos		3	3	4	3	4	3	4																	
10	Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames		6	5	6	6																				
11	Estrutura moldada in loco - Pilares																									
12	Estrutura moldada in loco - Vigas																									
13	Estrutura moldada in loco - Escadas																									
14	Estrutura moldada in loco - Lajes maciças																									
15	Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar		6	5																						
16	Estrutura pré-moldada - Pilares		4	3	4	4	4	4	4																	
17	Estrutura pré-moldada - Vigas		4	3	4	4	4	4	4																	
18	Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré		5	5	6	6	5	6																		
19	Estrutura pré-moldada - Laje arquibancada		5	5	6	6	5	6																		
20	Estrutura pré-moldada - Laje alveolar		4	3			4	4																		
21	Impermeabilizações																									
22	Alvenarias, vergas e contravergas																									
23	Alvenarias - peitoril em granito																									
24	Divisórias																									
25	Instalações hidrossanitárias - movimentação																									
26	Ramal de distribuição de água																									
27	Tubulação PVC soldável e registros																									
28	Bomba Centrífuga																									
29	Reservatório para armazenamento de água																									
30	Kit cavalete entrada de água																									
31	Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto																									
32	Tubulação 150mm - Esgoto																									
33	Caixas enterradas - inc. caixa de gordura																									
34	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																									
35	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																									
36	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - ci																									
37	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - C																									
38	Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulaçã																									
39	Instalações elétricas - movimentação de terra																									
40	Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins																									



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: **6** Período: **07/11/2023 a 06/12/2023** % Realizado Período.: **6,21%** % Realizado Acum.: **40,70%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamen to	travamento do banzo inferior	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
41	Instalações elétricas - conexões para eletrodut																									
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes																									
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição																									
44	Instalações elétricas - Disjuntores																									
45	Instalações elétricas - Suporte e vergalhão																									
46	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5																									
47	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16,																									
48	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95,																									
49	Instalações elétricas - Caixas enterradas																									
50	Instalações elétricas - Interruptores e tomada																									
51	Instalações elétricas - Eletrocalhas																									
52	Instalações elétricas - Luminárias																									
53	Instalações elétricas - Refletores																									
54	Instalações elétricas - Entrada de energia																									
55	SPDA - Terminal aéreo e malha superior																									
56	SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior																									
57	SPDA - Barra chata de alumínio																									
58	SPDA - Descidas																									
59	SPDA - Caixas enterradas e caixa de equipor																									
60	PSCIP - Abrigos																									
61	PSCIP - Bomba de Incêndio																									
62	PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões																									
63	PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões																									
64	PSCIP - Reservatório, registros e conexões																									
65	PSCIP - Recalque no passeio																									
66	PSCIP - Acionador manual de bomba de incê																									
67	PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça																									
68	PSCIP - Barras anti-pânico																									
69	PSCIP - Extintores e sinalização																									
70	Revestimentos - fechamento lateral em telha																									
71	Revestimentos - paredes internas (chapisco e																									
72	Revestimentos - paredes fachada (chapisco e																									
73	Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)																									
74	Revetimentos - Pisos - Lastro																									
75	Revestimentos - Pisos - Regularização, reves																									
76	Revestimentos - Pisos - Piso industrial em CA																									
77	Revestimentos - Pisos - Acabamento polido																									
78	Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante																									
79	Revestimentos - Forro e teto																									
80	Cobertura - Treliças principais																									



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
81	Cobertura - Coberturas Laterais																									
82	Cobertura - Terças																									
83	Cobertura - Contraventamento																									
85	Cobertura - Telhamento																									
86	Cobertura - Calha em chapa de aço galv.																									
87	Cobertura - Calha em concreto																									
88	Cobertura - Rufo em granito																									
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos																									
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros																									
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana																									
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro																									
93	Portico em ACM																									
94	Esquadrias - Portas																									
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores																									
96	Corrimão simples em aço																									
97	Guarda corpo de aço galvanizado																									
98	Guarda corpo em ACM																									
99	Barreira em aço galvanizado																									
100	Louças																									
101	Metais e acessórios																									
102	Pintura - Paredes																									
103	Pintura - Tetos																									
104	Serviços Finais																									

Data das Medições												
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 3,78%	4,56%	6,75%	14,02%	5,37%	6,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 1.029.895,19	1.245.133,16	1.841.477,39	3.824.456,37	1.464.963,81	1.694.832,59	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 3,78%	8,34%	15,09%	29,11%	34,48%	40,70%	40,70%	40,70%	40,70%	40,70%	40,70%	40,70%
	R\$ 1.029.895,19	2.275.028,35	4.116.505,74	7.940.962,11	9.405.925,92	11.100.758,51	11.100.758,51	11.100.758,51	11.100.758,51	11.100.758,51	11.100.758,51	11.100.758,51

PATO BRANCO/PR
Local
quinta-feira, 7 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-107389/D
ART/RTT: 1720230911254
Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 07/12/2023 14:34:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

CONTRATO Nº370/2022-GP


Relatório de Medição nº 06

Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Responsável: Sálvio Pedro Machado

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a sexta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:



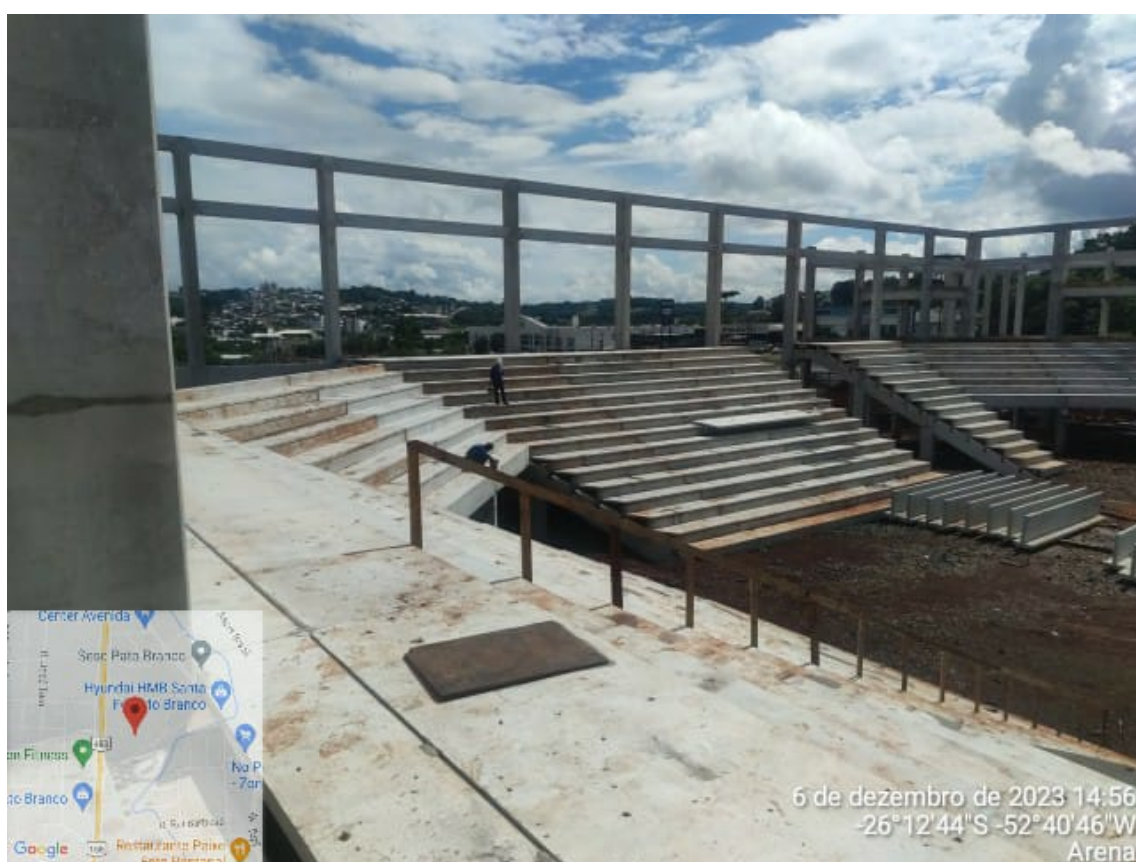
















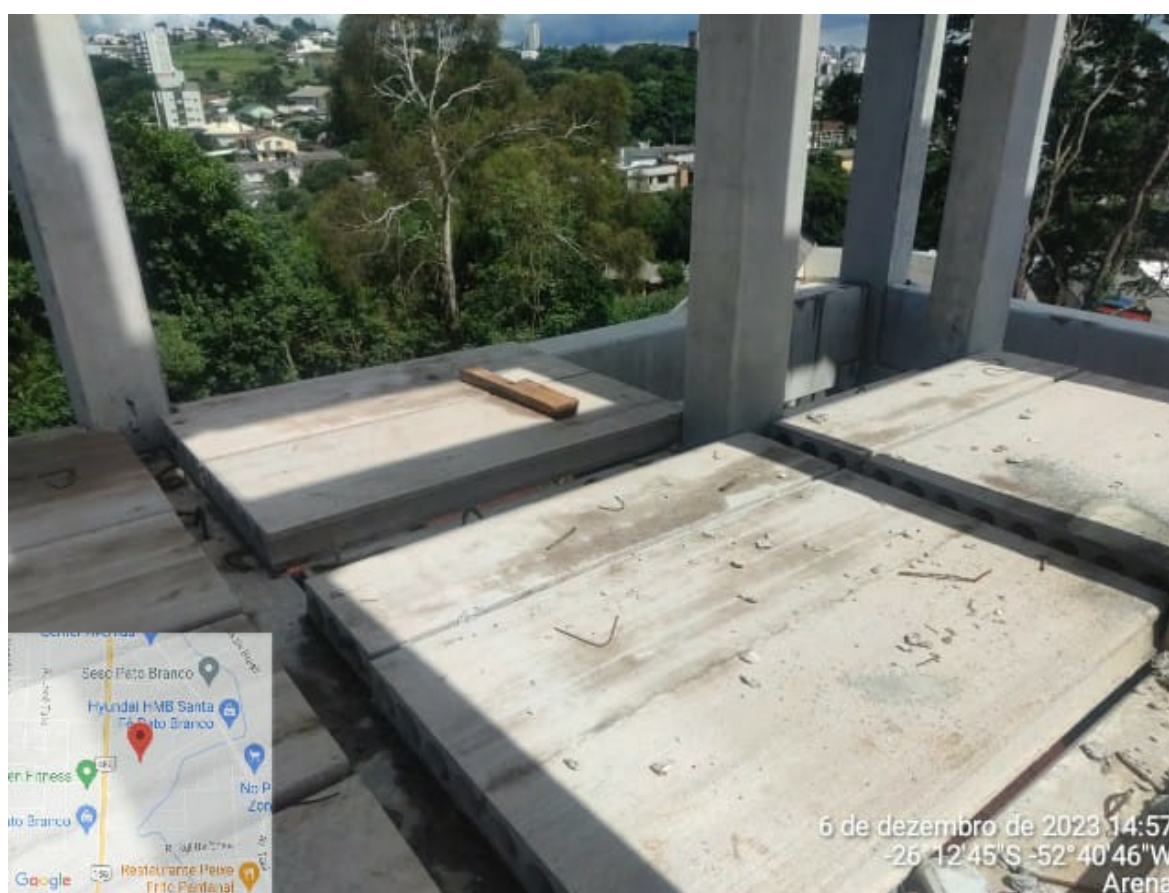

Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 1.694.832,59**.

Pato Branco, 06 de Dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA ZIANNI MANARIM**
Data: 19/12/2023 09:08:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
