



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CIDADANIA	INÍCIO DE OBRA 06/06/23	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA JG Derivados de cimento Ltda	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/08/2023 a 02/10/2023	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA												
TOTAL:						147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17
1.	CENTRO DE CIDADANIA				147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.221,00	22,49	17,25	39,74	1.399,10	1.073,13	2.472,23	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSIDERANDO ENGENHEIRO CIVIL 10H/SEMANAIS)				6.221,00	22,49	17,25	39,74	1.399,10	1.073,13	2.472,23	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.129,10	45,69	-	45,69	1.886,69	-	1.886,69	
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1.886,69	100,00	-	100,00	1.886,69	-	1.886,69	
1.2.0.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)				2.242,41	-	-	-	-	-	-	
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				5.305,70	95,83	0,89	96,71	5.084,22	47,04	5.131,26	
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				10,87	100,00	-	100,00	10,87	-	10,87	
1.3.0.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				51,81	100,00	-	100,00	51,81	-	51,81	
1.3.0.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				869,78	100,00	-	100,00	869,78	-	869,78	
1.3.0.4.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				2.201,29	100,00	-	100,00	2.201,29	-	2.201,29	
1.3.0.5.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				0,81	-	100,00	100,00	-	0,81	0,81	
1.3.0.6.	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				16,40	-	100,00	100,00	-	16,40	16,40	
1.3.0.7.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				29,83	-	100,00	100,00	-	29,83	29,83	
1.3.0.8.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				3,25	100,00	-	100,00	3,25	-	3,25	
1.3.0.9.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				59,84	100,00	-	100,00	59,84	-	59,84	
1.3.0.10.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				141,70	100,00	-	100,00	141,70	-	141,70	
1.3.0.11.	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021				25,05	-	-	-	-	-	-	
1.3.0.12.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				216,68	100,00	-	100,00	216,68	-	216,68	
1.3.0.13.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				79,10	100,00	-	100,00	79,10	-	79,10	
1.3.0.14.	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO				878,09	100,00	-	100,00	878,09	-	878,09	
1.3.0.15.	RETIRADA DE GUARDA-CORPO DE MADEIRA.				224,91	100,00	-	100,00	224,91	-	224,91	
1.3.0.16.	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.				65,24	100,00	-	100,00	65,24	-	65,24	
1.3.0.17.	REMOÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COMPLETO, INCLUSIVE RETIRADA DO POSTE E DEMOLIÇÃO DA MURETA DE ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DO POSTE.				91,43	-	-	-	-	-	-	
1.3.0.18.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL A SER REAPROVEITADO				60,00	50,00	-	50,00	30,00	-	30,00	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CIDADANIA	INÍCIO DE OBRA 06/06/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA JG Derivados de cimento Ltda	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/08/2023 a 02/10/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA					23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17
TOTAL:					147.994,39					
1.3.0.19.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			85,79	90,00	-	90,00	77,21	-	77,21
1.3.0.20.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			193,83	90,00	-	90,00	174,45	-	174,45
1.4.	PAREDES E DIVISÓRIAS			20.653,32	-	12,50	12,50	-	2.582,23	2.582,23
1.4.0.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.			2.222,21	-	100,00	100,00	-	2.222,21	2.222,21
1.4.0.2.	DIVISÓRIA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRANCO ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			18.071,09	-	-	-	-	-	-
1.4.0.3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			182,08	-	100,00	100,00	-	182,08	182,08
1.4.0.4.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			177,94	-	100,00	100,00	-	177,94	177,94
1.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			6.261,23	96,82	1,22	98,05	6.062,39	76,54	6.138,93
1.5.1.	Movimentação de Terra			1.188,80	100,00	-	100,00	1.188,80	-	1.188,80
1.5.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			743,66	100,00	-	100,00	743,66	-	743,66
1.5.1.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017			445,14	100,00	-	100,00	445,14	-	445,14
1.5.2.	Água Fria			1.530,74	95,00	5,00	100,00	1.454,20	76,54	1.530,74
1.5.2.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			1.530,74	95,00	5,00	100,00	1.454,20	76,54	1.530,74
1.5.3.	Esgoto			3.541,69	96,55	-	96,55	3.419,39	-	3.419,39
1.5.3.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			387,10	100,00	-	100,00	387,10	-	387,10
1.5.3.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015			1.860,99	100,00	-	100,00	1.860,99	-	1.860,99
1.5.3.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			526,26	100,00	-	100,00	526,26	-	526,26



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CIDADANIA	INÍCIO DE OBRA 06/06/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA JG Derivados de cimento Ltda	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/08/2023 a 02/10/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA					TOTAL:	147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17
1.5.3.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015				503,30	100,00	-	100,00	503,30	-	503,30	
1.5.3.5.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				44,69	100,00	-	100,00	44,69	-	44,69	
1.5.3.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				97,05	100,00	-	100,00	97,05	-	97,05	
1.5.3.7.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020				122,30	-	-	-	-	-	-	
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA				25.797,45	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.	Movimentação de Terra				180,93	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				112,64	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				68,29	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.	Instalações Elétricas				24.450,32	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.1.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				41,38	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.2.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				25,69	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				622,10	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				4.002,40	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				1.518,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				284,32	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				281,70	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.8.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				32,94	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.9.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				24,56	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.10.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				185,44	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.11.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				62,46	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.12.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				601,60	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CIDADANIA	INÍCIO DE OBRA 06/06/23	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA JG Derivados de cimento Ltda	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/08/2023 a 02/10/2023	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA										
TOTAL:				147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17
1.6.2.13.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015			362,46	-	-	-	-	-	-
1.6.2.14.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020			346,88	-	-	-	-	-	-
1.6.2.15.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020			914,21	-	-	-	-	-	-
1.6.2.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015			1.261,00	-	-	-	-	-	-
1.6.2.17.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021			163,60	-	-	-	-	-	-
1.6.2.18.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021			71,22	-	-	-	-	-	-
1.6.2.19.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015			39,78	-	-	-	-	-	-
1.6.2.20.	RECOLOCAÇÃO DE PLAFON RETANGULAR SOBREPOR LED 40W			192,10	-	-	-	-	-	-
1.6.2.21.	PLAFON RETANGULAR SOBREPOR LED 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			4.991,22	-	-	-	-	-	-
1.6.2.22.	RECOLOCAÇÃO DE PLAFON QUADRADO SOBREPOR LED 24W			192,48	-	-	-	-	-	-
1.6.2.23.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA, CABO DE 95MM2, INCLUSO QUADRO DE MEDIÇÃO, POSTE DE CONCRETO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			6.449,96	-	-	-	-	-	-
1.6.2.24.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020			1.782,82	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	Instalações de Lógica			1.166,20	-	-	-	-	-	-
1.6.3.1.	CONECTOR RJ45 (CM8V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			25,90	-	-	-	-	-	-
1.6.3.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015			70,65	-	-	-	-	-	-
1.6.3.3.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019			734,00	-	-	-	-	-	-
1.6.3.4.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019			335,65	-	-	-	-	-	-
1.7.	REVESTIMENTOS			41.074,80	48,91	40,39	89,29	20.087,94	16.588,63	36.676,57
1.7.1.	Piso			25.627,63	78,38	11,01	89,39	20.087,94	2.820,81	22.908,75
1.7.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_ 08/2017			43,39	100,00	-	100,00	43,39	-	43,39
1.7.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016			295,87	100,00	-	100,00	295,87	-	295,87
1.7.1.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021			5.644,66	100,00	-	100,00	5.644,66	-	5.644,66



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CIDADANIA	INÍCIO DE OBRA 06/06/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA JG Derivados de cimento Ltda	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/08/2023 a 02/10/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA										
TOTAL:				147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17
1.7.1.4.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022			16.835,41	75,00	15,00	90,00	12.626,56	2.525,31	15.151,87
1.7.1.5.	RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5MM, H=10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.969,95	75,00	15,00	90,00	1.477,46	295,50	1.772,96
1.7.1.6.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			838,35	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	Paredes Internas			11.985,07	-	100,00	100,00	-	11.985,07	11.985,07
1.7.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			12,42	-	100,00	100,00	-	12,42	12,42
1.7.2.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014			102,16	-	100,00	100,00	-	102,16	102,16
1.7.2.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 40X40 CM			11.870,49	-	100,00	100,00	-	11.870,49	11.870,49
1.7.3.	Paredes Externas			347,89	-	100,00	100,00	-	347,89	347,89
1.7.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			54,01	-	100,00	100,00	-	54,01	54,01
1.7.3.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			293,88	-	100,00	100,00	-	293,88	293,88
1.7.4.	Forro			3.114,21	-	46,07	46,07	-	1.434,86	1.434,86
1.7.4.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P			1.793,58	-	80,00	80,00	-	1.434,86	1.434,86
1.7.4.2.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA.			1.320,63	-	-	-	-	-	-
1.8.	ESQUADRIAS			11.406,13	-	14,52	14,52	-	1.656,15	1.656,15
1.8.1.	Janelas			2.610,28	-	63,45	63,45	-	1.656,15	1.656,15
1.8.1.1.	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			1.875,24	-	70,00	70,00	-	1.312,67	1.312,67
1.8.1.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021			490,69	-	70,00	70,00	-	343,48	343,48
1.8.1.3.	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021			244,35	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	Portas			8.795,85	-	-	-	-	-	-
1.8.2.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930), 70X210CM, E=35MM, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO EM MELAMINICO PADRÃO MADEIRA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			1.251,03	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	CENTRO DE CIDADANIA	06/06/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	JG Derivados de cimento Ltda	19.376.115/0001-03	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		17/08/2023 a 02/10/2023
					Nº MEDIÇÃO
					3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA					TOTAL:	147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17
1.8.2.2.	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70X210CM, E=35MM, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO EM MELAMINICO PADRÃO MADEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO, BATENTE, TRILHO, RODÍZIO PARA TRILHO, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.162,31	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.3.	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90X210CM, E=35MM, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO EM MELAMINICO PADRÃO MADEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO, BATENTE, TRILHO, RODÍZIO PARA TRILHO, FECHADURA E PUXADOR PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.592,45	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.4.	PORTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRANCO 10MM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				4.050,96	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.5.	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019				164,98	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.6.	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019				99,32	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.7.	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 200CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.				437,08	-	-	-	-	-	-	
1.8.2.8.	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, 90X210CM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DA PORTA.				37,72	-	-	-	-	-	-	
1.9.	PINTURA				13.614,68	1,14	29,58	30,72	154,67	4.027,63	4.182,30	
1.9.1.	Paredes Internas				3.650,27	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO.				459,90	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014				52,99	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014				241,44	-	-	-	-	-	-	
1.9.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014				2.895,94	-	-	-	-	-	-	
1.9.2.	Paredes Externas				3.016,73	-	80,00	80,00	-	2.413,38	2.413,38	
1.9.2.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014				24,11	-	80,00	80,00	-	19,29	19,29	
1.9.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA (GRAFIATO) EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES.				172,13	-	80,00	80,00	-	137,70	137,70	
1.9.2.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014				2.820,49	-	80,00	80,00	-	2.256,39	2.256,39	
1.9.3.	Teto e Forro				5.126,96	2,90	27,92	30,82	148,45	1.431,68	1.580,13	
1.9.3.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021				296,89	50,00	50,00	100,00	148,45	148,44	296,89	
1.9.3.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021				2.566,47	-	50,00	50,00	-	1.283,24	1.283,24	
1.9.3.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014				77,07	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	CENTRO DE CIDADANIA	06/06/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	JG Derivados de cimento Ltda	19.376.115/0001-03	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		17/08/2023 a 02/10/2023
					Nº MEDIÇÃO
					3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA										
TOTAL:					147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16
1.9.3.4.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			526,56	-	-	-	-	-	-
1.9.3.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			1.659,97	-	-	-	-	-	-
1.9.4.	Beiral			1.745,72	-	10,37	10,37	-	181,01	181,01
1.9.4.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021			181,01	-	100,00	100,00	-	181,01	181,01
1.9.4.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021			1.564,71	-	-	-	-	-	-
1.9.5.	Esquadrias de Madeira Novas			75,00	8,29	2,08	10,37	6,22	1,56	7,78
1.9.5.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021			7,78	80,00	20,00	100,00	6,22	1,56	7,78
1.9.5.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021			67,22	-	-	-	-	-	-
1.10.	GUARDA-CORPO DE MADEIRA			449,81	-	100,00	100,00	-	449,81	449,81
1.10.0.1.	RECOLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE MADEIRA.			449,81	-	100,00	100,00	-	449,81	449,81
1.11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			10.702,77	-	-	-	-	-	-
1.11.0.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			620,40	-	-	-	-	-	-
1.11.0.2.	RECOLOCAÇÃO DA BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM CUBA DE INÓX, INCLUSIVE MASSA PLÁSTICA, REJUNTE E SUPORTE.			180,26	-	-	-	-	-	-
1.11.0.3.	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DE 0,55 X 0,60 M, INCLUSO SAIA E RODOPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			513,07	-	-	-	-	-	-
1.11.0.4.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			119,67	-	-	-	-	-	-
1.11.0.5.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			159,54	-	-	-	-	-	-
1.11.0.6.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			384,39	-	-	-	-	-	-
1.11.0.7.	RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA.			361,46	-	-	-	-	-	-
1.11.0.8.	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			691,04	-	-	-	-	-	-
1.11.0.9.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			648,32	-	-	-	-	-	-
1.11.0.10.	RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			443,46	-	-	-	-	-	-
1.11.0.11.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.356,58	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	CENTRO DE CIDADANIA	06/06/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	JG Derivados de cimento Ltda	19.376.115/0001-03	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		17/08/2023 a 02/10/2023
					Nº MEDIÇÃO
					3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA					TOTAL:	147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16	61.176,17
1.11.0.12.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				395,42	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.13.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				379,88	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.14.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				790,84	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.15.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				245,16	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.16.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				253,08	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.17.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				253,08	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.18.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				862,78	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.19.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA				2.044,34	-	-	-	-	-	-	
1.12.	PSCIP				1.719,67	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				246,82	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.2.	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - 2A - 20B:C COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				986,84	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				141,30	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				119,40	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 78X45CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820				225,31	-	-	-	-	-	-	
1.13.	SERVIÇOS FINAIS				658,73	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.1.	LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO.				420,56	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019				175,56	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.3.	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019				10,45	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.4.	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.				26,08	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.5.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019				26,08	-	-	-	-	-	-	

Observações:



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CIDADANIA	INÍCIO DE OBRA 06/06/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA JG Derivados de cimento Ltda	CNPJ 19.376.115/0001-03	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/08/2023 a 02/10/2023
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 41,34%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF: CENTRO DE CIDADANIA					TOTAL: 147.994,39	23,43	17,91	41,34	34.675,01	26.501,16
										61.176,17

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR
Local
segunda-feira, 2 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 185508/D
ART/RRT: 1720233136413

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma digital por JAKELINE LOUREIRO:09802974943
Dados: 2023.10.03 09:20:41 -03'00'

Reforma de 175,20m² da antiga Casa do Artesão localizada na Praça Santos Dumont, localizado na Rua Itacolomi, nº 863 – Centro – Pato Branco -PR, para implantação do Centro de Cidadania, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Contrato nº 74/2023/GP

Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

Responsável: . João Paulo Matielo

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:




















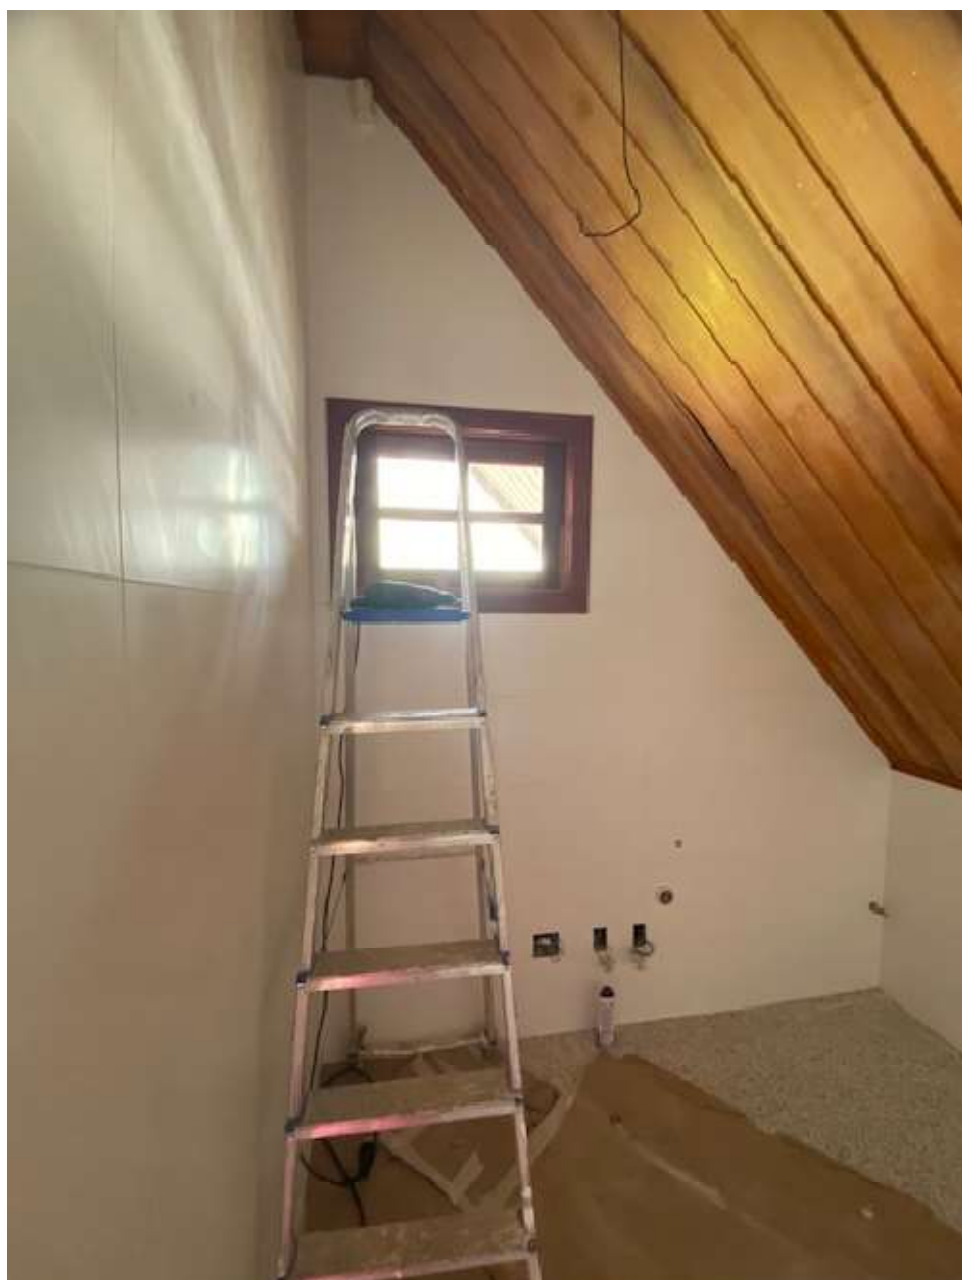





Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 26.501,16**.

Pato Branco, 02 de outubro de 2023.

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma
digital por JAKELINE
LOUREIRO:098029749
43
Dados: 2023.10.03
09:21:17 -03'00'

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D
