



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 06 de julho 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 342/2022-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 618.058,17	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 10/03/2023	66,07	R\$ 408.357,68	33,93	R\$ 209.700,49
A liberar 2.ª Parcela em 26/04/2023	83,08	R\$ 105.181,20	16,92	R\$ 104.519,29
A liberar 3.ª Parcela em 06/07/2023	100,00	104.519,29	-	-

Valor a ser liberado em 06/07/2023 R\$ 104.519,29

Gestora e fiscal do contrato.

Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato

Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação		Nº Siconv		Apeido do Empreendimento		Início de Obra	
Nº CTEF		CNPJ		Regime de Execução		Troca de Telhados		22/09/22	
EMPRESA EXECUTORA		10.783.587/0001-96		(SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº Medição	
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA						27/04/2023 a 20/06/2023		3	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Periodo	Acum. incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:							
1.1.	TELHADOS	-	-	-	618.058,17	-	-	-	513.538,88	104.519,29	618.058,17
1.1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	548.617,76	-	-	-	480.847,40	67.770,36	548.617,76
1.1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.093,00	62,00	67.766,00	1.000,00	93,00	1.093,00	62.000,00	5.766,00	67.766,00
1.1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.093,00	4,00	4.372,00	1.000,00	93,00	1.093,00	4.000,00	372,00	4.372,00
1.1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.093,00	7,00	7.651,00	1.000,00	93,00	1.093,00	7.000,00	651,00	7.651,00
1.1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.093,00	225,00	245.925,00	1.000,00	93,00	1.093,00	225.000,00	20.925,00	245.925,00
1.1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	263,00	120,00	31.560,00	200,00	63,00	263,00	24.000,00	7.560,00	31.560,00
1.1.1.6.	RIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	326,00	75,00	24.450,00	300,00	26,00	326,00	22.500,00	1.950,00	24.450,00
1.1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	410,00	200,00	82.000,00	350,00	60,00	410,00	70.000,00	12.000,00	82.000,00
1.1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	264,00	129,45	34.174,80	164,00	100,00	264,00	21.229,80	12.945,00	34.174,80
1.1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P	M2	1.093,00	30,00	32.790,00	1.000,00	93,00	1.093,00	30.000,00	2.790,00	32.790,00
1.1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	114,00	86,64	9.876,96	90,00	24,00	114,00	7.797,60	2.079,36	9.876,96
1.1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" x 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI FORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4.400,00	1,83	8.052,00	4.000,00	400,00	4.400,00	7.320,00	732,00	8.052,00
1.2.	Ferro de PVC	-	-	-	65.871,11	-	-	-	29.769,48	36.101,63	65.871,11
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	829,00	2,12	1.757,48	829,00	-	829,00	1.757,48	-	1.757,48
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 06/2017_P	M2	829,00	70,03	58.054,87	400,00	429,00	829,00	28.012,00	30.042,87	58.054,87
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	907,00	6,68	6.058,76	-	907,00	907,00	-	6.058,76	6.058,76
1.3.	OUTROS	-	-	-	3.569,30	-	-	-	2.922,00	647,30	3.569,30
1.3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	75,00	9,70	727,50	60,00	15,00	75,00	582,00	145,50	727,50
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.093,00	2,60	2.841,80	900,00	193,00	1.093,00	2.340,00	501,80	2.841,80

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº Siconv	Apelo do Empreendimento	Início de Obra
0	0	0	0	22/09/22
Nº CTEF	CNPJ	Regime de Execução	Período da Medição	Nº Medição
0	10.783.587/0001-96	(SELECIONAR)	27/04/2023 a 20/06/2023	3
EMPRESA EXECUTORA				
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA				

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclundo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclundo o Período
Objeto do CTEF:						TOTAL:					

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
quinta-feira, 6 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERLANDIA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 1720230300123



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

CONTRATO Nº342/2022/GP

Relatório de Medição nº 03


Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA


Responsável: Leonardo de Souza Brognoli


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 104.519,29.




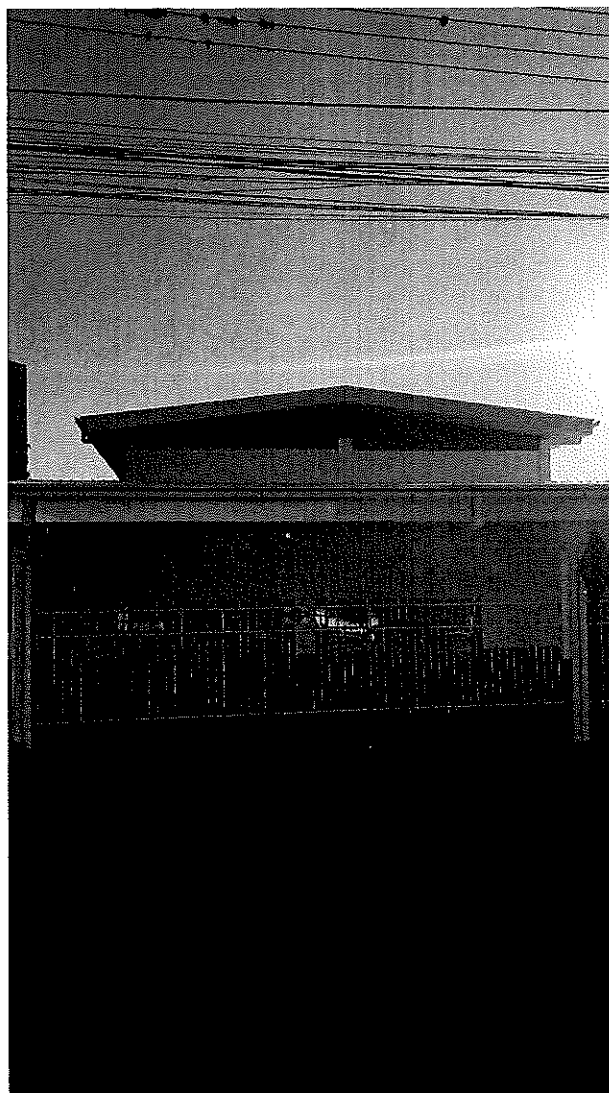

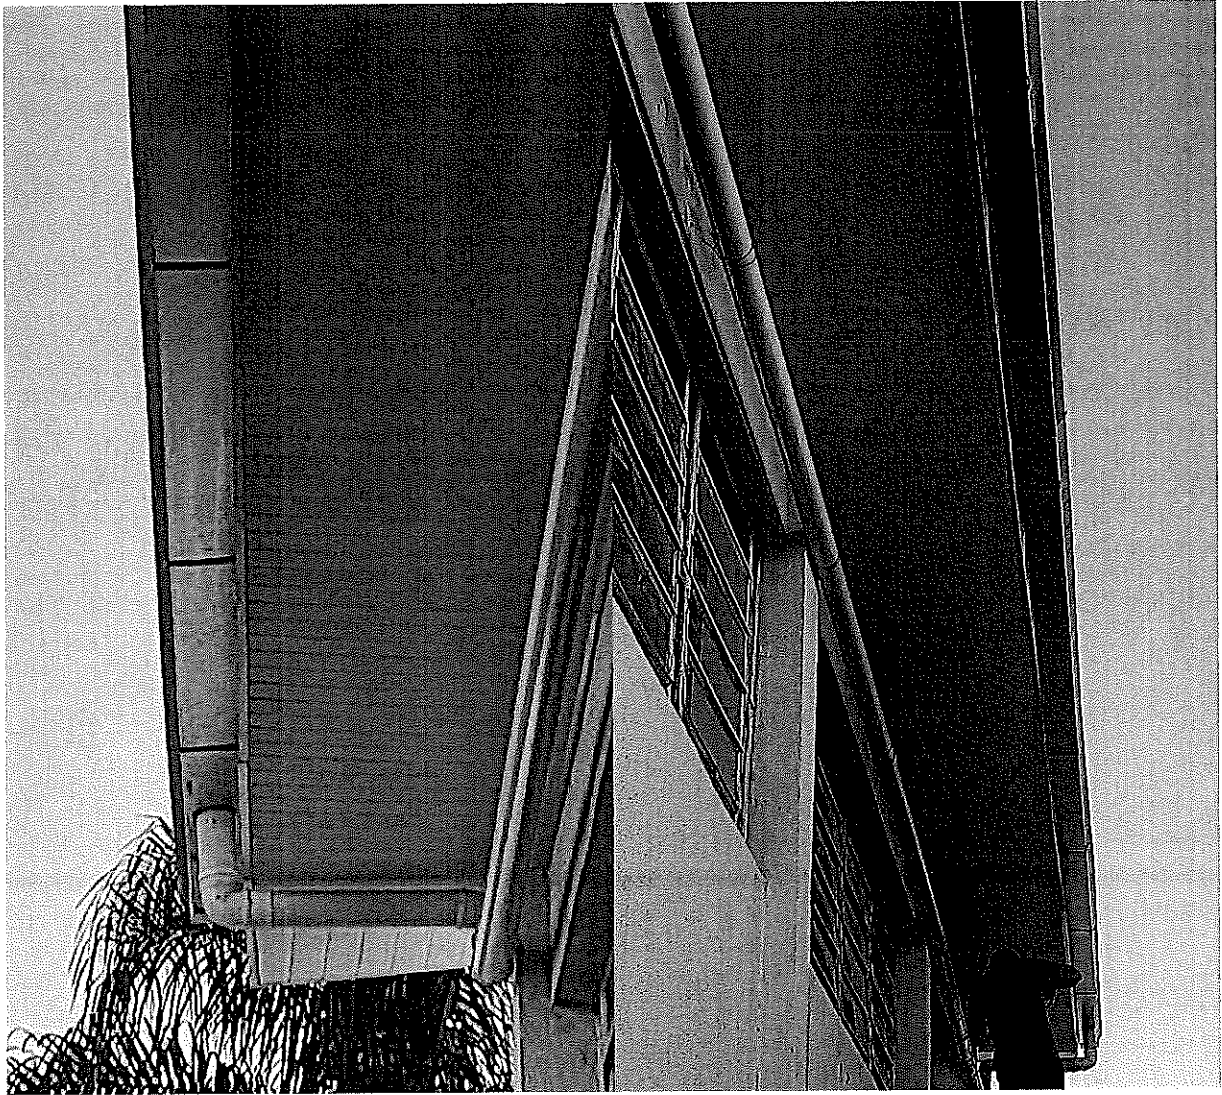

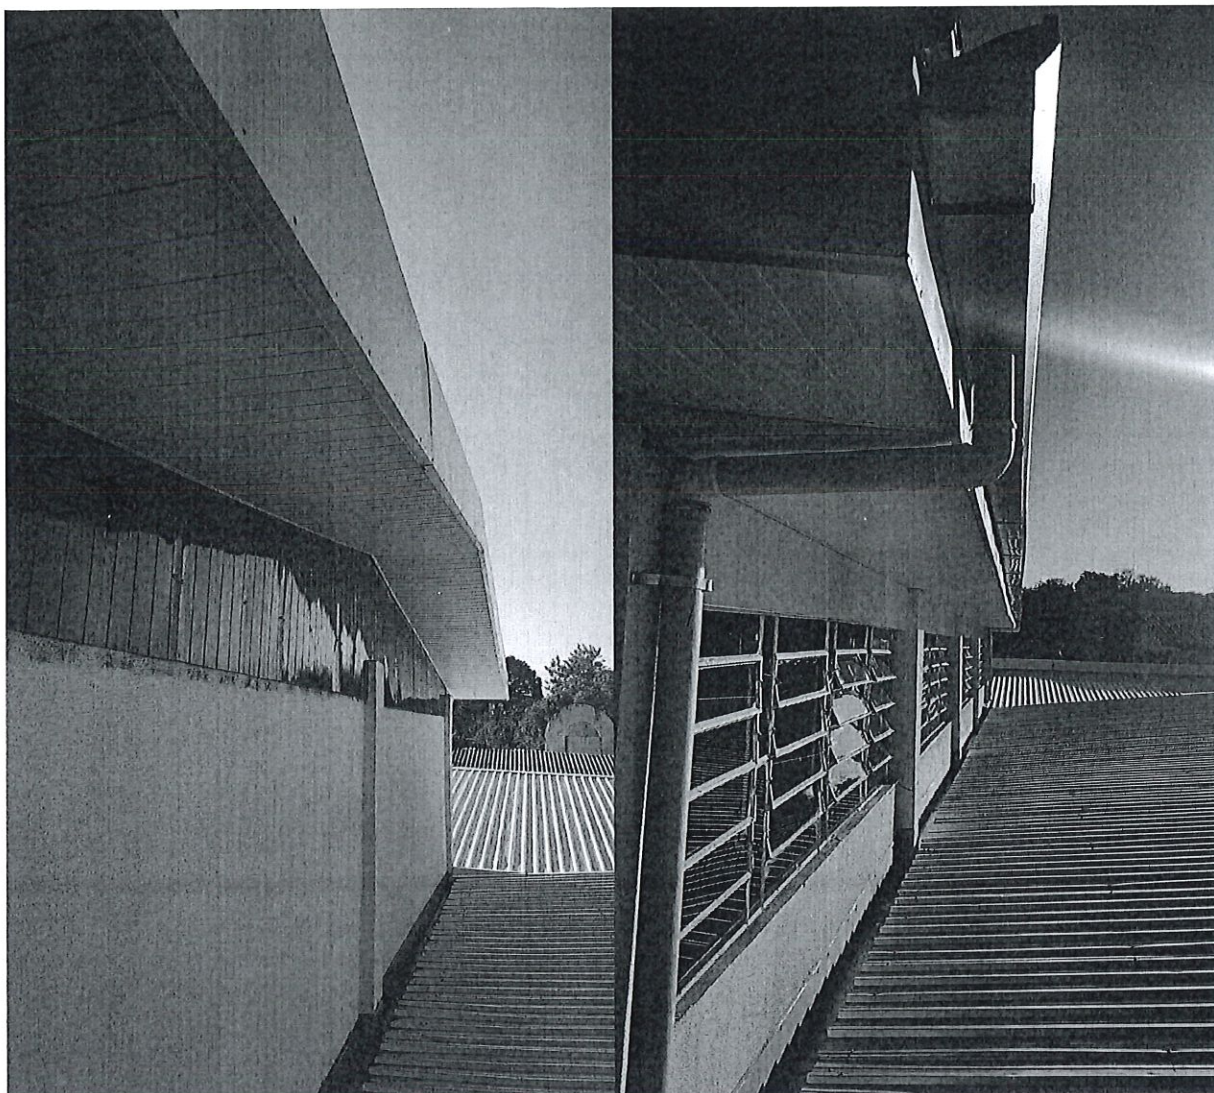

Pato Branco, 06 de julho de 2023.


Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D

Página 5 de 5
