



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	19/2024	Nº	
DATA:	09/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Set
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	3
		Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	-------------	-------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	1.1.2		LOCAÇÃO							-	-	-
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,25	100,00%	0,0273	2,73%	73,50	7.882,88	7.882,88	-
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS							-	-	-
	1.2.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							-	-	-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS							-	-	-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	100,00%	0,0536	5,36%	154,65	15.465,00	15.465,00	-
	1.2.2		BARRAÇÃO DE OBRA							-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0323	3,23%	1.554,47	9.326,82	9.326,82	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0113	1,13%	3.247,38	3.247,38	3.247,38	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	774,12	100,00%	0,0012	0,12%	0,46	356,10	356,10	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA	M	37,00	100,00%	0,0025	excesso	19,66	727,41	727,41	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	104,00	100,00%	0,0025	0,25%	6,82	709,28	709,28	-
	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	275,46	100,00%	0,0094	0,94%	9,89	2.724,30	2.724,30	-
	3		ESTRUTURAS							-	-	-
	4.4		LASTROS							-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES							-	-	-
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9,64	100,00%	0,0039	0,39%	116,76	1.125,57	1.125,57	-
	4		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEIS							-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00	100,00%	0,0201	2,01%	17,33	5.805,55	5.805,55	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	19/2024	Nº	
DATA:	09/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Set
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	3
		Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
91835		SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0026	0,26%	15,22	761,00	761,00	-
91847		SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00%	0,0069	0,69%	19,81	1.981,00	1.981,00	-
8.2.3.2			ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-	-	-
91871		SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	18,74	56,22	56,22	-
91872		SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	100,00%	0,0004	0,04%	24,62	123,10	123,10	-
8.2.5			CABOS		-				-	-	-	-
8.2.5.1			ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
91926		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	100,00%	0,0083	0,83%	4,80	2.400,00	2.400,00	-
91932		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	100,00%	0,0028	0,28%	17,82	801,90	801,90	-
8.2.8			CAIXAS		-				-	-	-	-
97881		SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	117,36	117,36	117,36	-
8.2.9			QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
101879		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0029	0,29%	830,06	830,06	830,06	-
8.2.11			DISJUNTORES		-				-	-	-	-
8.2.11.1			MONOPOLARES		-				-	-	-	-
93655		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	15,52	15,52	15,52	-
8.2.11.2			BIPOLARES		-				-	-	-	-
93662		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	68,26	68,26	68,26	-
93666		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100,00%	0,0006	0,06%	84,67	169,34	169,34	-
8.2.21			REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
101632		SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	46,98	46,98	46,98	-
x			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILACÃO		-				-	-	-	-
16.105.0000	PINI - fev/23		ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	100,00%	0,0094	0,94%	2.720,52	2.720,52	2.720,52	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	19/2024	Nº	
DATA:	09/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Set
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	SAM	74
FIRMA EMPREITEIRA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	3
		Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6,00	100,00%	0,0022	0,22%	107,89	647,34	647,34	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	4,50	100,00%	0,0010	0,10%	65,42	294,39	294,39	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0007	0,07%	207,93	207,93	207,93	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00	100,00%	0,0063	0,63%	130,54	1.827,56	1.827,56	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=4,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00	100,00%	0,0966	9,66%	2.145,38	27.889,94	27.889,94	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM	UNID	1,00	100,00%	0,0049	0,49%	1.403,23	1.403,23	1.403,23	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	100,00%	0,0022	0,22%	52,56	630,72	630,72	-
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA						-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0010	0,10%	297,61	297,61	297,61	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	166,29	166,29	166,29	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	102,65	102,65	102,65	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA						-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO						-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,65	100,00%	0,0005	0,05%	15,52	149,77	149,77	-
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA						-	-	-	-
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	100,00%	0,0001	0,01%	11,84	35,52	35,52	-
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	100,00%	0,0001	0,01%	16,29	32,58	32,58	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS						-	-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,65	100,00%	0,0003	0,03%	45,33	74,79	74,79	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO						-	-	-	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	100,00%	0,0009	0,09%	31,62	252,96	252,96	-
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,70	30,70	30,70	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS						-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	19/2024	Nº	
DATA:	09/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Set
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	3
		Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0032	0,32%	912,16	912,16	912,16	-
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	150,54	100,00%	0,0351	3,51%	67,37	10.141,88	10.141,88	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,02	100,00%	0,0186	1,86%	73,55	5.370,62	5.370,62	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	275,46	100,00%	0,1039	10,39%	108,85	29.983,82	29.983,82	-
7	11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	483,46	100,00%	0,0047	0,47%	2,82	1.363,36	1.363,36	-
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	94,00	100,00%	0,0159	1,59%	48,87	4.593,78	4.593,78	-
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	100,00%	0,0062	0,62%	111,62	1.785,92	1.785,92	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	296,97	100,00%	0,0150	1,50%	14,60	4.335,76	4.335,76	-
	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	95,78	95,78	95,78	-
	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	84,53	84,53	84,53	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	13,77	100,00%	0,0058	0,58%	121,31	1.670,44	1.670,44	-
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	179,05	100,00%	0,0136	1,36%	21,89	3.919,40	3.919,40	-
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1,00	100,00%	0,0018	0,18%	522,79	522,79	522,79	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	19/2024	Nº	
DATA:	09/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Set
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	3
		Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0085	0,85%	2.457,72	2.457,72	2.457,72	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0098	0,98%	2.840,72	2.840,72	2.840,72	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTINUO EM "S"(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E ILUMINAÇÃO	M	19,29	100,00%	0,1113	11,13%	1.665,44	32.126,34	32.126,34	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA	UNID	6,00	100,00%	0,0453	4,53%	2.177,76	13.066,56	13.066,56	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,2802	28,02%	80.889,71	80.889,71	80.889,71	-
8	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS						-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS						-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	399,02	100,00%	0,0034	0,34%	2,47	985,58	985,58	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-

GLOBAL - LOTE 1	% PREVIST	52,87%	% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	288.652,40	288.652,40	-
------------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-------	-------------------	-------------------	----------

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$288.652,40
	Medição Acumulada:	288.652,40
	Total Anterior:	191.325,42
	Valor Desta Medição:	R\$97.326,98

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Documento assinado digitalmente

gov.br RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 27/09/2024 09:09:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

Documento assinado digitalmente

gov.br JORGE EDUARDO CHIOQUETA
Data: 25/09/2024 10:10:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
Fiscal: Jorge Eduardo Chioqueta
ENGº CIVIL - CREA PR-125.425/D

Assinado de forma digital por ANGELA PADOAN:06223004907
Dados: 2024.10.02 14:41:34 -03'00'

ANGELA PADOAN:06223004907

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
 PROJETO : PRAÇA - Parque do Som
 CONVÊNIO Nº. 611/2023 PAM

MEDIÇÃO Nº: 1
 DATA DA MEDIÇÃO : 16/09/2024

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 19/2024 DATA : 09/02/2024
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 288.652,40
 SAM : Nº. 74
 LOTE : Nº. 3

PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/08/2024
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/02/2025

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
 Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	37.714,87	100,00%	37.714,87	37.714,87
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	2.724,30	100,00%	2.724,30	2.724,30
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	1.125,57	100,00%	1.125,57	1.125,57
4	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	40,00%	19.519,16	100,00%	48.797,92	48.797,92
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	35,00%	719,26	100,00%	2.055,03	2.055,03
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	35,00%	15.923,71	100,00%	45.496,32	45.496,32
7	11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	50,00%	74.876,40	100,00%	149.752,81	149.752,81
8	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	100,00%	985,58	985,58
9				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				152.603,27		TOTAL MEDIÇÃO	288.652,40

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$97.326,98

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente
 gov.br RODRIGO PIRES FRANCO
 Data: 27/09/2024 09:09:23-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 gov.br JORGE EDUARDO CHIOQUETA
 Data: 25/09/2024 10:10:15-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinado de forma digital por ANGELA PADOAN:06223004907
 ANGELA PADOAN:06223004907
 Dados: 2024.10.02 14:40:29 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
 Rodrigo Pires Franco
 Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
 Fiscal: Jorge Eduardo Chioqueta
 ENGº CIVIL - CREA PR-125.425/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
 ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medicação:	74 / 3 / 3
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	19/2024
Data da Vistoria:	16/09/2024

Objeto:

Revitalização da Praça Parque do Som, contendo: Área de conviência, Pergolado e área de jogos e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **30/07/2024** até **30/08/2024**.


SERVIÇOS EXECUTADOS



2 | Placa de obra



3 | Detalhe da placa de obra

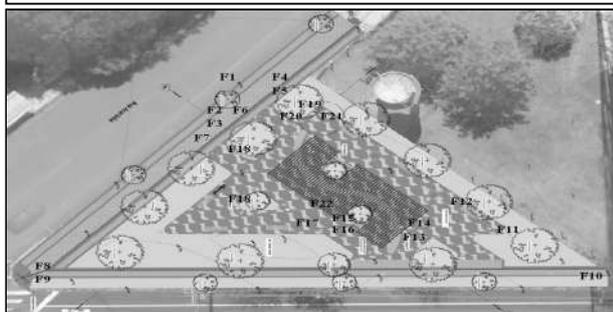

Mapa de localização das fotos



1 | execução de paver e plantio de árvores



4 | entrada de energia, quadro geral, mureta



5 | entrada de energia



6 | Execução de paver, plantio de grama



7 | Execução de paver, plantio de grama e arvores



8 | rampa de acessibilidade



9 | Execução de paver, plantio de grama



10 | Execução de paver, plantio de grama e arvores



11 | banco de concreto, piso permeável, grama, pergolado



12 | mesas e bancos de concreto, grama, piso permeável



13 | pergolado, banco de concreto, piso permeável



14 | pergolado, instalações elétricas



15 | instalações elétricas no banco



16 | piso permeável



17 | piso permeável, grama, bancos de concreto



18 | bebedouro, piso permeável, paver, grama



19 | piso permeável, bancos de concreto, mesa de concreto



20 | instalações elétricas



21 | instalações elétricas



22 | grama, arvores

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/ote/19327/medicao/12234/relatorio-fotografico/1155>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 18 de setembro de 2024.

Jorge Eduardo Chioqueta
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: CREA PR 125.426/D



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Jorge Eduardo Chioqueta (18/09/2024 16:38:25)

Nome/controlado do arquivo:
2024091816382533.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024091816382533>
