



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 09 de fevereiro 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 339/2022-GP


O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 1.153.225,06	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 07/04/2022	18,95	218.515,00	81,05	R\$ 934.710,06
A liberar 2. ^a Parcela em 17/05/2022				
A liberar 3. ^a Parcela em 30/06/2022				
A liberar 4. ^a Parcela em 03/08/2022				
A liberar 5. ^a Parcela em 01/09/2022				
A liberar 6. ^a Parcela em 05/10/2022				

Valor a ser liberado em 09/02/2023 R\$ 218.515,00

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENHIMENTO		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO	01	TIPO DE TELHADOS		INÍCIO DE OBRA	
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.587/0001-96		(SELECIONAR)				22/09/22	
				PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO			
				22/09/2022 a 09/02/2023		1			

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado									
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Realizado Acumulado (R\$)
Objeto do CTEF:									
1.	TELHADOS	-	-	-	1.153.225,06	-	-	-	-
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	992.027,70	-	-	-	-
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	2.115,00	62,00	131.130,00	-	560,00	560,00	34.720,00
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.115,00	4,00	8.460,00	-	560,00	560,00	2.240,00
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.115,00	7,00	14.805,00	-	560,00	560,00	3.920,00
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	2.115,00	225,00	475.875,00	-	560,00	560,00	126.000,00
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	246,00	120,00	29.520,00	-	-	-	-
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	419,00	75,00	31.425,00	-	-	-	-
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	846,00	200,00	169.200,00	-	200,00	200,00	40.000,00
1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	306,00	129,45	39.611,70	-	-	-	-
1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P	M2	2.115,00	30,00	63.450,00	-	200,00	200,00	6.000,00
1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,80 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	150,00	86,64	12.996,00	-	-	-	-
1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	8.500,00	1,83	15.555,00	-	2.500,00	2.500,00	4.575,00
1.2.	Ferro de PVC	-	-	-	154.291,86	-	-	-	1.060,00
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.986,00	2,12	4.210,32	-	500,00	500,00	1.060,00
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	1.986,00	70,03	139.079,58	-	-	-	-
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	1.647,00	6,68	11.001,96	-	-	-	-
1.3.	OUTROS	-	-	-	6.905,50	-	-	-	-
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	145,00	9,70	1.406,50	-	-	-	-
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	2.115,00	2,60	5.499,00	-	-	-	-

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação		Nº Siconv		Apelido do Empreendimento		Início de Obra	
0		0		0		0		22/09/22	
Nº CTEF		CNPJ		Regime de Execução		Período da Medição		Nº Medição	
0		EMPRESA EXECUTORA LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA		10.783.587/0001-96		(SELECIONAR)		22/09/2022 a 09/02/2023	
								1	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtd.)		Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:							

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO

Local

quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERLANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 0



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA E CMEI MUNICIPAL UNIÃO**

CONTRATO Nº339/2022/GP

Relatório de Medição nº 01



Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 218.515,00.



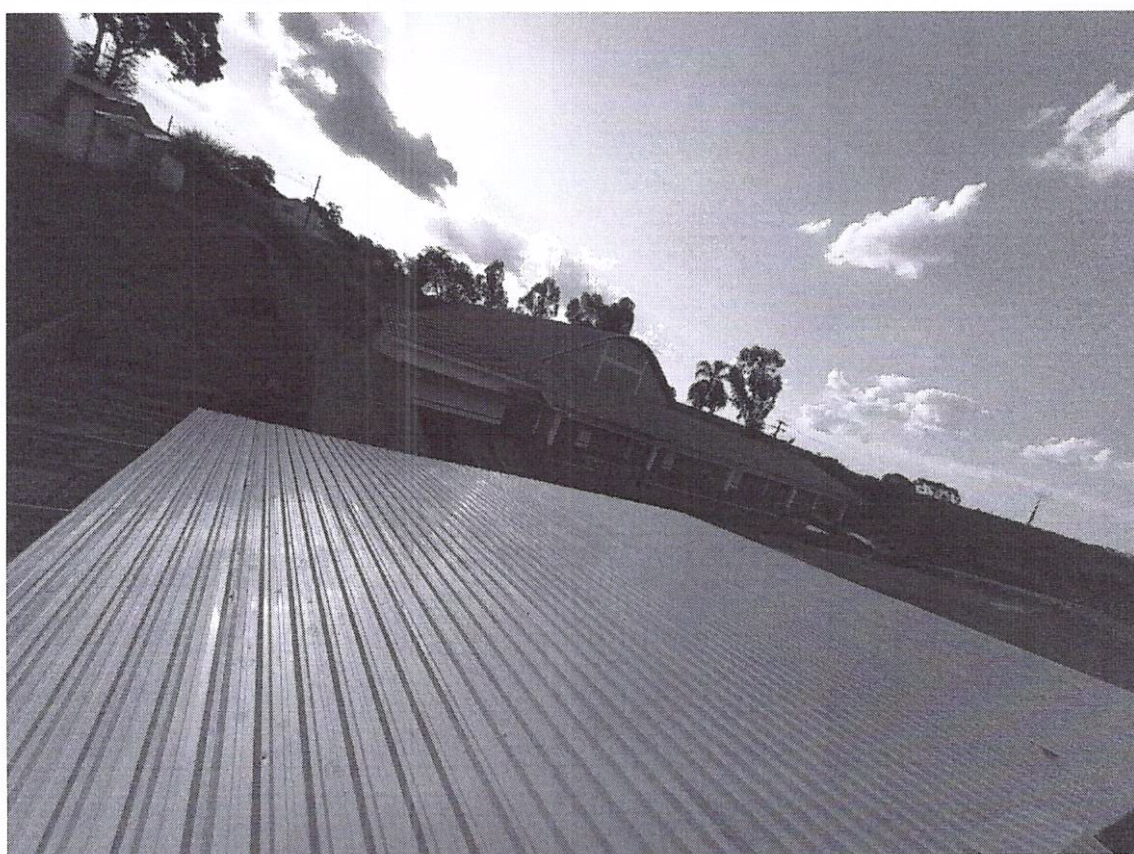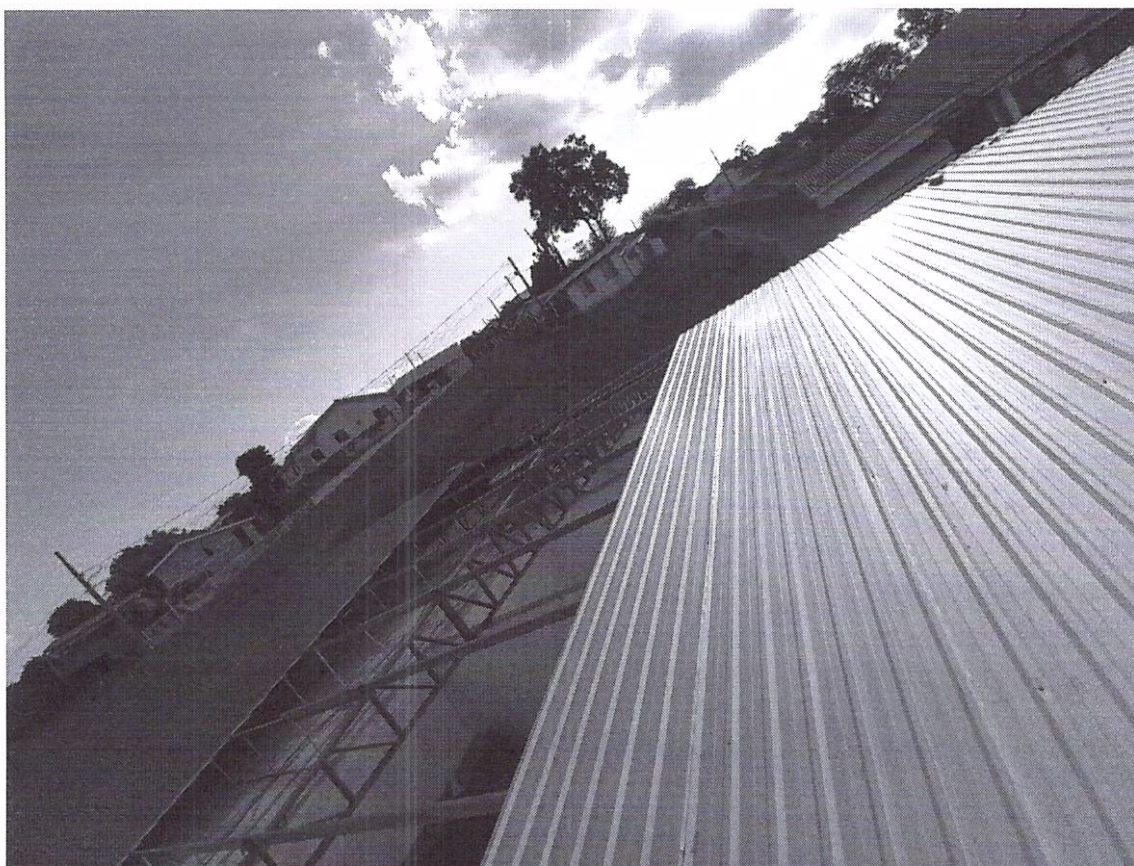





Pato Branco, 09 de fevereiro de 2023.



Adernanda Paula dos Santos

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
