



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
916758

PROPOSANTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA GINÁSIO DO BAIRRO SÃO JOÃO

NOME DA EMPRESA
0

Nº CTEF
0

Medição: 1 Período: 00/01/1900 a 00/01/1900 % Realizado Período.: 20,43% % Realizado Acum.: 20,43%

Nº do Evento	Título dos Eventos																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	GERAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05																			

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
1	1																								
2	1																								
3	1																								
4	1																								
5	1																								
6	1																								
7	1																								
8	1																								
9	1																								
10	1																								
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									

Medições
Período:
Acumulado:

Data das Medições												
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	20,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	70.255,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%	20,43%
R\$	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39	70.255,39

PATO BRANCO/PR

Local

segunda-feira, 31 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BELLEI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RR: 1720233424370

REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO SÃO JOÃO

CONTRATO Nº 317/2022/GP

Relatório de Medição nº 1

DATA: 31/07/2023

Empresa Contratada: MOLDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-FABRICADOS SUL
AMERICANA LTDA - CNPJ 15.987.122/0001-90

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução:

RODRIGO BOESING – CREA-PR Nº 124.500/D

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1ª medição, constatando a execução das quantidades dos itens da planilha de medição.



Seguem fotos da obra:



Foto 1: Serviços Preliminares

Reforma do Ginásio de Esportes

Valor Total da Obra: R\$ 343.861,56 Comunidade: São João Município: Pato Branco - PR Objeto: Reforma do Ginásio do Bairro São João	Agentes Participantes: Governo Federal e Prefeitura Municipal Início da Obra: 14/06/2023 Término da Obra: 13/11/2023	Denúncias, reclamações, e elogios: ouvidoria.gov.br
---	--	---



Foto 2: Placa da Obra



Foto 3: Locação e Estrutura de concreto (Fundação e Vigas Baldrame)



Foto 4: Estrutura de concreto (Pilares e vigas de cobertura).



Foto 5: Alvenarias.

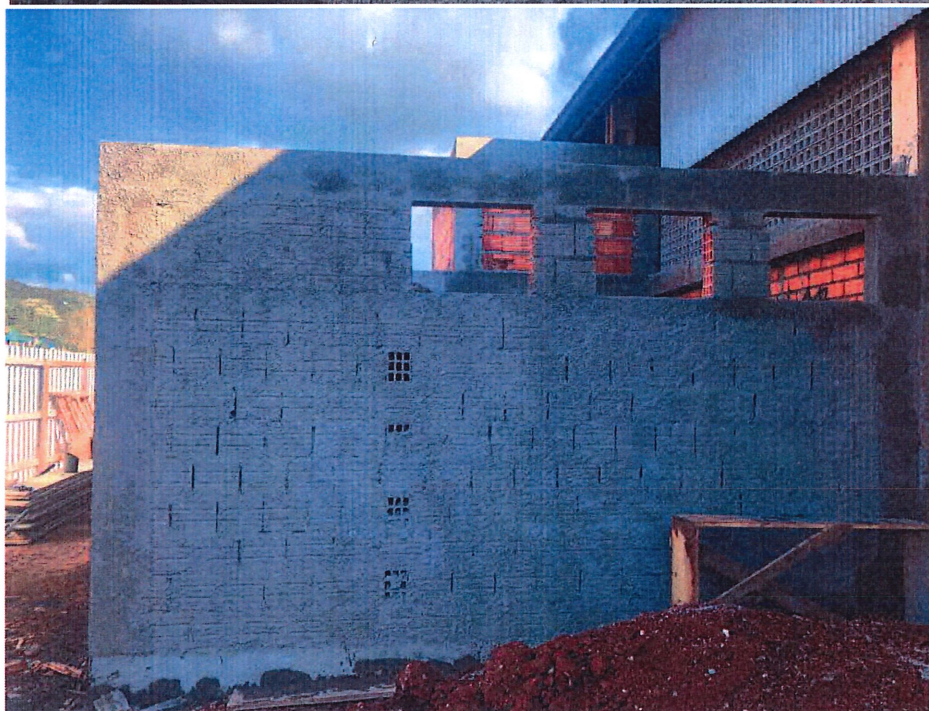


Foto 6: Alvenarias.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.


A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'EJ Hiv'.

II- Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 70.255,39.

Pato Branco, 31 de JULHO de 2023.



EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 164.074/D
