



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2ª	DATA	25/04/2025 - sex
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	14/2024	Nº	
DATA:	01/02/2024	DATA	

Mês	Abr
SAM	67
Lote	2
Ano	2024

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	--------------	-------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	133,56	100,00%	0,0183	1,83%	65,72	8.777,56	8.777,56	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	8,00	100,00%	0,0232	2,32%	1.389,82	11.118,56	11.118,56	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MES	1,00	100,00%	0,0022	0,22%	1.069,09	1.069,09	1.069,09	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0057	0,57%	2.733,85	2.733,85	2.733,85	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-				-	-	-	-
	02	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO - PARA 5 CONTRIBUINTES	UN	1,00	100,00%	0,0079	0,79%	3.790,06	3.790,06	3.790,06	-
	2	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ÁREA A SER REMOVIDA DA QUADRA EXISTENTE - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	6,00	100,00%	0,0017	0,17%	139,10	834,60	834,60	-
	3	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ACADEMIA EXISTENTE	M2	220,00	100,00%	0,0041	0,41%	9,01	1.982,20	1.982,20	-
	4	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DAS MURETAS DE CONCRETO E REMOÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE	M3	7,06	100,00%	0,0020	0,20%	134,40	948,86	948,86	-
	5	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE ENTULHO PROVENIENTE DAS DEMOLIÇÕES	M3	43,47	100,00%	0,0028	0,28%	30,98	1.346,70	1.346,70	-
	6	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, COM DEPÓSITO NA GARAGEM MUNICIPAL	M3	40,00	100,00%	0,0015	0,15%	17,90	716,00	716,00	-
	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	500,00	100,00%	0,0035	0,35%	3,34	1.670,00	1.670,00	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	56,23	100,00%	0,0018	0,18%	15,18	853,57	853,57	-
	2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	562,40	100,00%	0,0009	excesso	0,77	433,04	433,04	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.8		DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	102666	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	209,32	100,00%	0,0226	2,26%	51,59	10.798,82	10.798,82	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.) ASSOCIAÇÃO Amsop

PARCELA 2ª DATA 25/04/2025 - sex

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Abr	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEN DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA	SAM	67	Nº	14/2024
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI	Lote	2	DATA:	01/02/2024
		Ano	2024		

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	UN	8,00	100,00%	0,0051	0,51%	307,34	2.458,72	2.458,72	-
	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0009	0,09%	442,98	442,98	442,98	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	15,00	100,00%	0,0021	0,21%	68,27	1.024,05	1.024,05	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (Drenagem)	M3	2,63	100,00%	0,0005	0,05%	96,47	253,72	253,72	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	2,63	100,00%	0,0003	0,03%	58,49	153,83	153,83	-
	2003475	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGI DED-01	UN	1,00	100,00%	0,0010	0,10%	460,74	460,74	460,74	-
	7	COMPOSICAO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	50,00	100,00%	0,0067	0,67%	63,81	3.190,50	3.190,50	-
3	3		FUNDACOES						-	-	-	-
	3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-				-	-	-	-
	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	71,50	100,00%	0,0091	0,91%	61,14	4.371,51	4.371,51	-
4	4		ESTRUTURAS						-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	8	COMPOSICAO	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2X2M	M2	34,00	200,00%	0,0093	excesso	130,71	4.444,14	4.444,14	-
5	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
	COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	215,85	100,00%	0,0666	6,66%	147,62	31.863,78	31.863,78	-
	COTAÇÃO		GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.	M2	87,17	100,00%	0,0230	2,30%	126,31	11.010,44	11.010,44	-
	COMPOSIÇÃO	15	ALAMBRADO - QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME PROJETO - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	595,20	100,00%	0,1818	18,18%	146,15	86.988,48	86.988,48	-
6	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						-	-	-	-
	8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA		-				-	-	-	-
	8.1.7		POSTES		-				-	-	-	-
	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	4,00	100,00%	0,0209	2,09%	2.503,98	10.015,92	10.015,92	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2ª	DATA	25/04/2025 - sex
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	14/2024	Nº	
DATA:	01/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI

Mês	Abr
SAM	67
Lote	2
Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	100,00%	0,0049	0,49%	15,49	2.323,50	2.323,50	-
	8.2.3.3		ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO		-				-	-	-	-
	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	48,00	100,00%	0,0023	0,23%	23,19	1.113,12	1.113,12	-
	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	100,00%	0,0001	0,01%	7,73	30,92	30,92	-
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	100,00%	0,0006	0,06%	9,03	270,90	270,90	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	100,00%	0,0024	0,24%	4,76	1.142,40	1.142,40	-
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	100,00%	0,0051	0,51%	6,93	2.425,50	2.425,50	-
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	100,00%	0,0101	1,01%	24,07	4.814,00	4.814,00	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	100,00%	0,0014	0,14%	163,36	653,44	653,44	-
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0016	0,16%	742,14	742,14	742,14	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	56,90	56,90	56,90	-
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100,00%	0,0003	0,03%	61,03	122,06	122,06	-
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	61,03	61,03	61,03	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100,00%	0,0003	0,03%	75,71	151,42	151,42	-
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	42,00	42,00	42,00	-
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2ª	DATA	25/04/2025 - sex
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	14/2024	Nº	
DATA:	01/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA
FIRMA EMPREITEIRA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI

Mês	Abr
SAM	67
Lote	2
Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	6,00	100,00%	0,0011	0,11%	89,23	535,38	535,38	-
	8.3.4		CORDOALHA		-				-	-	-	-
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	24,00	100,00%	0,0042	0,42%	84,02	2.016,48	2.016,48	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	16.105.0000	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.281,92	2.281,92	2.281,92	-
	COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	6,00	100,00%	0,0012	0,12%	92,94	557,64	557,64	-
	COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETO COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00	100,00%	0,0115	1,15%	457,52	5.490,24	5.490,24	-
	COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	2,00	100,00%	0,0071	0,71%	1.692,25	3.384,50	3.384,50	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	15,30	100,00%	0,0029	0,29%	90,49	1.384,50	1.384,50	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	15,30	100,00%	0,0018	0,18%	54,87	839,51	839,51	-
	10	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	180,52	180,52	180,52	-
7	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	27,79	100,00%	0,0035	0,35%	60,24	1.674,07	1.674,07	-
	10.4		PINTURAS		-				-	-	-	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-				-	-	-	-
	10.4.16		PINTURA EM PISO		-				-	-	-	-
	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	216,00	100,00%	0,0120	1,20%	26,55	5.734,80	5.734,80	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	11	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV SOBRE PISO (2 DEMÃOS), INCLUSO APLICAÇÃO DE SELADOR PRIMER EPOXI (1 DEMÃO), CATALISADOR E DILUENTE - QUADRA DE BASQUETE	M2	534,40	100,00%	0,1129	11,29%	101,10	54.027,84	54.027,84	-
	12	COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE QUADRA EXISTENTE, COM POLIMENTO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DA PINTURA	M2	450,40	100,00%	0,0130	1,30%	13,86	6.242,54	6.242,54	-
8	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.10		SINALIZACAO		-				-	-	-	-
	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	109,00	100,00%	0,0025	0,25%	10,93	1.191,37	1.191,37	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	2ª	DATA	25/04/2025 - sex
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	14/2024	Nº	
DATA:	01/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA
FIRMA EMPREITEIRA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI

Mês	Abr
SAM	67
Lote	2
Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	16,52	100,00%	0,0035	0,35%	101,58	1.678,10	1.678,10	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	28,03	100,00%	0,0060	0,60%	101,75	2.852,05	2.852,05	-
	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	5,72	100,00%	0,0015	0,15%	127,90	731,59	731,59	-
	603900	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	9,15	100,00%	0,0023	0,23%	120,07	1.098,64	1.098,64	-
	orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	255,08	100,00%	0,0098	0,98%	18,36	4.683,27	4.683,27	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	90,00	100,00%	0,0106	1,06%	56,51	5.085,90	5.085,90	-
	COMPOSIÇÃO	fevereiro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	47,35	100,00%	0,0066	0,66%	66,68	3.157,30	3.157,30	-
	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF_07/2016	M2	216,00	100,00%	0,0541	5,41%	119,82	25.881,12	25.881,12	-
	22.150.0000	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	190,50	100,00%	0,0060	0,60%	15,03	2.863,22	2.863,22	-
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	183,00	100,00%	0,1558	15,58%	407,27	74.530,41	74.530,41	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	3,34	100,00%	0,0006	0,06%	90,49	302,24	302,24	-
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	3,34	100,00%	0,0027	0,27%	381,65	1.274,71	1.274,71	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,0061	0,61%	2.940,00	2.940,00	2.940,00	-
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	1,00	100,00%	0,0076	0,76%	3.635,38	3.635,38	3.635,38	-
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	1,00	100,00%	0,0080	0,80%	3.826,71	3.826,71	3.826,71	-
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	100,00%	0,0043	0,43%	2.077,36	2.077,36	2.077,36	-
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	BARRA 2 ALTURAS	UN	1,00	100,00%	0,0050	0,50%	2.368,92	2.368,92	2.368,92	-
	COTAÇÃO KR	fevereiro/2023	PIRÂMIDE DE CORDAS 4,5M (EQUIPAM. E FUNDAÇÃO)	UN	1,00	100,00%	0,0429	4,29%	20.541,10	20.541,10	20.541,10	-
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCALADA MEIA-LUA	UN	1,00	100,00%	0,0097	0,97%	4.628,50	4.628,50	4.628,50	-
	8464	ORSE - jan/23	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	4,00	100,00%	0,0046	0,46%	548,73	2.194,92	2.194,92	-
	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	229,44	100,00%	0,0048	0,48%	10,03	2.301,28	2.301,28	-
	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	100,00%	0,0004	0,04%	51,93	207,72	207,72	-
	13	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PISO PERMEÁVEL 40X40CM, ESPESSURA 6,0 CM, INCLUSO MATERIAL	M2	81,92	100,00%	0,0130	1,30%	75,68	6.199,71	6.199,71	-
9	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-	-	-	-
	99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	338,00	100,00%	0,0004	0,04%	0,60	202,80	202,80	-
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				Mês	Abr	REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				SAM	67	PARCELA	2ª	DATA	25/04/2025 - sex
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO				Lote	2	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA				Ano	2024	Nº	14/2024	Nº
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI						DATA:	01/02/2024	DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
GLOBAL - LOTE 1				% PREVISTO :	24,73%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	478.505,31	478.505,31	-
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$478.505,31	
									Medição Acumulada:		478.505,31	
									Total Anterior:		71.757,67	
									Valor Desta Medição:		R\$406.747,64	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
MARCOS VINICIUS GOMES 07976998994 Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34692908000144, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994 * Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025.04.28 17:19:48-03'00' Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0				gov.br KRIZIA LACERDA TONACO NORONHA Data: 29/04/2025 08:40:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				GERI NATALINO DUTRA:64847136934 Assinado de forma digital por GERI NATALINO DUTRA:64847136934 Dados: 2025.04.29 10:48:27 -03'00'				
ERGE CONSTRUTORA EIRELI MARCOS VINICIUS GOMES ARQTO E URBANISTA - CAU 129307-9				PREF. MUN. DE PATO BRANCO KRIZIA NORONHA ENGº CIVIL - CREA TO- 206973/D				PREFEITO DE PATO BRANCO GERI DUTRA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
PROJETO : PRACA
CONVÊNIO Nº. 1057/2022
PAM

MEDICÃO Nº: 2ª
DATA DA MEDIÇÃO : 25/04/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 28/09/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/05/2025

EMPRESA VENCEDORA : ERGE CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATO EMPREITADA Nº: 14/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO : 478.505,31
SAM : Nº. 67
LOTE : Nº. 2

DATA : 25/04/2025

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
Nº DA LICITAÇÃO: 010/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	34.987,48	100,00%	34.987,48	34.987,48
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	75,00%	15.052,47	100,00%	20.069,97	20.069,97
3	3	FUNDACOES	50,00%	2.185,75	100,00%	4.371,51	4.371,51
4	4	ESTRUTURAS	25,00%	1.111,03	100,00%	4.444,14	4.444,14
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	25,00%	32.465,67	100,00%	129.862,70	129.862,70
6	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	20,00%	8.127,18	100,00%	40.635,94	40.635,94
7		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	10,00%	6.767,92	100,00%	67.679,25	67.679,25
8	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	10,00%	17.625,15	100,00%	176.251,52	176.251,52
9	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	10,00%	20,28	100,00%	202,80	202,80
10			-	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				118.342,93		TOTAL MEDIÇÃO	478.505,31

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
26648,56	8.338,92	23,83%
20069,97	-	-
3057,00	1.314,51	30,07%
4444,14	-	-
17538,00	112.324,70	86,49%
	40.635,94	100,00%
	67.679,25	100,00%
	176.251,51	100,00%
	202,80	100,00%
	-	-
	-	-
	-	-
OK	Parcial	
Acumulado	Dest	
Med. Anterior	Medição	
71.757,67	406.747,63	

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$406.747,64

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 010/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCOS VINICIUS GOMES
07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=HAC SOLUTI Multipla vS, OU=448292000544, OU=Valcoconferencia, OU=Certificado PP-AL, CN=MARCOS VINICIUS GOMES, O=7976998994
Foi assinado com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.29 17:12:20-0300
Fórmula: PPK/PDF versão: 3.0.1.0

gov.br

KRIZIA LACERDA TONACO NORONHA
Data: 29/04/2025 08:40:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GERI NATALINO
DUTRA:64847136934

Assinado de forma digital por GERI NATALINO
DUTRA:64847136934
Dados: 2025.04.29 10:49:27 -03'00'

ERGE CONSTRUTORA EIRELI
MARCOS VINICIUS GOMES
ARQTO E URBANISTA - CAU 129307-9

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
KRIZIA NORONHA
ENGº CIVIL - CREA TO- 206973/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
GERI DUTRA

Página 1 de 1

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO Pato Branco - PR

PROJETO/LOTE Nº 67 | Lote Nº 2 | PRAÇA / MEU CAMPINHO |

Convênio: 353/2023

PROGRAMA PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

CONTRATADA ERGE CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATO Nº 14/2024

OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de Praça/Meu Campinho na Rua Fernando Ferrari esq. Rua Venâncio de Andrade, Chácara 206-3, Bairro Industrial (Cecília Cardoso), contendo: reforma em quadra poliesportiva, parque infantil - API-01, meia quadra de basquete, acessos em paver, passeio. Serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; diversos (limpeza, ensaios tecnológicos, equipamentos) e demais e especificações constantes em projeto. Área Construída: 1.741,18 m². Colocação de placas de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 10/2023, fornecida pelo CONTRATANTE.

MEDIÇÃO Nº 01

DATA DA VISTORIA:

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 28 / 05 / 2024 até 25 / 04 / 2025.


SERVIÇOS EXECUTADOS




01.PLACA DA OBRA ATUALIZADA



01.DETALHE DA PLACA DA OBRA (QR CODE)

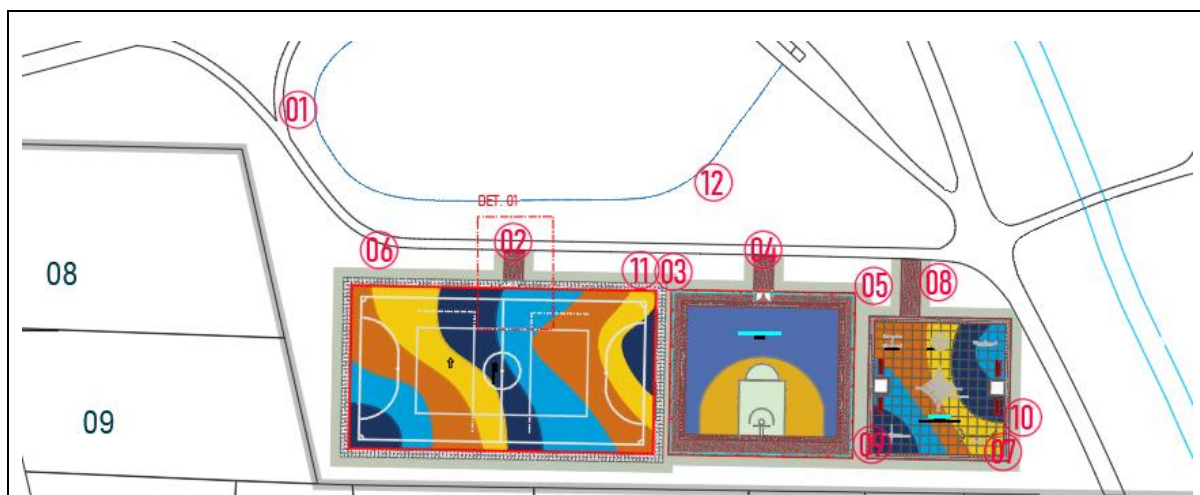

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS

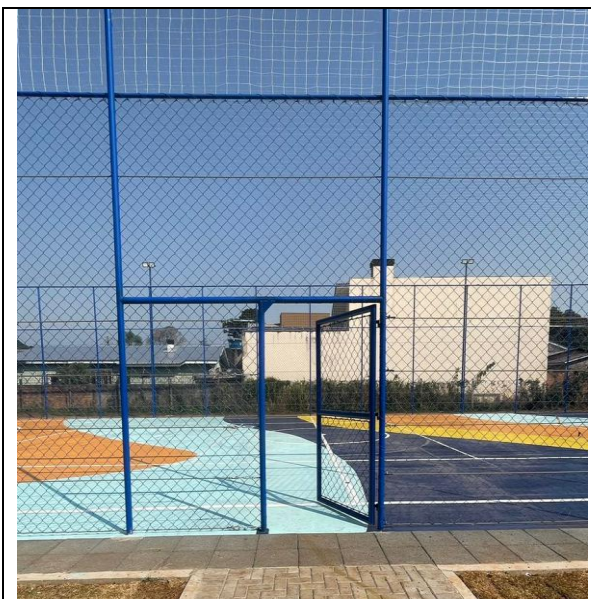

02. Quadra poliesportiva




03. cercamento quadra



04. Meia Quadra de basquete



05. Cercamento meia Quadra

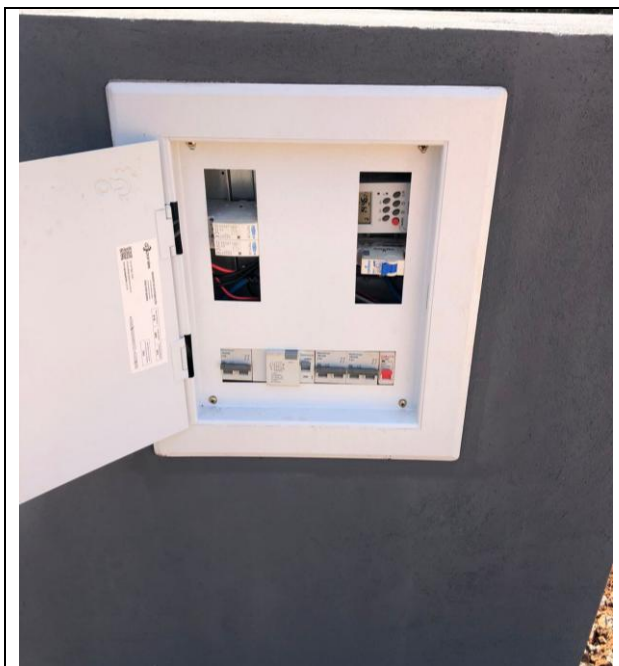


06. Entrada de Energia



07. Luminárias, piso e brinquedos.



08. Bancos em concreto, piso emborrachado e brinquedos.

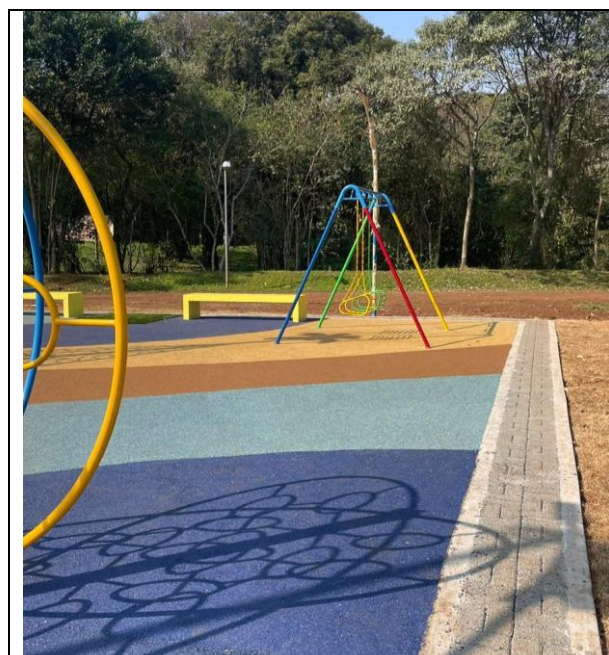

09. Piso emborrachado e paver drenante.



10. Luminárias e bancos.



11. Quadra poliesportiva, cercamento e grama.



12. FOTO PANORÂMICA DA OBRA

Pato Branco, 25 de Abril de 2025.



Documento assinado digitalmente
KRIZIA LACERDA TONACO NORONHA
Data: 05/05/2025 15:59:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Krizia Noronha
206973/D CREA-TO
ART - 1720250617831
