



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 21 de setembro 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 53/2023-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 1.276.479,17	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 08/08/2023	46,98	599.760,00	53,02	R\$ 676.719,17
A liberar 2. ^a Parcela em 21/09/2023	23,51	300.097,88	17,47	R\$ 376.621,29

Valor a ser liberado em 21/09/2023 R\$ 300.097,88

Gestora e fiscal do contrato.

Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato

Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Seleção o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
EMPRESA EXECUTORA		0		0		0		22/09/22	
Nº CTEF		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA		10.783.587/0001-96		(SELECIONAR)		09/08/2023 a 21/09/2023		2	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtd.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:							
1.1.	TELHADOS	-	-	-	1.276.479,18	-	-	-	599.760,00	300.097,88	899.857,88
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	3.569,00	62,00	221.278,00	2.000,00	760,00	2.760,00	124.000,00	47.120,00	171.120,00
1.1.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	3.569,00	225,00	803.025,00	2.000,00	760,00	2.760,00	450.000,00	171.000,00	621.000,00
1.1.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	325,00	120,00	39.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	412,00	75,00	30.900,00	-	412,00	412,00	-	30.900,00	30.900,00
1.1.5.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	57,00	200,00	11.400,00	-	57,00	57,00	-	11.400,00	11.400,00
1.1.6.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF 07/2020. P	M2	2.357,36	30,00	70.720,80	278,50	760,00	1.038,50	8.355,00	22.800,00	31.155,00
1.1.7.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA #24, 0,50 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	142,00	86,64	12.302,88	-	142,00	142,00	-	12.302,88	12.302,88
1.1.8.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRAUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	13.550,00	1,83	24.796,50	6.500,00	2.500,00	9.000,00	11.895,00	4.575,00	16.470,00
1.2.	Forro de PVC	-	-	-	51.494,86	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017. P	M2	655,20	70,03	45.883,66	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	840,00	6,68	5.611,20	-	-	-	-	-	-
1.3.	OUTROS	-	-	-	11.561,14	-	-	-	5.510,00	-	5.510,00
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	560,00	9,70	5.432,00	300,00	-	300,00	2.910,00	-	2.910,00
1.3.2.	AF 07/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	2.357,36	2,60	6.129,14	1.000,00	-	1.000,00	2.600,00	-	2.600,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO



BM - Boletim de Medição
Seleção o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador	Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
0	0		0	0 TROCA DE TELHADOS		22/09/22	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO	
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.793.587/0001-96	(SELECIONAR)		09/08/2023 a 21/09/2023	2	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:						

quinta-feira, 21 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERIANANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 0

Demando



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria de Educação e Cultura

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADOS – CMEI BAIRRO PLANALTO

CONTRATO Nº 53/2023/GP


Relatório de Medição nº 02


Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA



Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 300.097,88.

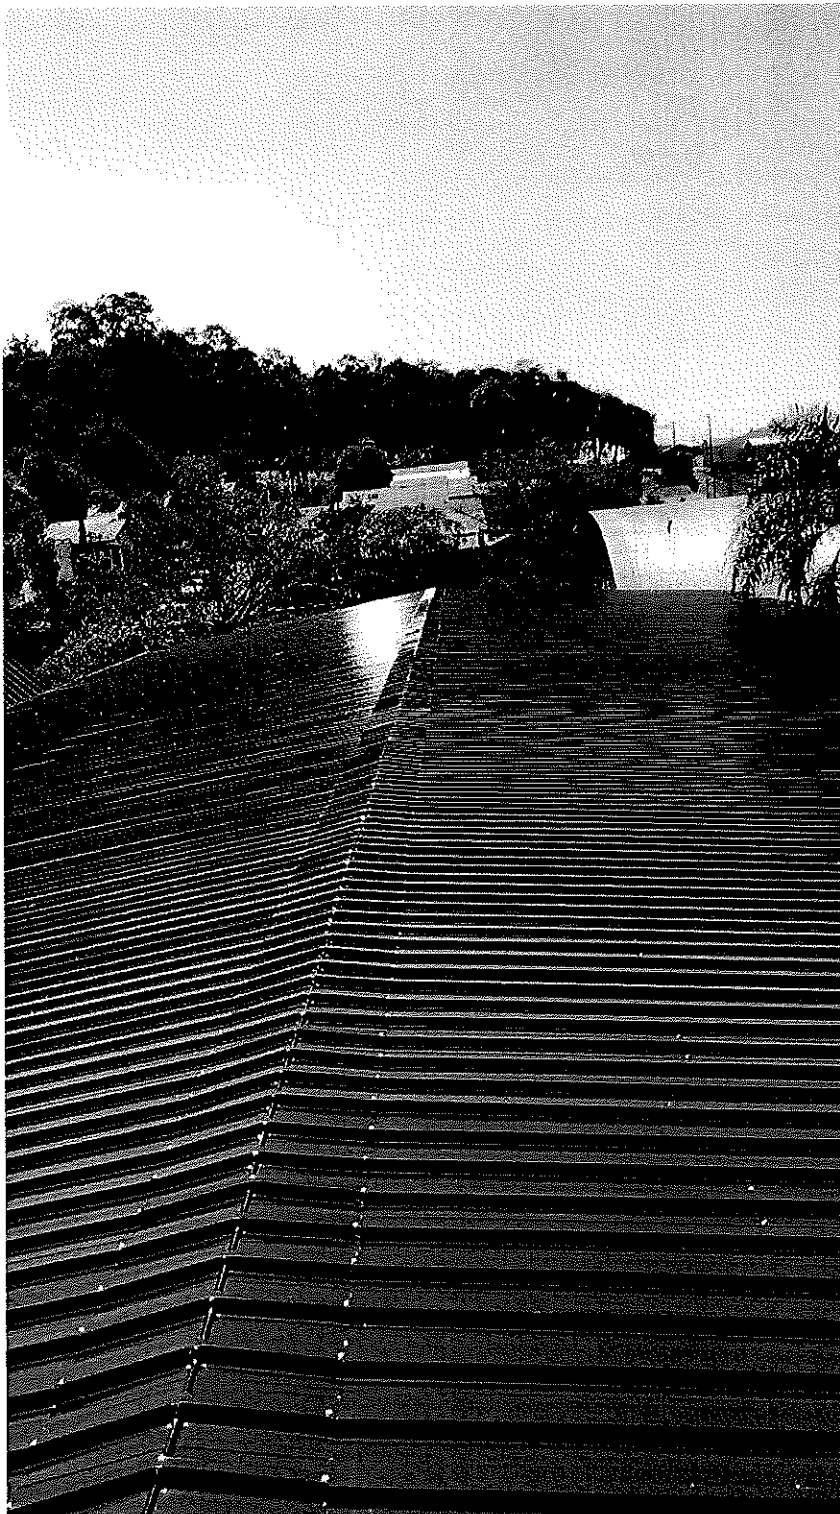

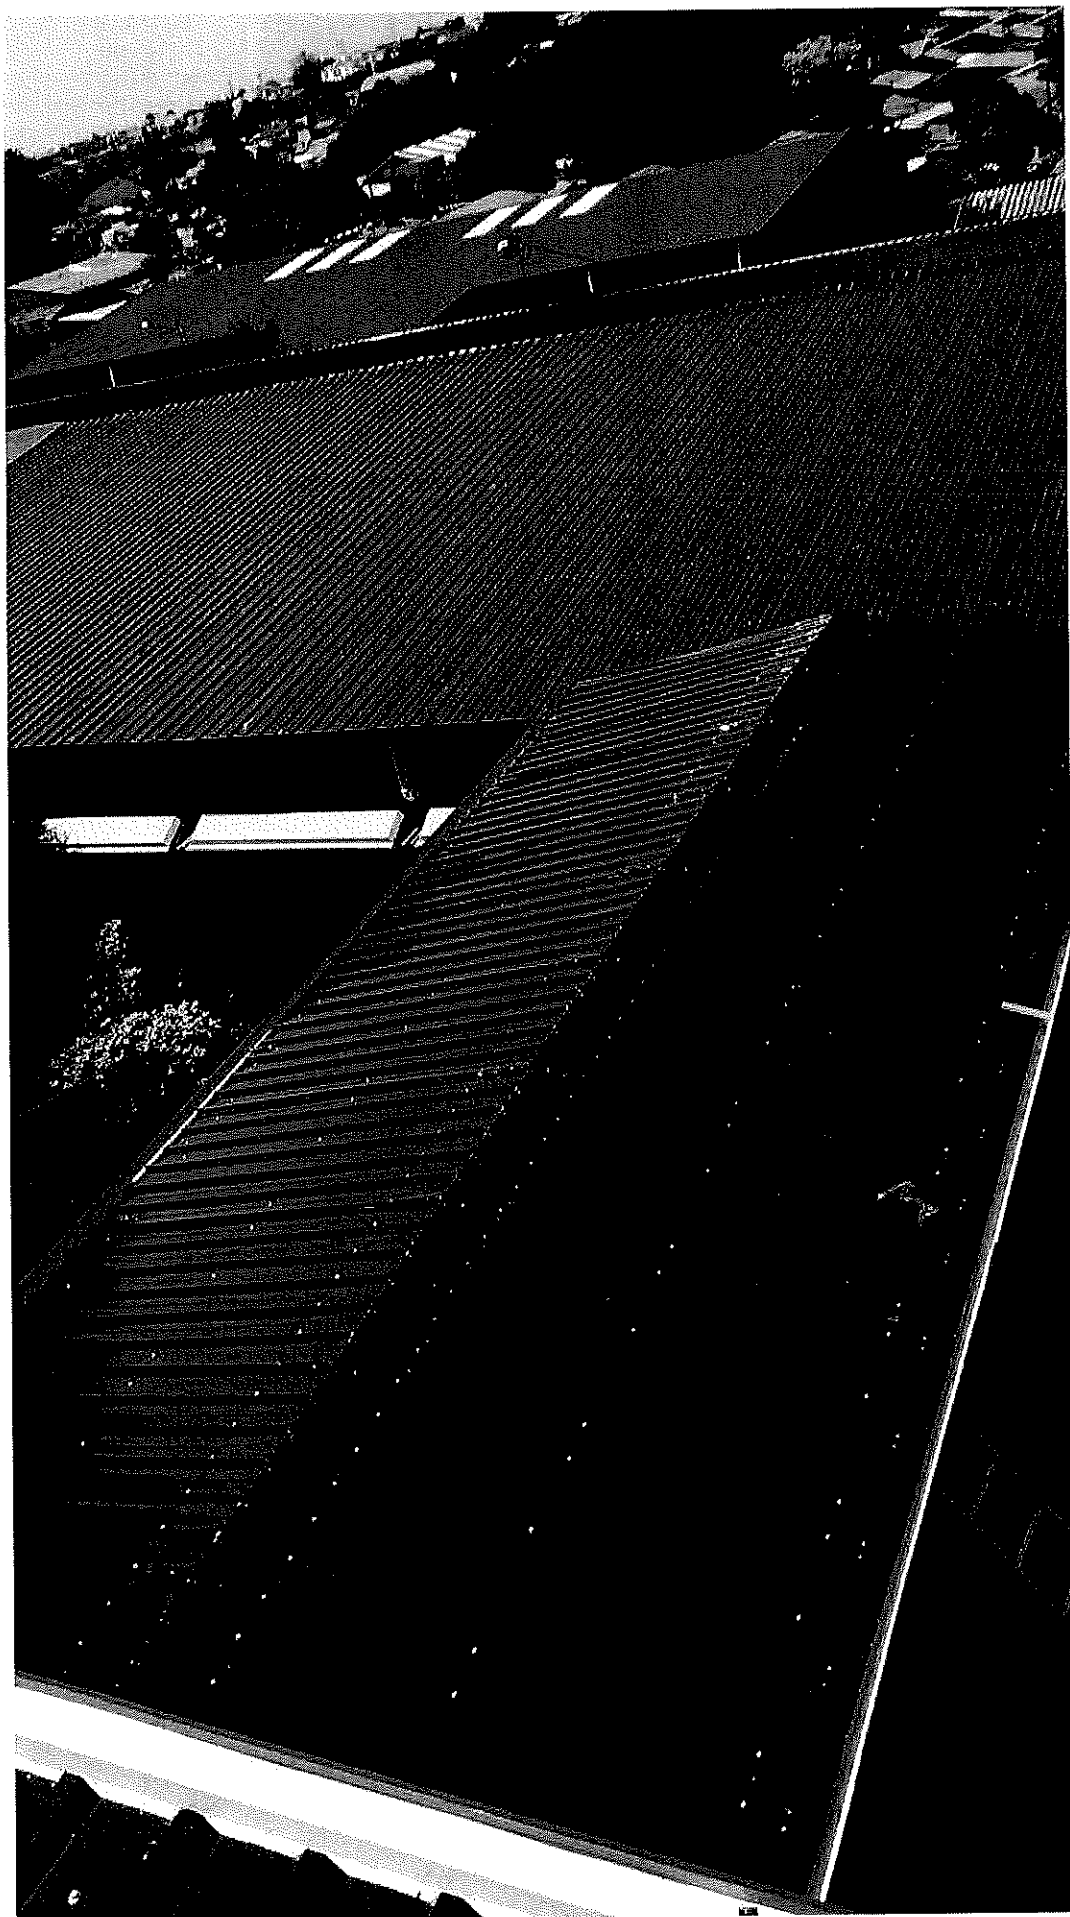

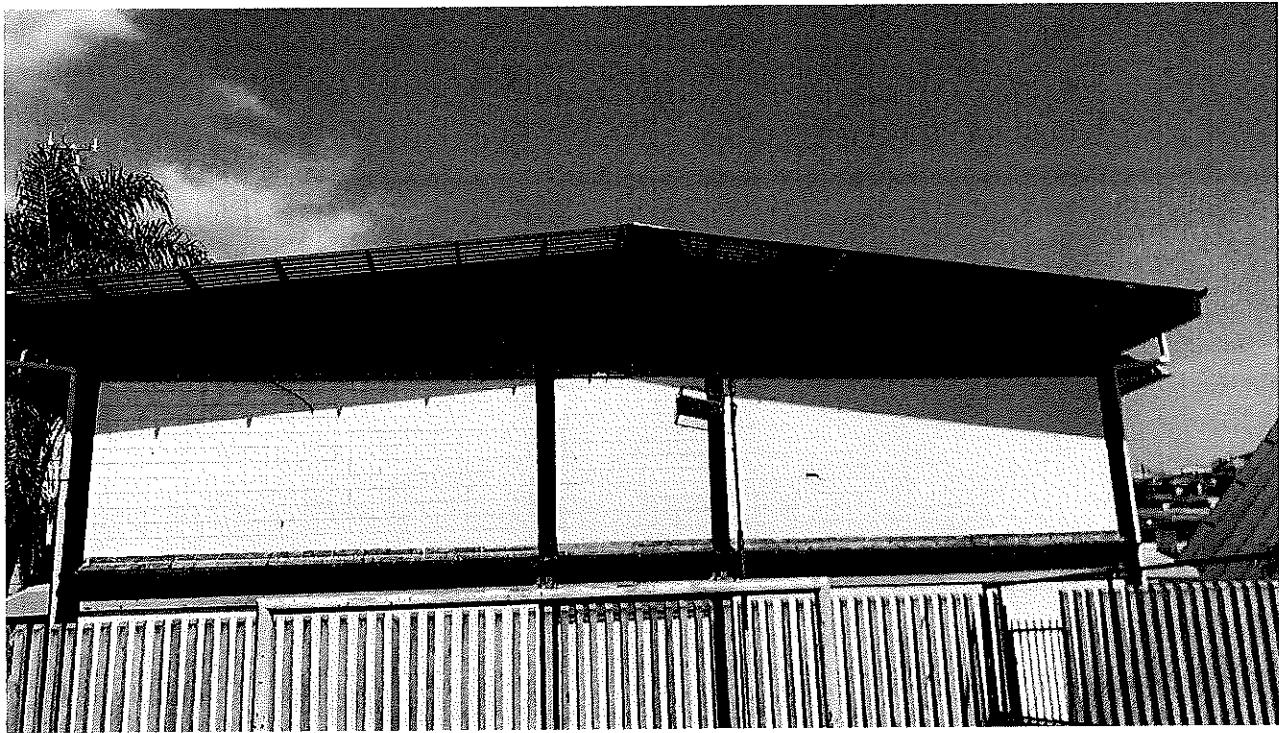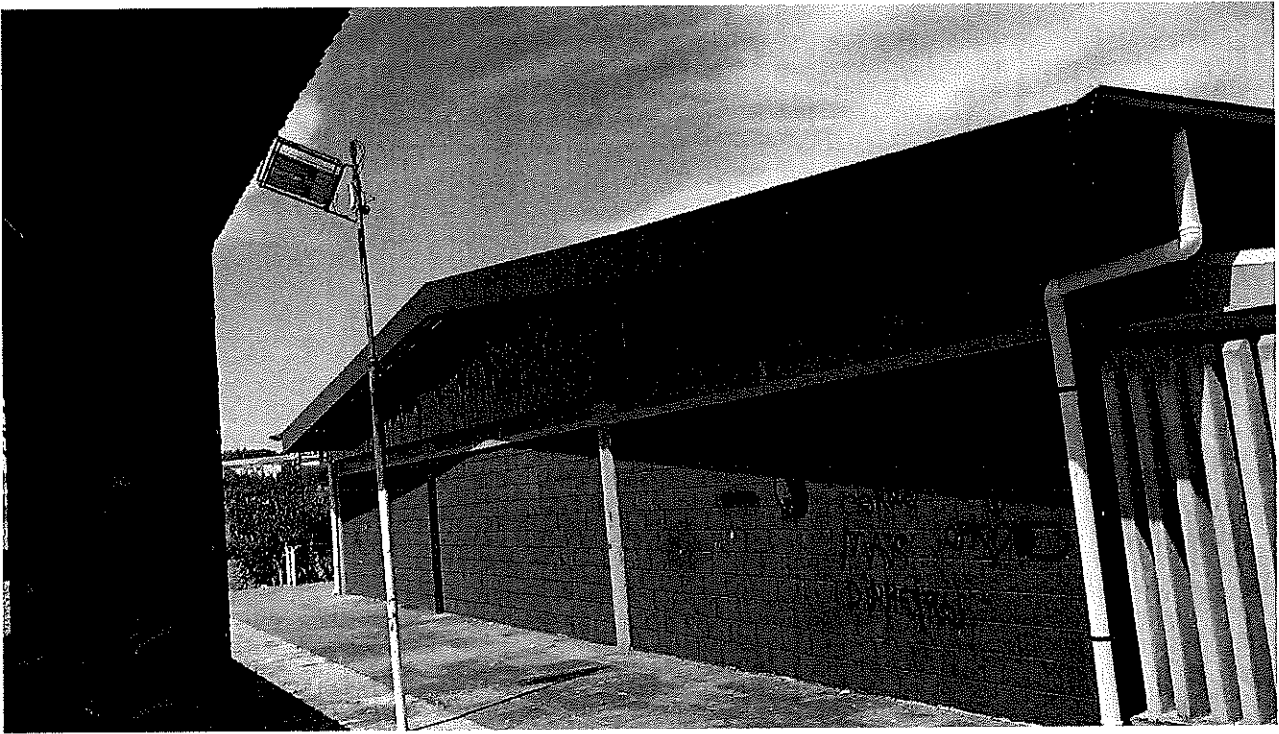



Pato Branco, 21 de setembro de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
