

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.	CASA TEMÁTICA	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	71.068,00	66,81	3,55	70,36	47.480,53	2.522,91	50.003,44	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSIDERANDO ENGENHEIRO CIVIL 10H/SEMANAIS E ENCARREGADO E APONTADOR MENSAL)	71.068,00	66,81	3,55	70,36	47.480,53	2.522,91	50.003,44	
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	22.441,64	89,52	-	89,52	20.089,08	-	20.089,08	
1.2.0.1.	REMOÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA/HIDRÁULICA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ATÉ O BOTA-FORA	245,85	100,00	-	100,00	245,85	-	245,85	
1.2.0.2.	REMOÇÃO DE PEDRAS (MONTE DAS OLIVEIRAS), INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM	574,20	100,00	-	100,00	574,20	-	574,20	
1.2.0.3.	REMOÇÃO DOS MONUMENTOS DE CONCRETO (INCLUSIVE FUNDAÇÃO), REVITALIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO, INCLUSIVE IÇAMENTO	3.868,72	50,00	-	50,00	1.934,36	-	1.934,36	
1.2.0.4.	REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DA ÁRVORE ATÉ O HORTO FLORESTAL	1.079,75	100,00	-	100,00	1.079,75	-	1.079,75	
1.2.0.5.	REMOÇÃO DE ÁRVORES E PLANTIO EM OUTRO LOCAL NO MESMO LOTE	836,40	50,00	-	50,00	418,20	-	418,20	
1.2.0.6.	RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL NA GARAGEM MUNICIPAL	11.335,92	100,00	-	100,00	11.335,92	-	11.335,92	
1.2.0.7.	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO COM MINIESCAVADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ATÉ O BOTA-FORA	4.018,25	100,00	-	100,00	4.018,25	-	4.018,25	
1.2.0.8.	RETIRADA DO MONUMENTO DO PATO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL NA GARAGEM MUNICIPAL	210,47	100,00	-	100,00	210,47	-	210,47	
1.2.0.9.	RETIRADA DE LIXEIRA COM REAPROVEITAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL NA GARAGEM MUNICIPAL	159,28	100,00	-	100,00	159,28	-	159,28	
1.2.0.10.	RETIRADA DE REFLETORES, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL	99,00	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00	
1.2.0.11.	RETIRADA DE FLOREIRAS COM REAPROVEITAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DA ATÉ O HORTO FLORESTAL	13,80	100,00	-	100,00	13,80	-	13,80	
1.3.	TERRAPLENAGEM	10.247,34	100,00	-	100,00	10.247,34	-	10.247,34	
1.3.0.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	2.790,94	100,00	-	100,00	2.790,94	-	2.790,94	
1.3.0.2.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	4.306,94	100,00	-	100,00	4.306,94	-	4.306,94	
1.3.0.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	3.149,46	100,00	-	100,00	3.149,46	-	3.149,46	
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.966,44	69,80	24,01	93,81	37.668,74	12.957,70	50.626,44	
1.4.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.169,28	100,00	-	100,00	1.169,28	-	1.169,28	
1.4.0.2.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	12.957,70	-	100,00	100,00	-	12.957,70	12.957,70	
1.4.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	7.246,32	100,00	-	100,00	7.246,32	-	7.246,32	
1.4.0.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	2.941,68	100,00	-	100,00	2.941,68	-	2.941,68	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.4.0.5.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	3.340,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.0.6.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	242,69	100,00	-	100,00	242,69	-	242,69	
1.4.0.7.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	26.068,77	100,00	-	100,00	26.068,77	-	26.068,77	
1.5.	LOCAÇÃO DA OBRA	4.345,40	100,00	-	100,00	4.345,40	-	4.345,40	
1.5.0.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	4.345,40	100,00	-	100,00	4.345,40	-	4.345,40	
1.6.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	35.065,54	100,00	-	100,00	35.065,54	-	35.065,54	
1.6.1.	Movimentação de Terra	2.036,78	100,00	-	100,00	2.036,78	-	2.036,78	
1.6.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	1.267,51	100,00	-	100,00	1.267,51	-	1.267,51	
1.6.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	295,41	100,00	-	100,00	295,41	-	295,41	
1.6.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	473,86	100,00	-	100,00	473,86	-	473,86	
1.6.2.	Sapatas	24.438,80	100,00	-	100,00	24.438,80	-	24.438,80	
1.6.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	435,55	100,00	-	100,00	435,55	-	435,55	
1.6.2.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	8.432,27	100,00	-	100,00	8.432,27	-	8.432,27	
1.6.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	457,01	100,00	-	100,00	457,01	-	457,01	
1.6.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	36,06	100,00	-	100,00	36,06	-	36,06	
1.6.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	7.205,65	100,00	-	100,00	7.205,65	-	7.205,65	
1.6.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	724,24	100,00	-	100,00	724,24	-	724,24	
1.6.2.7.	CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	7.148,02	100,00	-	100,00	7.148,02	-	7.148,02	
1.6.3.	Vigas Baldrames	8.589,96	100,00	-	100,00	8.589,96	-	8.589,96	
1.6.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	114,51	100,00	-	100,00	114,51	-	114,51	
1.6.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	3.227,39	100,00	-	100,00	3.227,39	-	3.227,39	
1.6.3.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.242,73	100,00	-	100,00	1.242,73	-	1.242,73	
1.6.3.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	2.189,96	100,00	-	100,00	2.189,96	-	2.189,96	
1.6.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	240,76	100,00	-	100,00	240,76	-	240,76	
1.6.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	127,26	100,00	-	100,00	127,26	-	127,26	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.6.3.7.	CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1.447,35	100,00	-	100,00	1.447,35	-	1.447,35	
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA - TÉRREO E MEZANINO	123.734,08	100,00	-	100,00	123.734,08	-	123.734,08	
1.7.1.	Vigas e Pilares	123.734,08	100,00	-	100,00	123.734,08	-	123.734,08	
1.7.1.1.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	95.641,11	100,00	-	100,00	95.641,11	-	95.641,11	
1.7.1.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	28.092,97	100,00	-	100,00	28.092,97	-	28.092,97	
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.592,94	100,00	-	100,00	2.592,94	-	2.592,94	
1.8.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	2.592,94	100,00	-	100,00	2.592,94	-	2.592,94	
1.9.	DIVISÓRIAS	8.125,52	100,00	-	100,00	8.125,52	-	8.125,52	
1.9.0.1.	PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU) VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS	3.203,75	100,00	-	100,00	3.203,75	-	3.203,75	
1.9.0.2.	PAREDE COM PLACA CIMENTÍCIA LISA E=6MM, PARA USO INTERNO E EXTERNO E ESTRUTURA METÁLICA SEM VÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.921,77	100,00	-	100,00	4.921,77	-	4.921,77	
1.10.	COBERTURA	246.775,22	84,78	1,24	86,02	209.225,83	3.059,10	212.284,93	
1.10.0.1.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	108.670,41	100,00	-	100,00	108.670,41	-	108.670,41	
1.10.0.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P	30.425,35	100,00	-	100,00	30.425,35	-	30.425,35	
1.10.0.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	49.749,32	100,00	-	100,00	49.749,32	-	49.749,32	
1.10.0.4.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	5.326,05	100,00	-	100,00	5.326,05	-	5.326,05	
1.10.0.5.	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	8.633,16	100,00	-	100,00	8.633,16	-	8.633,16	
1.10.0.6.	RINCÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	5.671,30	100,00	-	100,00	5.671,30	-	5.671,30	
1.10.0.7.	CONTRARRUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	750,24	100,00	-	100,00	750,24	-	750,24	
1.10.0.8.	OITÃO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.307,43	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.10.0.9.	BEIRAL DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30.590,96	-	10,00	10,00	-	3.059,10	3.059,10	
1.10.0.10.	TABEIRA DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.651,00	-	-	-	-	-	-	
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.177,84	83,19	2,93	86,12	14.290,85	502,68	14.793,53	
1.11.1.	Movimentação de Terra	942,07	100,00	-	100,00	942,07	-	942,07	
1.11.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	214,92	100,00	-	100,00	214,92	-	214,92	
1.11.1.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	727,15	100,00	-	100,00	727,15	-	727,15	
1.11.2.	Água Fria	4.166,77	86,57	4,00	90,56	3.606,99	166,63	3.773,62	
1.11.2.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	222,93	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.2.	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	170,22	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	3.332,62	95,00	5,00	100,00	3.165,99	166,63	3.332,62	
1.11.2.4.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	337,57	100,00	-	100,00	337,57	-	337,57	
1.11.2.5.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	103,43	100,00	-	100,00	103,43	-	103,43	
1.11.3.	Esgoto	12.069,00	80,72	2,78	83,50	9.741,79	336,05	10.077,84	
1.11.3.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	2.649,23	90,00	10,00	100,00	2.384,31	264,92	2.649,23	
1.11.3.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	1.233,79	95,00	5,00	100,00	1.172,10	61,69	1.233,79	
1.11.3.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	5.960,59	100,00	-	100,00	5.960,59	-	5.960,59	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA				TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.11.3.4.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			45,37	100,00	-	100,00	45,37	-	45,37	
1.11.3.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			1.991,16	-	-	-	-	-	-	
1.11.3.6.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO			188,86	95,00	5,00	100,00	179,42	9,44	188,86	
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			101.528,80	31,08	-	31,08	31.552,72	-	31.552,72	
1.12.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			129,70	100,00	-	100,00	129,70	-	129,70	
1.12.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			438,65	100,00	-	100,00	438,65	-	438,65	
1.12.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			378,80	70,00	-	70,00	265,16	-	265,16	
1.12.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			124,56	70,00	-	70,00	87,19	-	87,19	
1.12.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			2.200,50	90,00	-	90,00	1.980,45	-	1.980,45	
1.12.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			8.866,80	70,00	-	70,00	6.206,76	-	6.206,76	
1.12.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			6.175,80	80,00	-	80,00	4.940,64	-	4.940,64	
1.12.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			4.508,00	70,00	-	70,00	3.155,60	-	3.155,60	
1.12.0.9.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020			226,94	100,00	-	100,00	226,94	-	226,94	
1.12.0.10.	TOMADA DE PISO INCLUINDO CAIXA DE ALUMÍNIO, 2 TOMADAS E PLACA TIPO UNHA DUPLA PARA PISO 4X4 CROMADA			2.801,16	50,00	-	50,00	1.400,58	-	1.400,58	
1.12.0.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			74,48	50,00	-	50,00	37,24	-	37,24	
1.12.0.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			323,64	50,00	-	50,00	161,82	-	161,82	
1.12.0.13.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			558,80	50,00	-	50,00	279,40	-	279,40	
1.12.0.14.	CONTATOR MODULAR 2 POLOS 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			212,85	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.15.	TIMER DIGITAL TRILHO DIN 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			134,20	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.16.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			65,76	100,00	-	100,00	65,76	-	65,76	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.12.0.17.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	164,32	100,00	-	100,00	164,32	-	164,32	
1.12.0.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	867,20	100,00	-	100,00	867,20	-	867,20	
1.12.0.19.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	229,48	100,00	-	100,00	229,48	-	229,48	
1.12.0.20.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	134,63	100,00	-	100,00	134,63	-	134,63	
1.12.0.21.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	216,55	100,00	-	100,00	216,55	-	216,55	
1.12.0.22.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	400,44	100,00	-	100,00	400,44	-	400,44	
1.12.0.23.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	6.588,70	90,00	-	90,00	5.929,83	-	5.929,83	
1.12.0.24.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	936,36	100,00	-	100,00	936,36	-	936,36	
1.12.0.25.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	213,66	100,00	-	100,00	213,66	-	213,66	
1.12.0.26.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	42,28	100,00	-	100,00	42,28	-	42,28	
1.12.0.27.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	26,20	100,00	-	100,00	26,20	-	26,20	
1.12.0.28.	PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	131,24	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.29.	LUSTRE PENDENTE CRISTAL 80CM COM 18 LÂMPADAS HALOPIN G9 9W, INCLUSO CABO DE AÇO PARA LUSTRE 1,2X5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.136,43	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.30.	LUSTRE PENDENTE CRISTAL 80CM COM 18 LÂMPADAS HALOPIN G9 5W, INCLUSO CABO DE AÇO PARA LUSTRE 1,2X5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	47.092,02	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.31.	REFLETOR LED IP 66 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.657,20	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.32.	SPOT LED EMBUTIR QUADRADO 3000K 11W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.687,04	45,83	-	45,83	1.231,47	-	1.231,47	
1.12.0.33.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 52 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.784,41	100,00	-	100,00	1.784,41	-	1.784,41	
1.13.	SPDA	129,29	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.1.	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE REFORÇADO PARA DOIS CABOS E UMA HASTE, PARA CABOS DE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,34	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.2.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	105,95	-	-	-	-	-	-	
1.14.	REVESTIMENTOS	179.248,89	60,61	5,06	65,67	108.638,95	9.064,89	117.703,84	
1.14.1.	Pisos	85.067,89	46,24	0,65	46,88	39.332,11	551,13	39.883,24	
1.14.1.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	124,33	100,00	-	100,00	124,33	-	124,33	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA				TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.14.1.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_ 08/2017			940,77	100,00	-	100,00	940,77	-	940,77	
1.14.1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 07/2016			15.412,61	100,00	-	100,00	15.412,61	-	15.412,61	
1.14.1.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021			4.795,39	100,00	-	100,00	4.795,39	-	4.795,39	
1.14.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 06/2014			779,61	100,00	-	100,00	779,61	-	779,61	
1.14.1.6.	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			11.022,67	95,00	5,00	100,00	10.471,54	551,13	11.022,67	
1.14.1.7.	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_ 09/2020			42.915,70	-	-	-	-	-	-	
1.14.1.8.	DEGRAU PARA ESCADA DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.069,09	-	-	-	-	-	-	
1.14.1.9.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020			6.807,86	100,00	-	100,00	6.807,86	-	6.807,86	
1.14.1.10.	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_ 09/2020			199,86	-	-	-	-	-	-	
1.14.2.	Paredes			15.332,59	91,30	4,35	95,65	13.998,35	667,12	14.665,47	
1.14.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.990,18	100,00	-	100,00	1.990,18	-	1.990,18	
1.14.2.2.	REVESTIMENTO DE TIJOLINHO NATURAL RÚSTICO 25X7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			13.342,41	90,00	5,00	95,00	12.008,17	667,12	12.675,29	
1.14.3.	Forro			78.848,41	70,15	9,95	80,10	55.308,49	7.846,64	63.155,13	
1.14.3.1.	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			78.466,40	70,00	10,00	80,00	54.926,48	7.846,64	62.773,12	
1.14.3.2.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_ 05/2017_P			382,01	100,00	-	100,00	382,01	-	382,01	
1.15.	ESQUADRIAS			179.932,05	98,24	-	98,24	176.767,69	-	176.767,69	
1.15.1.	Fachada			175.833,67	100,00	-	100,00	175.833,67	-	175.833,67	
1.15.1.1.	FACHADA EM VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, COM PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, INCLUSO PORTAS SANFONADAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, COM FECHADURAS E PUXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			175.833,67	100,00	-	100,00	175.833,67	-	175.833,67	
1.15.2.	Portas de Madeira			4.098,38	22,79	-	22,79	934,02	-	934,02	
1.15.2.1.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019			1.167,52	80,00	-	80,00	934,02	-	934,02	
1.15.2.2.	PORTA DE MADEIRA DE CORRER EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90x210CM, INCLUSO TRILHO, PORTA, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.153,14	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.15.2.3.	PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO (PESADA OU SUPERPESADA), 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BATENTE, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.777,72	-	-	-	-	-	-	
1.16.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.341,77	92,29	-	92,29	5.852,56	-	5.852,56	
1.16.0.1.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	191,93	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	658,45	100,00	-	100,00	658,45	-	658,45	
1.16.0.3.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	116,68	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.4.	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	120,40	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.5.	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,20	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.6.	BANCADA DE GRANITO, DE 1,30 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE SAIA E RODAPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.148,66	100,00	-	100,00	1.148,66	-	1.148,66	
1.16.0.7.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	787,03	100,00	-	100,00	787,03	-	787,03	
1.16.0.8.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	3.258,42	100,00	-	100,00	3.258,42	-	3.258,42	
1.17.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	121.243,46	-	11,93	11,93	-	14.467,20	14.467,20	
1.17.0.1.	GUARDA-CORPO EM BALAUSTRAS DE MADEIRA ITAÚBA PINTADO NA COR BRANCA COM ALTURA DE 1,10M, COM UMA PORTA EM BALAUSTRAS 70X110CM, INCLUSIVE CORRIMÃO INSTALADO A 92CM DE ALTURA NA ESCADA CONFORME PROJETO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	106.776,26	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.2.	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	14.467,20	-	100,00	100,00	-	14.467,20	14.467,20	
1.18.	PINTURA	15.774,96	-	-	-	-	-	-	
1.18.1.	Piso	5.644,96	-	-	-	-	-	-	
1.18.1.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	581,07	-	-	-	-	-	-	
1.18.1.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	5.063,89	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.	Forro	10.130,00	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	1.043,52	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	8.993,62	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	12,59	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	80,27	-	-	-	-	-	-	
1.19.	DETALHES E ACESSÓRIOS	36.248,53	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.1.	EXAUSTOR E DUTO DE VENTILAÇÃO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	702,04	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.19.0.2.	CHAPÉU ALETADO PARA CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EPÓXI, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.175,01	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.3.	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24.574,00	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.4.	CORTINA DE AR PARA PORTAS DE 250CM DE LARGURA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7.797,48	-	-	-	-	-	-	
1.20.	PSCIP	2.196,27	84,93	-	84,93	1.865,40	-	1.865,40	
1.20.0.1.	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG - 2A - 20B:C COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.232,20	100,00	-	100,00	1.232,20	-	1.232,20	
1.20.0.2.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	423,12	90,00	-	90,00	380,81	-	380,81	
1.20.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	166,44	80,00	-	80,00	133,15	-	133,15	
1.20.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 22X22CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	149,05	80,00	-	80,00	119,24	-	119,24	
1.20.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 78X45CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	225,46	-	-	-	-	-	-	
1.21.	ÁREA EXTERNA	542.440,11	73,81	4,28	78,09	400.379,79	23.203,38	423.583,17	
1.21.1.	Infraestrutura para Irrigação	14.372,91	91,12	8,34	99,46	13.096,22	1.199,10	14.295,32	
1.21.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	4.131,56	100,00	-	100,00	4.131,56	-	4.131,56	
1.21.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	1.594,30	100,00	-	100,00	1.594,30	-	1.594,30	
1.21.1.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2.667,55	90,00	10,00	100,00	2.400,80	266,75	2.667,55	
1.21.1.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1.252,01	90,00	10,00	100,00	1.126,81	125,20	1.252,01	
1.21.1.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3.128,10	100,00	-	100,00	3.128,10	-	3.128,10	
1.21.1.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	392,80	90,00	10,00	100,00	353,52	39,28	392,80	
1.21.1.7.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	506,70	-	100,00	100,00	-	506,70	506,70	
1.21.1.8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	108,55	-	100,00	100,00	-	108,55	108,55	
1.21.1.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	9,21	90,00	10,00	100,00	8,29	0,92	9,21	
1.21.1.10.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	392,04	90,00	10,00	100,00	352,84	39,20	392,04	
1.21.1.11.	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	40,68	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.21.1.12.	TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	88,38	-	100,00	100,00	-	88,38	88,38	
1.21.1.13.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	24,12	-	100,00	100,00	-	24,12	24,12	
1.21.1.14.	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	36,91	-	-	-	-	-	-	
1.21.2.	Drenagem	84.007,03	92,94	-	92,94	78.079,92	-	78.079,92	
1.21.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	5.533,58	100,00	-	100,00	5.533,58	-	5.533,58	
1.21.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	1.882,09	100,00	-	100,00	1.882,09	-	1.882,09	
1.21.2.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	44.754,30	100,00	-	100,00	44.754,30	-	44.754,30	
1.21.2.4.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40M x 0,40M X VARIÁVEL.	14.523,32	100,00	-	100,00	14.523,32	-	14.523,32	
1.21.2.5.	CANALETA DE CONCRETO L:15CM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.854,23	50,00	-	50,00	5.927,12	-	5.927,12	
1.21.2.6.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF 07/2021	5.459,51	100,00	-	100,00	5.459,51	-	5.459,51	
1.21.3.	Iluminação	94.348,48	49,20	-	49,20	46.415,13	-	46.415,13	
1.21.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	5.885,37	100,00	-	100,00	5.885,37	-	5.885,37	
1.21.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	2.251,59	100,00	-	100,00	2.251,59	-	2.251,59	
1.21.3.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	5.010,00	70,00	-	70,00	3.507,00	-	3.507,00	
1.21.3.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	7.464,75	70,00	-	70,00	5.225,33	-	5.225,33	
1.21.3.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	4.416,00	40,00	-	40,00	1.766,40	-	1.766,40	
1.21.3.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	7.199,92	80,00	-	80,00	5.759,94	-	5.759,94	
1.21.3.7.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	3.762,00	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.8.	CONTATOR MODULAR 2 POLOS 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	211,15	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.9.	TIMER DIGITAL TRILHO DIN 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	133,13	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.10.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	108,42	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.11.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	81,52	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.12.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	172,06	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.13.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	430,15	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.21.3.14.	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMA DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	277,52	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.660,00	70,00	-	70,00	1.862,00	-	1.862,00	
1.21.3.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	5.805,50	100,00	-	100,00	5.805,50	-	5.805,50	
1.21.3.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	55,41	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.18.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	141,32	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.19.	BALIZADOR EXTERNO RETANGULAR 5W IP67 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.260,98	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.20.	SUPERPOSTE DE CONCRETO ARMADO, CÔNICO CONTÍNUO, 12M DE ALTURA TOTAL, 170MM NO TOPO, CONTENDO SUPORTE PARA CONEXÃO DAS LUMINÁRIAS DE 4 PÉTALAS EM LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28.704,00	50,00	-	50,00	14.352,00	-	14.352,00	
1.21.3.21.	CONTATOR TRIPOLAR 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	317,69	-	-	-	-	-	-	
1.21.4.	Pisos e Canteiros	265.387,45	88,53	7,81	96,34	234.960,37	20.723,37	255.683,74	
1.21.4.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	4.796,61	100,00	-	100,00	4.796,61	-	4.796,61	
1.21.4.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	18.466,47	100,00	-	100,00	18.466,47	-	18.466,47	
1.21.4.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	36.022,14	100,00	-	100,00	36.022,14	-	36.022,14	
1.21.4.4.	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	24.962,43	100,00	-	100,00	24.962,43	-	24.962,43	
1.21.4.5.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, PAGINAÇÃO PADRÃO PATO BRANCO 2 CORES, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE	27.202,78	85,00	10,00	95,00	23.122,36	2.720,28	25.842,64	
1.21.4.6.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, 1 COR, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE	72.682,83	85,00	15,00	100,00	61.780,41	10.902,42	72.682,83	
1.21.4.7.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM TÁTIL DIRECIONAL ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE	7.659,88	40,00	60,00	100,00	3.063,95	4.595,93	7.659,88	
1.21.4.8.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM TÁTIL ALERTA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE	885,06	95,00	5,00	100,00	840,81	44,25	885,06	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 10/05/2024
					Nº MEDIÇÃO 10

Realizado Acumulado: 73,14%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA		TOTAL:	1.782.530,83	69,45	3,69	73,14	1.237.922,96	65.777,86	1.303.700,82
1.21.4.9.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	24.604,93	60,00	10,00	70,00	14.762,96	2.460,49	17.223,45	
1.21.4.10.	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	48.104,32	98,00	-	98,00	47.142,23	-	47.142,23	
1.21.5.	Escadas e Muros de Pedra	30.487,36	91,28	4,20	95,48	27.828,15	1.280,91	29.109,06	
1.21.5.1.	MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	25.618,32	90,00	5,00	95,00	23.056,49	1.280,91	24.337,40	
1.21.5.2.	ESCALADA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	4.869,04	98,00	-	98,00	4.771,66	-	4.771,66	
1.21.6.	Parede Verde	53.836,88	-	-	-	-	-	-	
1.21.6.1.	PAREDE VERDE 6,00X2,50M EM ESTRUTURA METÁLICA COM KIT PARA JARDIM VERTICAL CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	39.468,00	-	-	-	-	-	-	
1.21.6.2.	PAREDE VERDE 5,16X2,50M EM ESTRUTURA METÁLICA COM KIT PARA JARDIM VERTICAL CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.368,88	-	-	-	-	-	-	
1.22.	SERVIÇOS FINAIS	1.906,74	-	-	-	-	-	-	
1.22.0.1.	LIMPEZA DE PISO DE MADEIRA	549,86	-	-	-	-	-	-	
1.22.0.2.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	10,01	-	-	-	-	-	-	
1.22.0.3.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	82,29	-	-	-	-	-	-	
1.22.0.4.	LIMPEZA DE VIDRO	1.264,58	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.



Documento assinado digitalmente
FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 10/05/2024 11:51:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PATO BRANCO/PR

Local

quinta-feira, 18 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fernanda Zianni Manarim

Profissão: Engenheira Civil

CREA/CAU 107.389/D

ART/RRT: 1720230913036



Construção De Casa Temática com área de 229,98 m² e revitalização de Praça de Transição e Sacra com área de 2.230,00 m², localizadas no lote 04 da quadra 014, no município de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.



CONTRATO Nº362/2022-GP



Relatório de Medição nº 10



Empresa Contratada: L. RITA - EIRELI

Responsável técnico: Josias Junior Orben



Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a décima medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

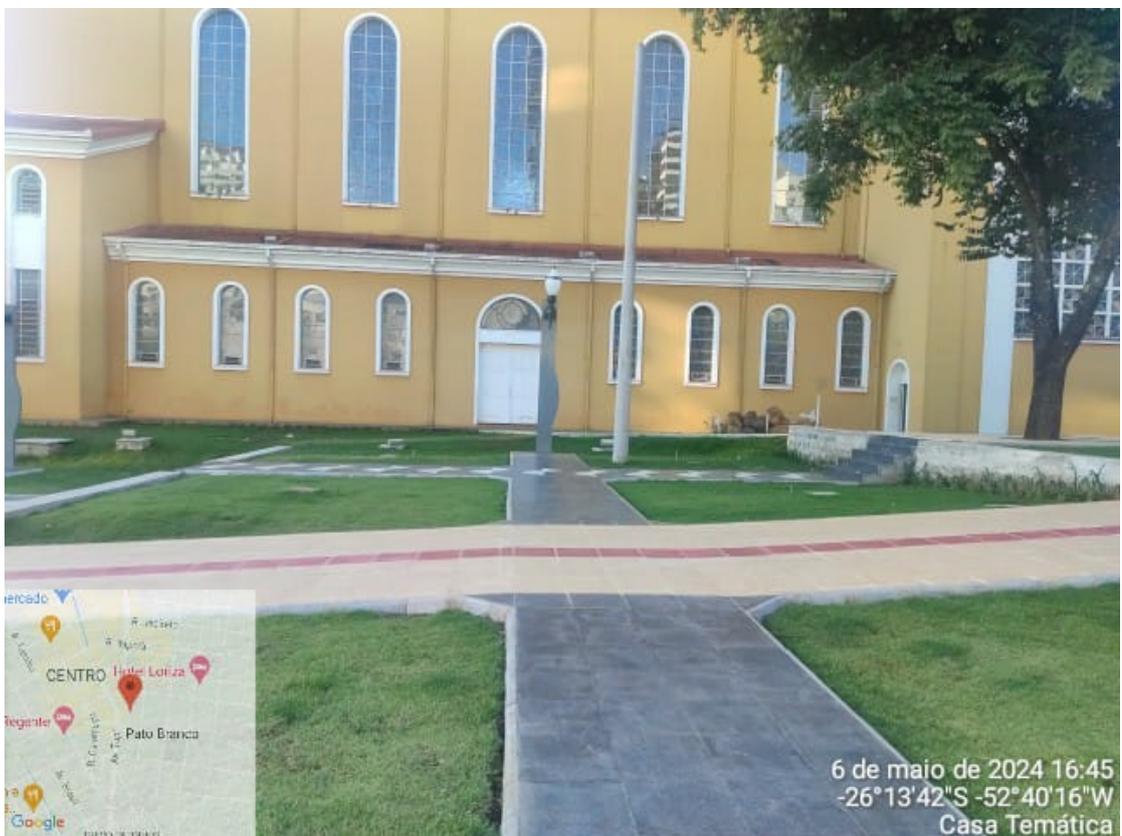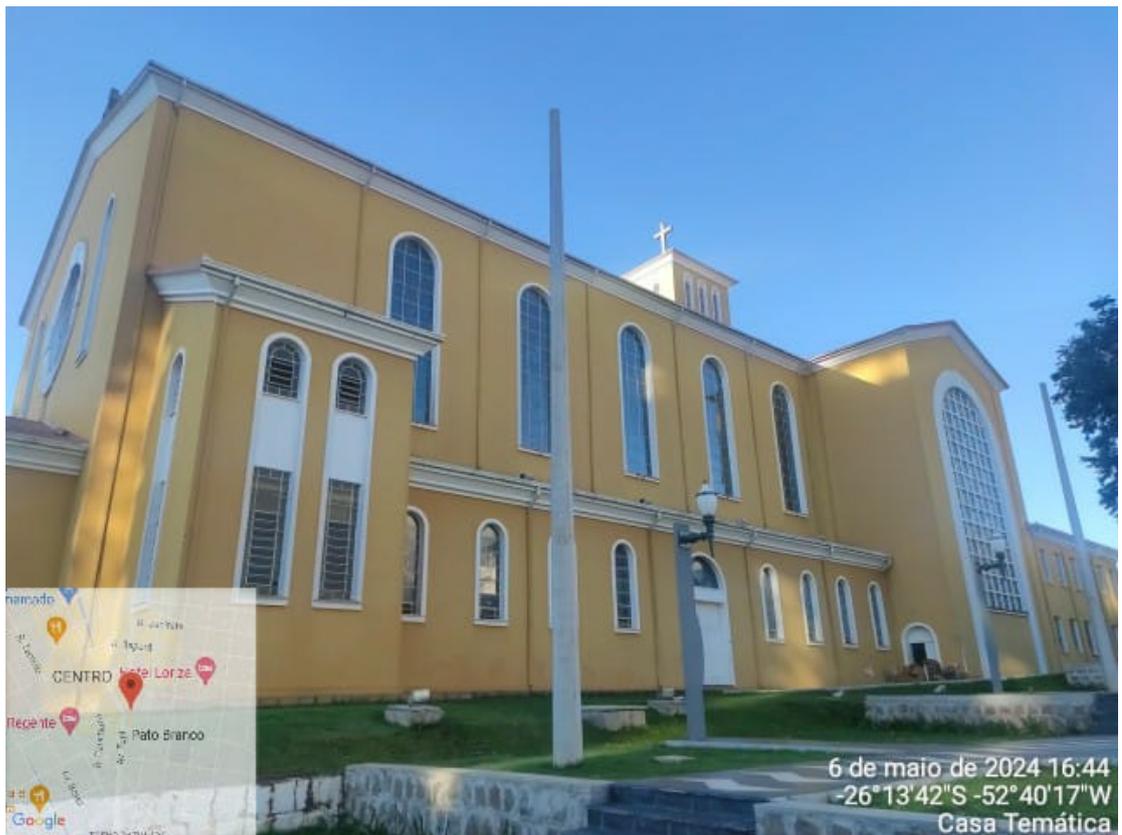


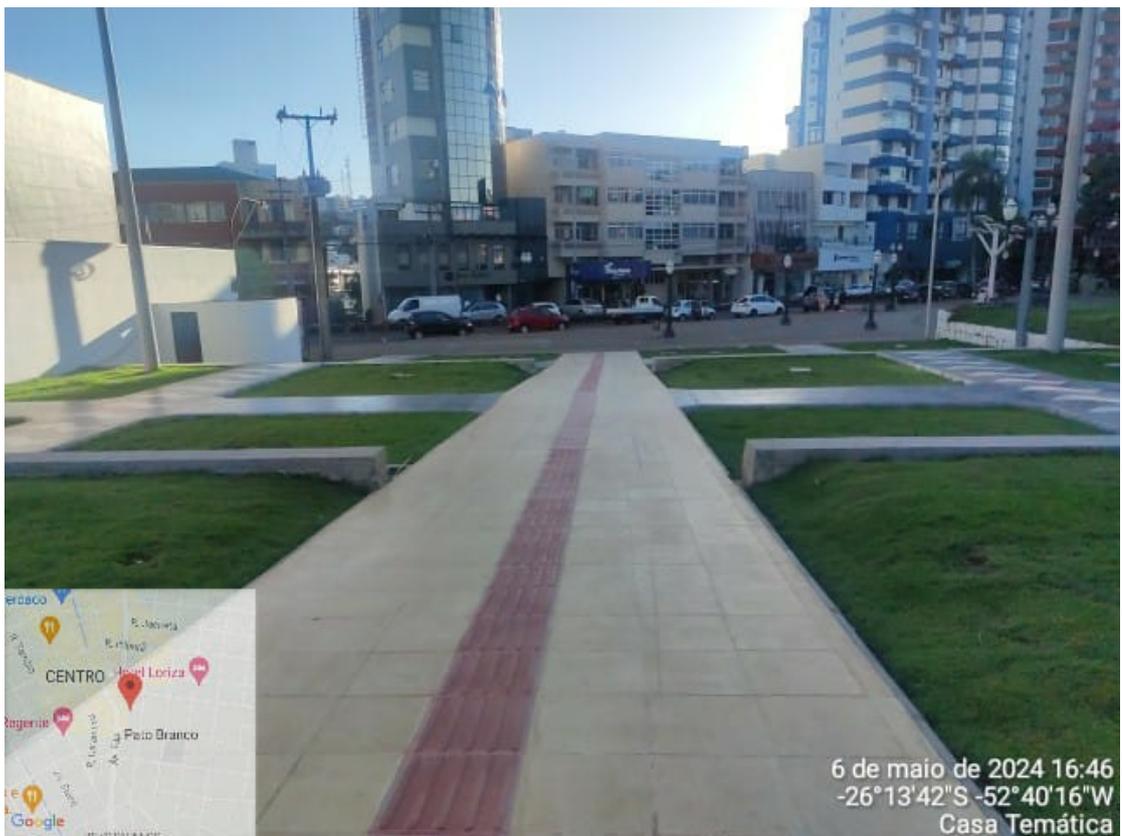
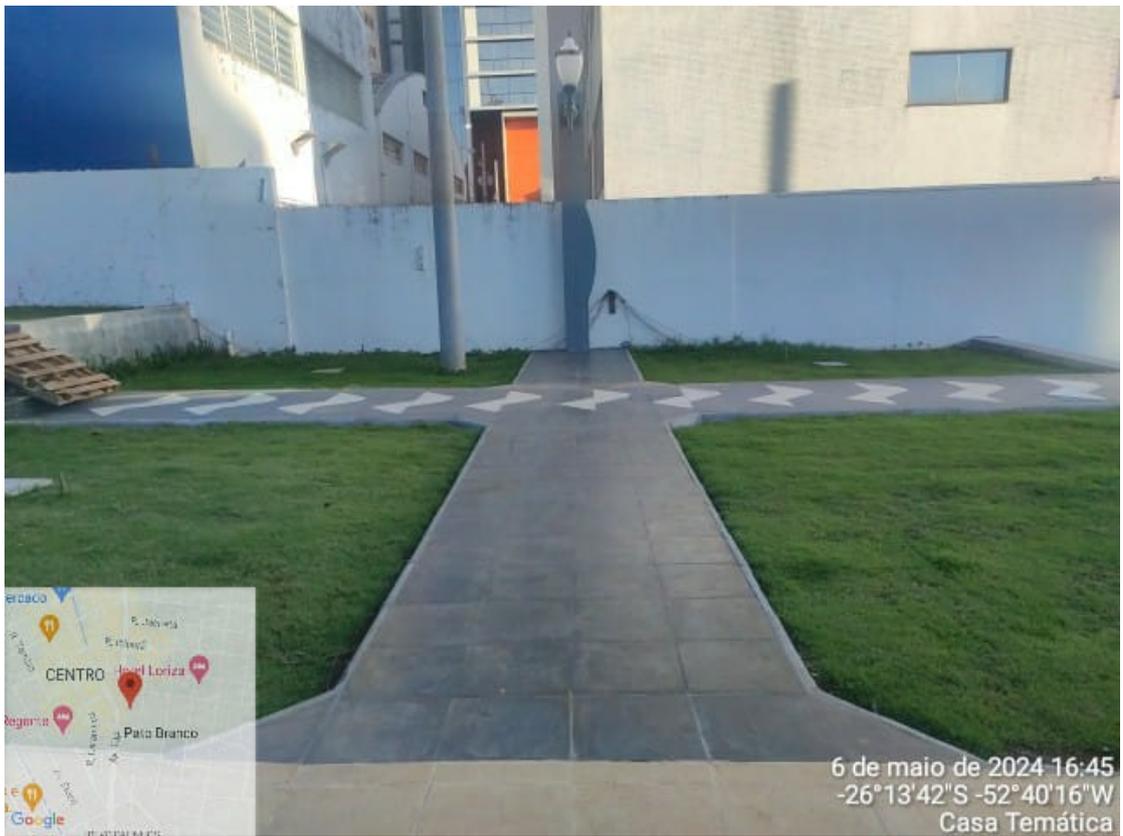


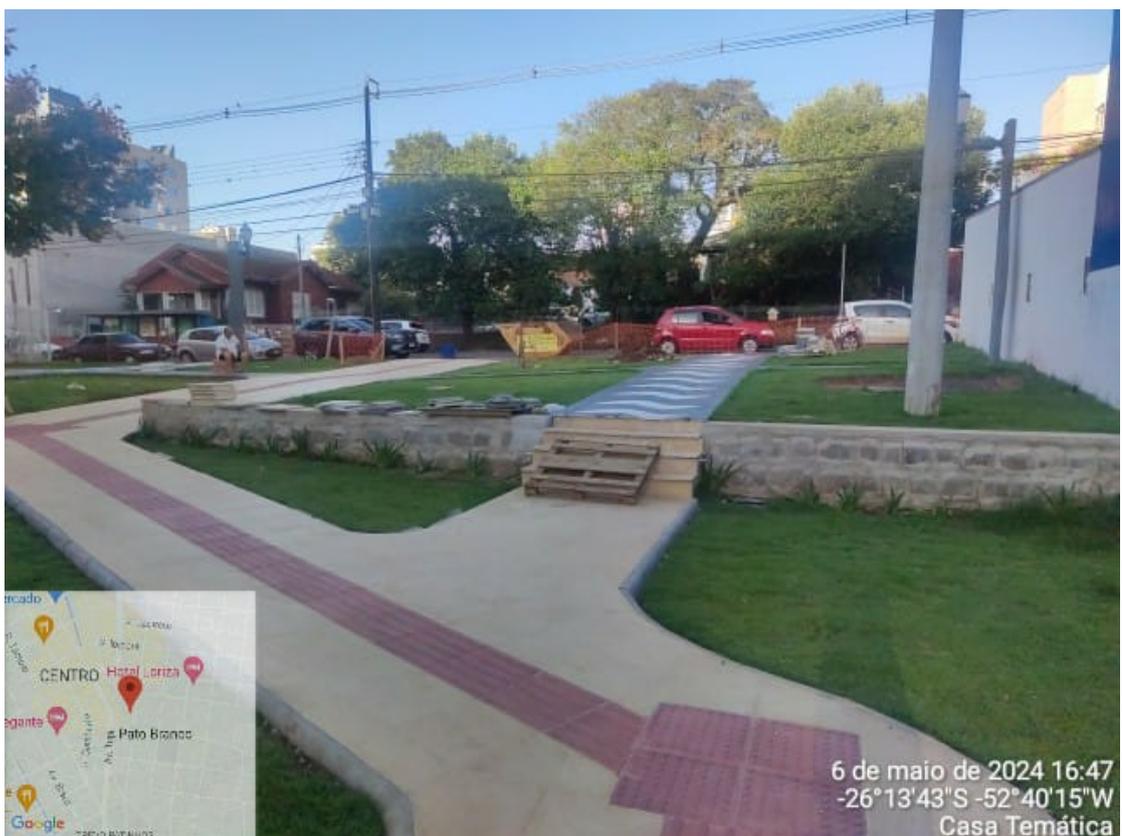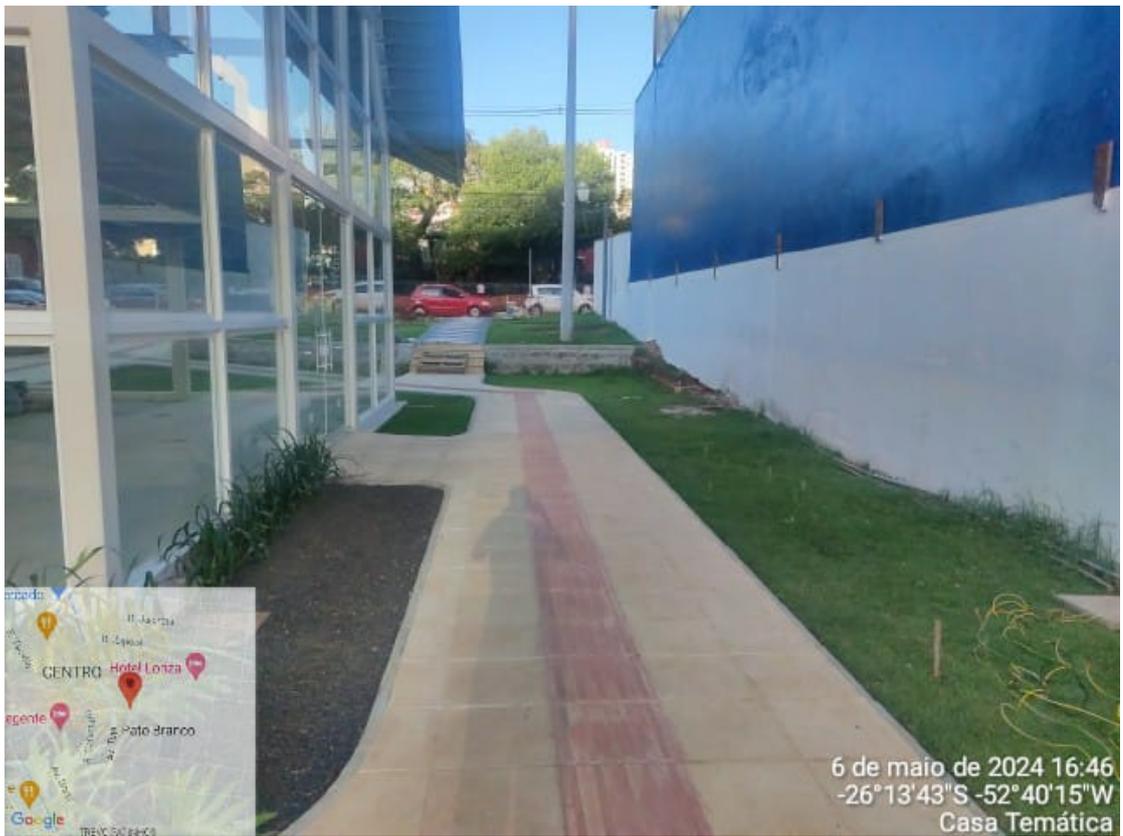




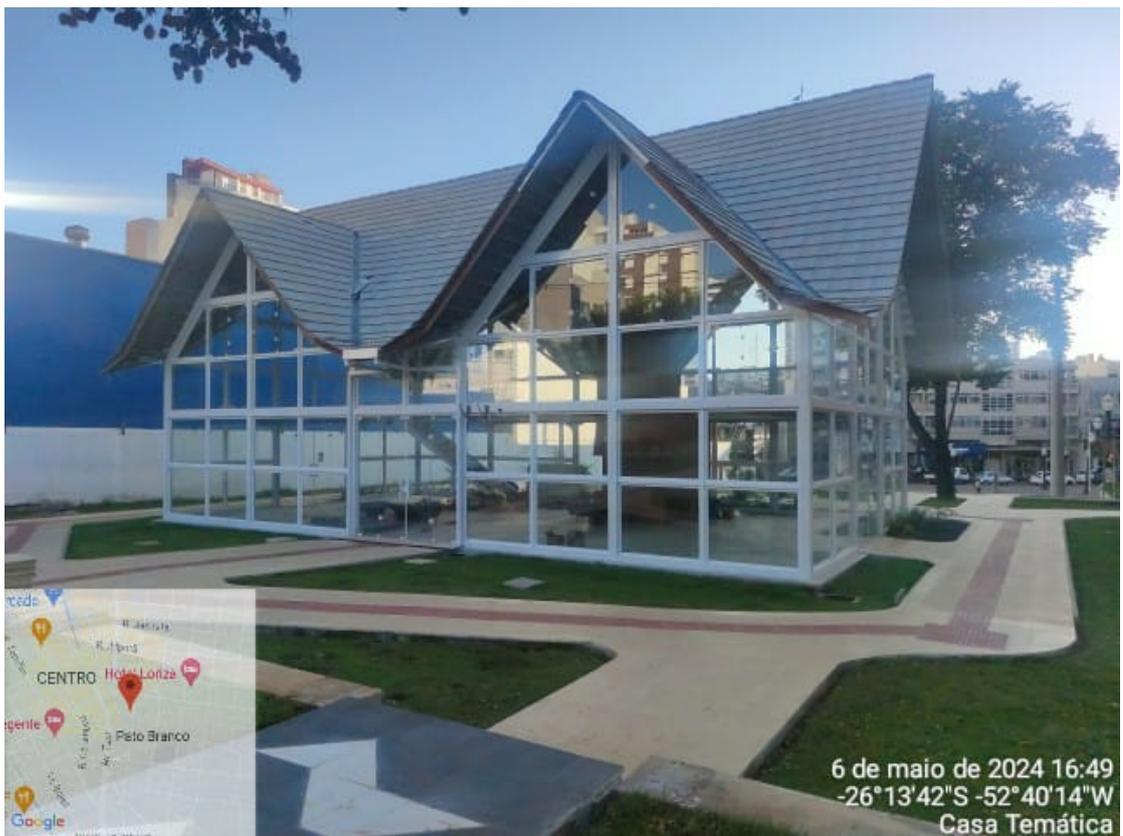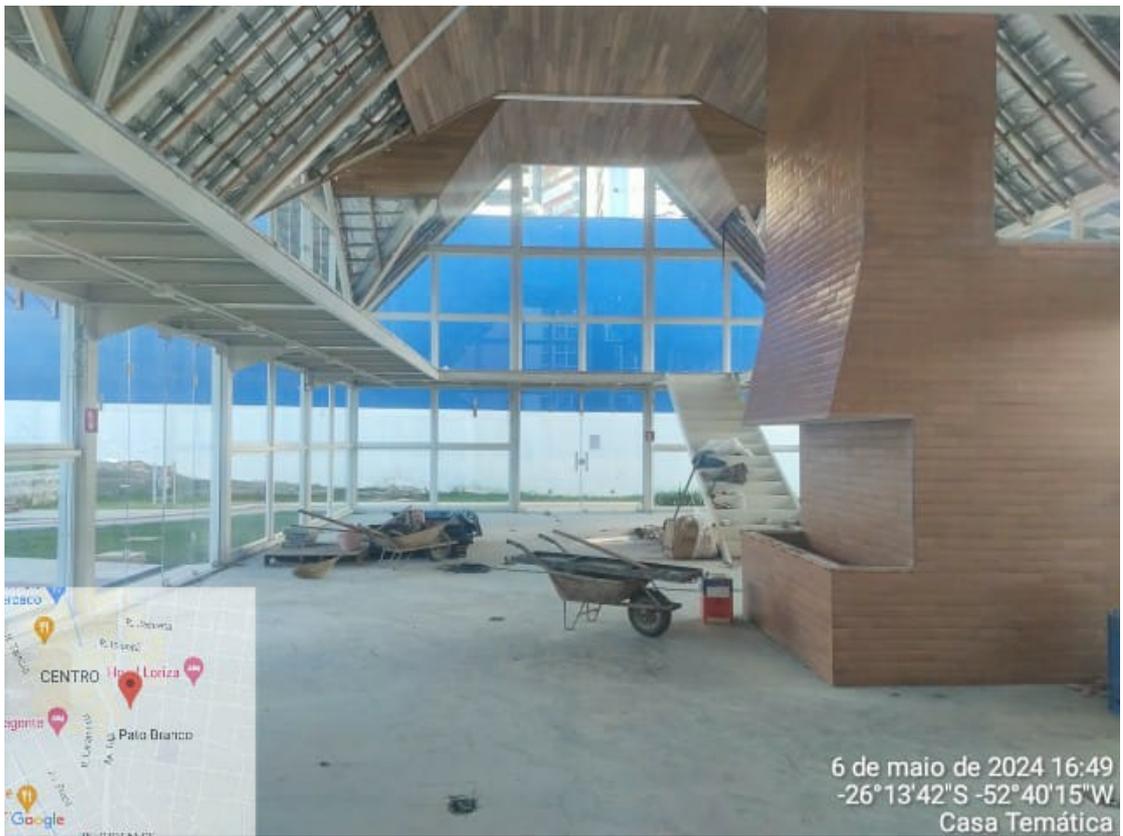

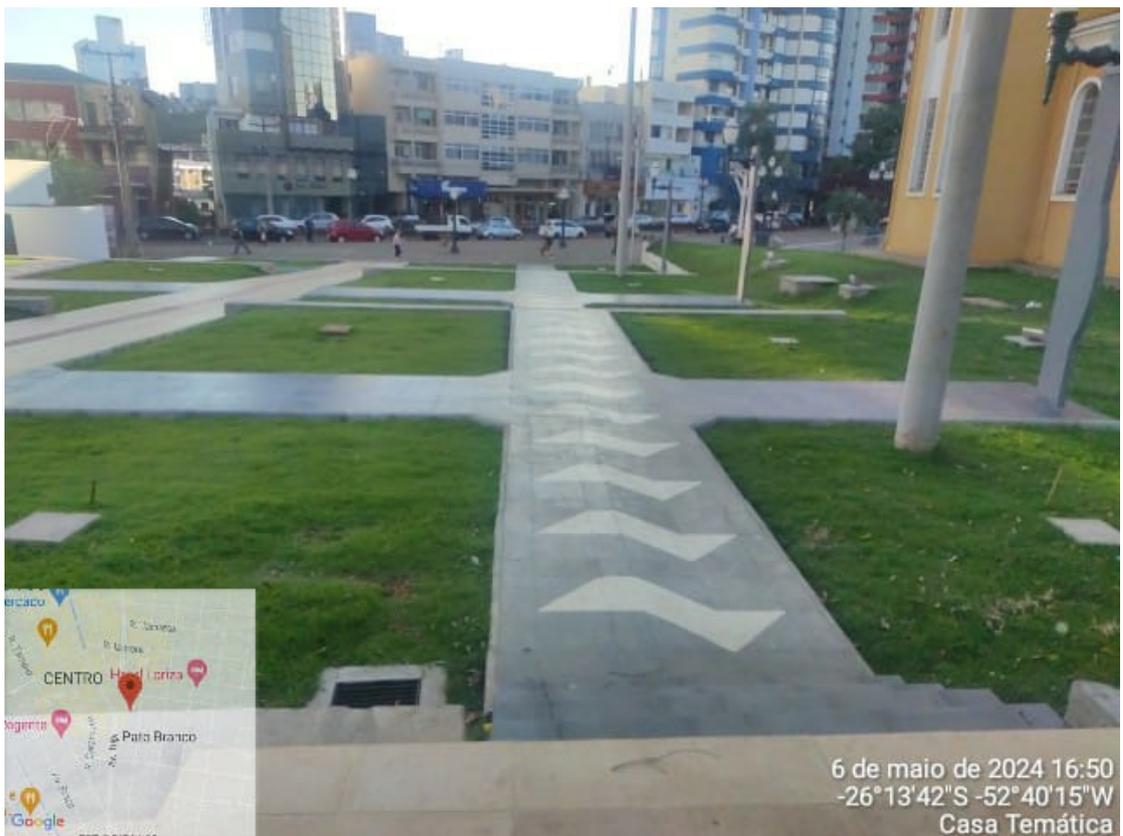

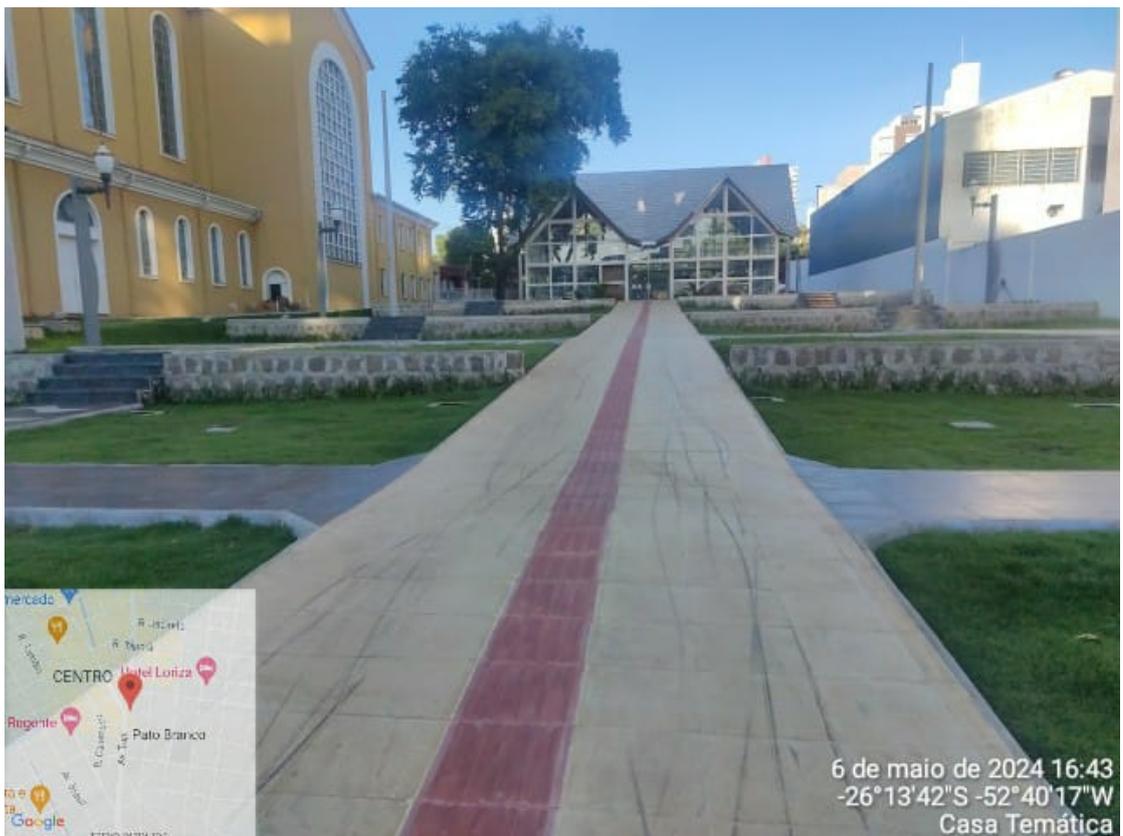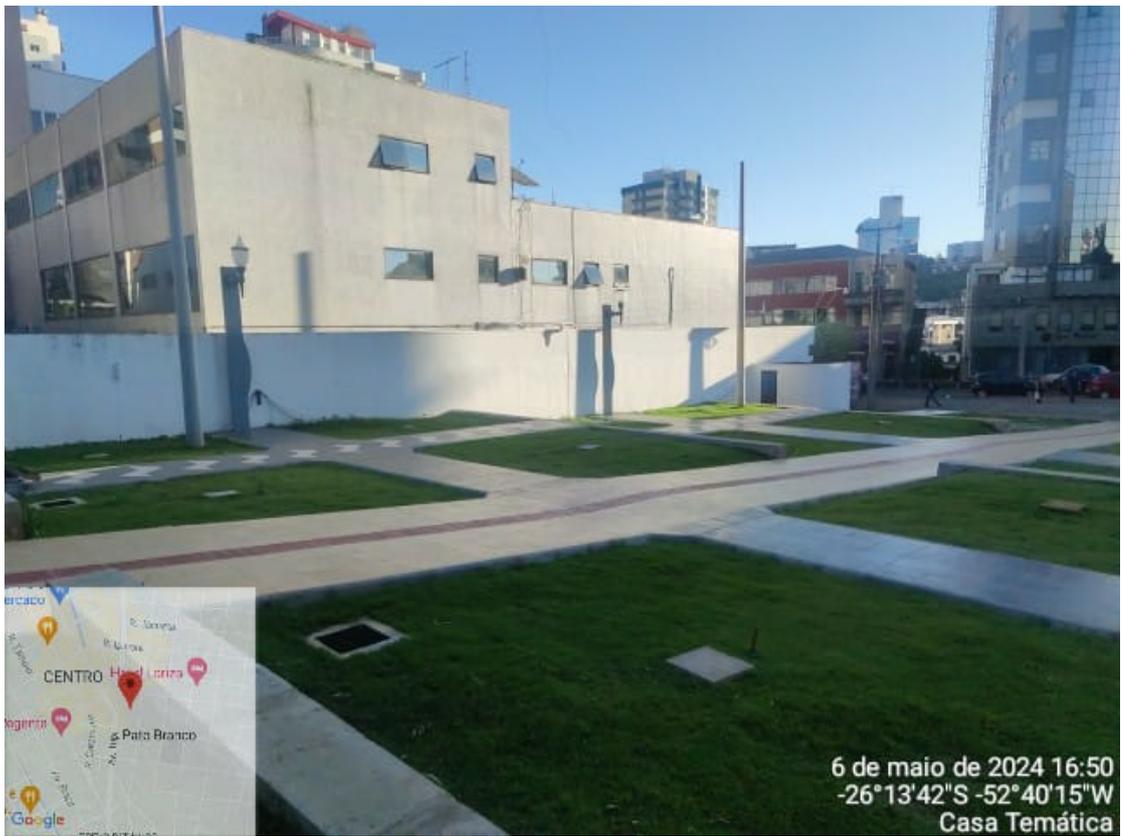

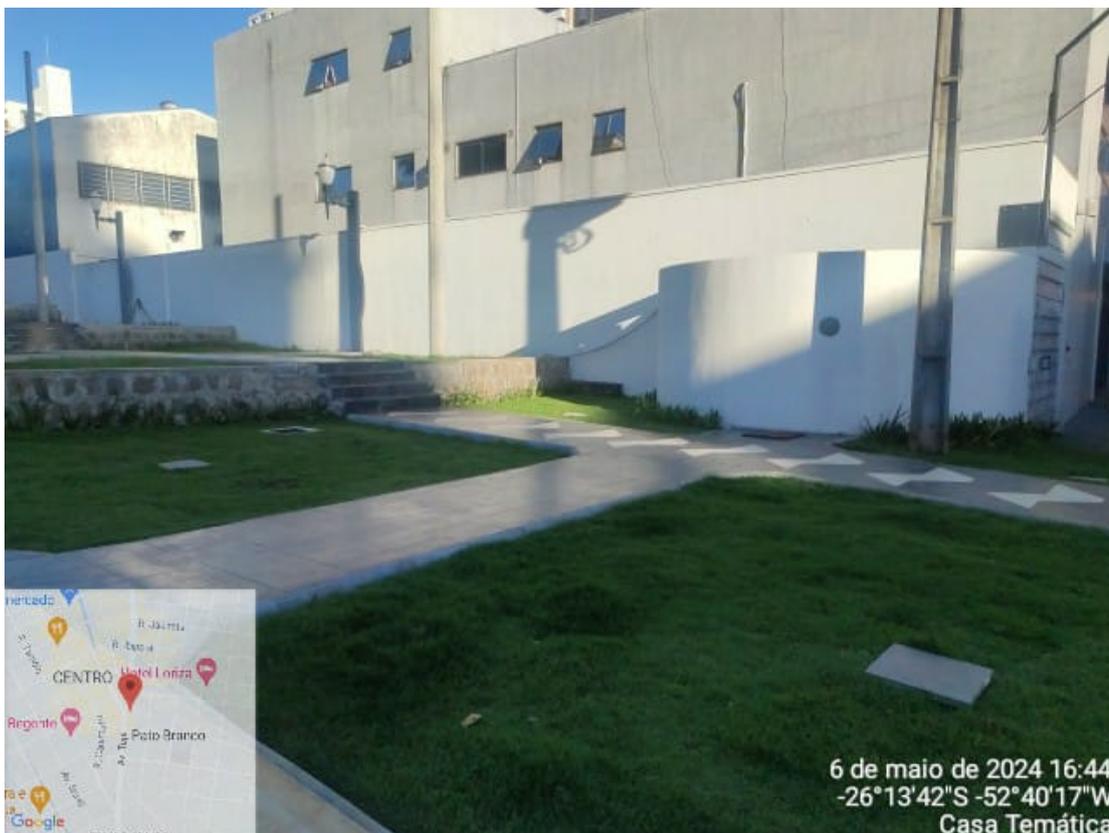

Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 65.777,86**.

Pato Branco, 10 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 10/05/2024 11:51:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
