

Proc. Administrativo 73- 10.297/2022

De: Fernanda M. - DEO-DE-SET

Para: SAF-DDF-ST-SLIQ - Setor de Liquidação

Data: 11/08/2023 às 15:22:33

Setores envolvidos:

GAB, SAF, SAF-DDF-STF-SR, SAF-DC-SE, SAF-DC-SRP, SEO, SEL, SEL-DA, SPU-DDU-DGCT, DEO-DE-SET, SAF-RE, SAF-RAP, SAF-DC-CEMP, SAF-DDF-ST-SLIQ, SAF-DDF-ST-PROC, SAF-DDF-ST-PAUT, SAF-PROCPAG, SAF-DF

RP Contrato 202/2022 - Brava Construtora - Cancha Bocha

Secretário Zoche,

Encaminho para assinatura, o processo da **oitava medição**, referente ao contrato 202/2022-GP que tem por objeto a construção da Cancha de Bocha com área de 1.073,42 m² localizada na Rua Afonso Pena, esquina com Rua Visconde de Nacar Bairro Anchieta no Município de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

—

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil

CREA-PR 107.389/D

Anexos:

BM_08.pdf
DECLARACAO_NOTA.pdf
ESTADUAL.pdf
FEDERAL.pdf
FGTS.pdf
Laudo.pdf
MUNICIPAL.pdf
NOTA_FISCAL.pdf
Optante_Simples.pdf
Relat_Fotog.pdf
TRABALHISTA.pdf



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.	CANCHA DE BOCHA			2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			57.545,47	80,00	10,00	90,00	46.036,38	5.754,54	51.790,92
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			57.545,47	80,00	10,00	90,00	46.036,38	5.754,54	51.790,92
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES			70.536,30	100,00	-	100,00	70.536,30	-	70.536,30
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,5X3,0M			1.878,35	100,00	-	100,00	1.878,35	-	1.878,35
1.2.0.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018			46.119,18	100,00	-	100,00	46.119,18	-	46.119,18
1.2.0.3.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016			7.684,02	100,00	-	100,00	7.684,02	-	7.684,02
1.2.0.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016			2.051,59	100,00	-	100,00	2.051,59	-	2.051,59
1.2.0.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016			12.803,16	100,00	-	100,00	12.803,16	-	12.803,16
1.3.	LOCAÇÃO DE OBRA			8.429,62	100,00	-	100,00	8.429,62	-	8.429,62
1.3.0.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018			8.429,62	100,00	-	100,00	8.429,62	-	8.429,62
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			6.207,81	100,00	-	100,00	6.207,81	-	6.207,81
1.4.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017			3.120,64	100,00	-	100,00	3.120,64	-	3.120,64
1.4.0.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020			700,81	100,00	-	100,00	700,81	-	700,81
1.4.0.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			1.132,38	100,00	-	100,00	1.132,38	-	1.132,38
1.4.0.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017			1.072,35	100,00	-	100,00	1.072,35	-	1.072,35
1.4.0.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019			181,63	100,00	-	100,00	181,63	-	181,63
1.5.	FUNDAÇÕES			69.765,69	100,00	-	100,00	69.765,69	-	69.765,69
1.5.1.	Estacas			69.765,69	100,00	-	100,00	69.765,69	-	69.765,69
1.5.1.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MPBILIZAÇÃO E DESMPOBILIZAÇÃO)			67.848,39	100,00	-	100,00	67.848,39	-	67.848,39
1.5.1.2.	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021			1.917,30	100,00	-	100,00	1.917,30	-	1.917,30
1.6.	Blocos de Coroamento			78.133,60	100,00	-	100,00	78.133,60	-	78.133,60
1.6.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			406,01	100,00	-	100,00	406,01	-	406,01
1.6.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			4.453,09	100,00	-	100,00	4.453,09	-	4.453,09
1.6.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			16.399,87	100,00	-	100,00	16.399,87	-	16.399,87



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
				Nº MEDIÇÃO 8	

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.6.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			991,98	100,00	-	100,00	991,98	-	991,98
1.6.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			20.478,16	100,00	-	100,00	20.478,16	-	20.478,16
1.6.0.6.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016			35.404,49	100,00	-	100,00	35.404,49	-	35.404,49
1.7.	Viga Baldrame			78.396,88	100,00	-	100,00	78.396,88	-	78.396,88
1.7.0.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			79,72	100,00	-	100,00	79,72	-	79,72
1.7.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			11.664,95	100,00	-	100,00	11.664,95	-	11.664,95
1.7.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			2.290,37	100,00	-	100,00	2.290,37	-	2.290,37
1.7.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			6.547,40	100,00	-	100,00	6.547,40	-	6.547,40
1.7.0.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			40.224,16	100,00	-	100,00	40.224,16	-	40.224,16
1.7.0.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			17.590,28	100,00	-	100,00	17.590,28	-	17.590,28
1.8.	ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO			212.104,56	100,00	-	100,00	212.104,56	-	212.104,56
1.8.1.	Pilares			63.049,83	100,00	-	100,00	63.049,83	-	63.049,83
1.8.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			20.146,54	100,00	-	100,00	20.146,54	-	20.146,54
1.8.1.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			9.826,12	100,00	-	100,00	9.826,12	-	9.826,12
1.8.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			20.665,10	100,00	-	100,00	20.665,10	-	20.665,10
1.8.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			12.412,07	100,00	-	100,00	12.412,07	-	12.412,07
1.8.2.	Vigas			81.333,77	100,00	-	100,00	81.333,77	-	81.333,77
1.8.2.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			33.400,14	100,00	-	100,00	33.400,14	-	33.400,14
1.8.2.2.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÕES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			13.813,59	100,00	-	100,00	13.813,59	-	13.813,59



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA					82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
TOTAL:					2.920.210,92					
1.8.2.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			1.940,97	100,00	-	100,00	1.940,97	-	1.940,97
1.8.2.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			18.154,37	100,00	-	100,00	18.154,37	-	18.154,37
1.8.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			3.300,72	100,00	-	100,00	3.300,72	-	3.300,72
1.8.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			10.723,98	100,00	-	100,00	10.723,98	-	10.723,98
1.8.3.	Lajes/Pisos			67.720,96	100,00	-	100,00	67.720,96	-	67.720,96
1.8.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			4.838,19	100,00	-	100,00	4.838,19	-	4.838,19
1.8.3.2.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÕES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			25.610,30	100,00	-	100,00	25.610,30	-	25.610,30
1.8.3.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			8.577,47	100,00	-	100,00	8.577,47	-	8.577,47
1.8.3.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			22.893,57	100,00	-	100,00	22.893,57	-	22.893,57
1.8.3.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			5.729,86	100,00	-	100,00	5.729,86	-	5.729,86
1.8.3.6.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			71,57	100,00	-	100,00	71,57	-	71,57
1.9.	ESCALADA			19.249,59	-	95,00	95,00	-	18.287,11	18.287,11
1.9.0.1.	ESCALADA METÁLICA CONF. PROJETO, COM UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA E FITAS ATIDERRAPANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			19.249,59	-	95,00	95,00	-	18.287,11	18.287,11
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES			12.112,99	66,03	-	66,03	7.998,25	-	7.998,25
1.10.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018			7.998,25	100,00	-	100,00	7.998,25	-	7.998,25
1.10.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018			4.114,74	-	-	-	-	-	-
1.11.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS			84.914,04	57,25	7,13	64,38	48.612,47	6.052,13	54.664,60



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA						82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
TOTAL:						2.920.210,92					
1.11.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				29.902,57	100,00	-	100,00	29.902,57	-	29.902,57
1.11.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				4.360,95	-	100,00	100,00	-	4.360,95	4.360,95
1.11.0.3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				1.619,68	100,00	-	100,00	1.619,68	-	1.619,68
1.11.0.4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				128,04	100,00	-	100,00	128,04	-	128,04
1.11.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				159,24	100,00	-	100,00	159,24	-	159,24
1.11.0.6.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				1.582,31	100,00	-	100,00	1.582,31	-	1.582,31
1.11.0.7.	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTES A UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA, COM GUIAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				16.911,81	90,00	10,00	100,00	15.220,63	1.691,18	16.911,81
1.11.0.8.	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021				19.694,50	-	-	-	-	-	-
1.11.0.9.	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021				4.507,32	-	-	-	-	-	-
1.11.0.10.	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				6.047,62	-	-	-	-	-	-
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				60.771,91	95,38	4,08	99,46	57.967,03	2.477,34	60.444,37
1.12.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				3.382,25	100,00	-	100,00	3.382,25	-	3.382,25
1.12.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				3.006,45	100,00	-	100,00	3.006,45	-	3.006,45
1.12.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				375,80	100,00	-	100,00	375,80	-	375,80
1.12.2.	Água Fria				10.448,88	88,52	8,35	96,87	9.249,21	872,13	10.121,34
1.12.2.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				4.360,64	80,00	20,00	100,00	3.488,51	872,13	4.360,64
1.12.2.2.	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE POLIETILENO CAPACIDADE 3.000 L TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				3.980,60	100,00	-	100,00	3.980,60	-	3.980,60
1.12.2.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				240,35	100,00	-	100,00	240,35	-	240,35
1.12.2.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				841,47	100,00	-	100,00	841,47	-	841,47
1.12.2.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				94,48	100,00	-	100,00	94,48	-	94,48



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.12.2.6.	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			327,54	-	-	-	-	-	-
1.12.2.7.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60MM (INSTLADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS			163,20	100,00	-	100,00	163,20	-	163,20
1.12.2.8.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75MM (INSTLADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS			440,60	100,00	-	100,00	440,60	-	440,60
1.12.3.	Esgoto			15.490,42	95,55	4,45	100,00	14.801,45	688,97	15.490,42
1.12.3.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015			6.586,32	100,00	-	100,00	6.586,32	-	6.586,32
1.12.3.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015			3.444,84	80,00	20,00	100,00	2.755,87	688,97	3.444,84
1.12.3.3.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014			459,60	100,00	-	100,00	459,60	-	459,60
1.12.3.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015			1.032,88	100,00	-	100,00	1.032,88	-	1.032,88
1.12.3.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015			1.731,91	100,00	-	100,00	1.731,91	-	1.731,91
1.12.3.6.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020			214,70	100,00	-	100,00	214,70	-	214,70
1.12.3.7.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020			2.020,17	100,00	-	100,00	2.020,17	-	2.020,17
1.12.4.	Água Pluvial			31.450,36	97,09	2,91	100,00	30.534,12	916,24	31.450,36
1.12.4.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015			11.511,60	100,00	-	100,00	11.511,60	-	11.511,60





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.12.4.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015			592,75	-	100,00	100,00	-	592,75	592,75
1.12.4.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			988,08	100,00	-	100,00	988,08	-	988,08
1.12.4.4.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015			934,92	100,00	-	100,00	934,92	-	934,92
1.12.4.5.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020			323,49	-	100,00	100,00	-	323,49	323,49
1.12.4.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020			4.692,24	100,00	-	100,00	4.692,24	-	4.692,24
1.12.4.7.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020			1.816,46	100,00	-	100,00	1.816,46	-	1.816,46
1.12.4.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015			3.497,55	100,00	-	100,00	3.497,55	-	3.497,55
1.12.4.9.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM			6.500,11	100,00	-	100,00	6.500,11	-	6.500,11
1.12.4.10.	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			83,01	100,00	-	100,00	83,01	-	83,01
1.12.4.11.	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			510,15	100,00	-	100,00	510,15	-	510,15
1.13.	CISTERNA			28.821,23	96,98	-	96,98	27.951,22	-	27.951,22
1.13.1.	Movimentação de terra			2.674,45	100,00	-	100,00	2.674,45	-	2.674,45
1.13.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017			2.013,78	100,00	-	100,00	2.013,78	-	2.013,78
1.13.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016			660,67	100,00	-	100,00	660,67	-	660,67
1.13.2.	Paredes e pisos			21.200,11	100,00	-	100,00	21.200,11	-	21.200,11
1.13.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017			94,60	100,00	-	100,00	94,60	-	94,60
1.13.2.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF 01/2017			21.105,51	100,00	-	100,00	21.105,51	-	21.105,51
1.13.3.	Impermeabilização e revestimento			1.322,44	100,00	-	100,00	1.322,44	-	1.322,44
1.13.3.1.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021			26,33	100,00	-	100,00	26,33	-	26,33





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.13.3.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018			1.296,11	100,00	-	100,00	1.296,11	-	1.296,11
1.13.4.	Itens cisterna			3.624,23	75,99	-	75,99	2.754,22	-	2.754,22
1.13.4.1.	BOMBA PERIFÉRICA 0,5 CV 127V/220V BPV 375 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			393,29	-	-	-	-	-	-
1.13.4.2.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021			2.660,10	100,00	-	100,00	2.660,10	-	2.660,10
1.13.4.3.	FILTRO DE FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			476,72	-	-	-	-	-	-
1.13.4.4.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CISTERNA D=1,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			94,12	100,00	-	100,00	94,12	-	94,12
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			78.486,15	28,27	68,80	97,07	22.189,11	53.997,63	76.186,74
1.14.1.	Elétrica geral			68.096,44	32,58	64,04	96,62	22.189,11	43.607,92	65.797,03
1.14.1.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			244,97	-	100,00	100,00	-	244,97	244,97
1.14.1.2.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			394,38	-	100,00	100,00	-	394,38	394,38
1.14.1.3.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			407,55	-	-	-	-	-	-
1.14.1.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			136,20	-	-	-	-	-	-
1.14.1.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			71,42	-	-	-	-	-	-
1.14.1.6.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			658,23	-	100,00	100,00	-	658,23	658,23
1.14.1.7.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			35,79	-	100,00	100,00	-	35,79	35,79
1.14.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			31,28	-	-	-	-	-	-
1.14.1.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			46,92	-	-	-	-	-	-
1.14.1.10.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			22,23	-	-	-	-	-	-
1.14.1.11.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			285,68	-	-	-	-	-	-
1.14.1.12.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			298,40	-	-	-	-	-	-
1.14.1.13.	LÂMPADA LED COMPACTA 12W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			186,00	-	100,00	100,00	-	186,00	186,00
1.14.1.14.	PLACA 2X4" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES RETANGULAR COM 1 FUNÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			383,80	-	-	-	-	-	-
1.14.1.15.	PLACA CEGA 2X4" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			82,24	-	-	-	-	-	-
1.14.1.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			4.597,30	100,00	-	100,00	4.597,30	-	4.597,30
1.14.1.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			205,38	-	100,00	100,00	-	205,38	205,38





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA											
TOTAL:					2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.14.1.18.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				96,06	-	100,00	100,00	-	96,06	96,06
1.14.1.19.	ENTRADA DE ENERGIA POLIFÁSICO 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2.311,44	-	100,00	100,00	-	2.311,44	2.311,44
1.14.1.20.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 44 DISJUNTORES DIN, 150 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.450,16	-	100,00	100,00	-	1.450,16	1.450,16
1.14.1.21.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				473,04	-	100,00	100,00	-	473,04	473,04
1.14.1.22.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				7.708,80	-	100,00	100,00	-	7.708,80	7.708,80
1.14.1.23.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				2.136,78	-	100,00	100,00	-	2.136,78	2.136,78
1.14.1.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				4.324,80	-	100,00	100,00	-	4.324,80	4.324,80
1.14.1.25.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				1.101,00	-	100,00	100,00	-	1.101,00	1.101,00
1.14.1.26.	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 30 X 30 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)				483,66	-	100,00	100,00	-	483,66	483,66
1.14.1.27.	PLACA 2"x4" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES PARA 3 FUNÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				11,00	-	-	-	-	-	-
1.14.1.28.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				60,23	-	-	-	-	-	-
1.14.1.29.	ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO GERAL E DE ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.166,73	-	100,00	100,00	-	3.166,73	3.166,73
1.14.1.30.	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				462,46	-	-	-	-	-	-
1.14.1.31.	LÂMPADA LED COMPACTA 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				968,32	-	100,00	100,00	-	968,32	968,32
1.14.1.32.	LÂMPADA LED COMPACTA 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				4.749,24	-	100,00	100,00	-	4.749,24	4.749,24
1.14.1.33.	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC PESADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.156,80	-	100,00	100,00	-	1.156,80	1.156,80
1.14.1.34.	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100 MM CHAPA N 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				7.582,33	70,00	30,00	100,00	5.307,63	2.274,70	7.582,33
1.14.1.35.	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50 MM CHAPA N 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				11.885,80	80,00	20,00	100,00	9.508,64	2.377,16	11.885,80
1.14.1.36.	TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				500,00	-	100,00	100,00	-	500,00	500,00
1.14.1.37.	TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.811,00	-	100,00	100,00	-	1.811,00	1.811,00
1.14.1.38.	TAMPA DE PRESSÃO 100MM PARA ELETROCALHA CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.073,88	-	100,00	100,00	-	1.073,88	1.073,88





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.14.1.39.	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			3.025,72	-	100,00	100,00	-	3.025,72	3.025,72
1.14.1.40.	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 70X81MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.490,96	80,00	20,00	100,00	1.992,77	498,19	2.490,96
1.14.1.41.	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 120X146 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			978,46	80,00	20,00	100,00	782,77	195,69	978,46
1.14.2.	Instalação elétrica para SPDA			10.389,71	-	100,00	100,00	-	10.389,71	10.389,71
1.14.2.1.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017			741,15	-	100,00	100,00	-	741,15	741,15
1.14.2.2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P			441,60	-	100,00	100,00	-	441,60	441,60
1.14.2.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020			433,80	-	100,00	100,00	-	433,80	433,80
1.14.2.4.	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			205,92	-	100,00	100,00	-	205,92	205,92
1.14.2.5.	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			8.251,25	-	100,00	100,00	-	8.251,25	8.251,25
1.14.2.6.	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			208,44	-	100,00	100,00	-	208,44	208,44
1.14.2.7.	ACESSÓRIOS PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			107,55	-	100,00	100,00	-	107,55	107,55
1.15.	ELÉTRICA CISTERNA			843,42	-	100,00	100,00	-	843,42	843,42
1.15.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			536,40	-	100,00	100,00	-	536,40	536,40
1.15.0.2.	CAIXA DE PASSAGEM / EMBUTIR NO PISO / 20X20X20CM			235,60	-	100,00	100,00	-	235,60	235,60
1.15.0.3.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			71,42	-	100,00	100,00	-	71,42	71,42
1.16.	COBERTURA			1.336.347,06	98,72	1,28	100,00	1.319.256,58	17.090,48	1.336.347,06
1.16.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			307.406,88	100,00	-	100,00	307.406,88	-	307.406,88
1.16.0.2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			21.623,82	80,00	20,00	100,00	17.299,06	4.324,76	21.623,82
1.16.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			24.682,90	100,00	-	100,00	24.682,90	-	24.682,90
1.16.0.4.	ESTRUTURA EM PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR PARA REVESTIMENTO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			255.314,42	95,00	5,00	100,00	242.548,70	12.765,72	255.314,42
1.16.0.5.	ESTRUTURA METÁLICA COR BRANCO COM MEIA TESOURA DE VÃO DE 5 METROS COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			727.319,04	100,00	-	100,00	727.319,04	-	727.319,04
1.17.	REVESTIMENTO			305.969,50	39,30	21,86	61,15	120.232,72	66.870,41	187.103,13
1.17.1.	Paredes Internas			40.799,70	61,76	33,66	95,42	25.199,74	13.732,95	38.932,69
1.17.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			1.507,94	100,00	-	100,00	1.507,94	-	1.507,94



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento Cancha de Bocha	Início de Obra 24/08/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Período da Medição 22/06/2023 a 10/08/2023
				Nº Medição 8	

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.17.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014			1.402,76	-	100,00	100,00	-	1.402,76	1.402,76
1.17.1.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			21.580,07	100,00	-	100,00	21.580,07	-	21.580,07
1.17.1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014			3.016,76	70,00	30,00	100,00	2.111,73	905,03	3.016,76
1.17.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM DRYWALL PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			3.957,14	-	100,00	100,00	-	3.957,14	3.957,14
1.17.1.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM DRYWALL PARA AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 5M² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			9.335,03	-	80,00	80,00	-	7.468,02	7.468,02
1.17.2.	Paredes Externas			23.614,46	100,00	-	100,00	23.614,46	-	23.614,46
1.17.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			3.271,47	100,00	-	100,00	3.271,47	-	3.271,47
1.17.2.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			20.342,99	100,00	-	100,00	20.342,99	-	20.342,99
1.17.3.	Pisos			97.317,59	63,60	14,50	78,09	61.890,42	14.107,71	75.998,13
1.17.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			2.784,85	100,00	-	100,00	2.784,85	-	2.784,85
1.17.3.2.	PISO EM CONCRETO, FCK 30 MPA, COM TELA DE AÇO NERVURADA 15X15CM, DIÂMETRO DO FIO= 4,2MM - ESP=7CM			1.846,35	100,00	-	100,00	1.846,35	-	1.846,35
1.17.3.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			16.175,73	-	-	-	-	-	-
1.17.3.4.	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021			3.771,62	100,00	-	100,00	3.771,62	-	3.771,62
1.17.3.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014			19.620,01	100,00	-	100,00	19.620,01	-	19.620,01
1.17.3.6.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)			37.320,64	75,00	25,00	100,00	27.990,48	9.330,16	37.320,64
1.17.3.7.	PISO DRENANTE PAVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			5.143,73	-	-	-	-	-	-
1.17.3.8.	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM			3.995,60	70,00	30,00	100,00	2.796,92	1.198,68	3.995,60





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.17.3.9.	RODAPÉ DE PORCELANATO ALTURA 7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.982,95	-	100,00	100,00	-	2.982,95	2.982,95
1.17.3.10.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			595,92	-	100,00	100,00	-	595,92	595,92
1.17.3.11.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020			3.080,19	100,00	-	100,00	3.080,19	-	3.080,19
1.17.4.	Forro e Teto			5.547,02	100,00	-	100,00	5.547,02	-	5.547,02
1.17.4.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			858,12	100,00	-	100,00	858,12	-	858,12
1.17.4.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015			4.688,90	100,00	-	100,00	4.688,90	-	4.688,90
1.17.5.	Pista de Bocha			138.690,73	2,87	28,14	31,01	3.981,08	39.029,75	43.010,83
1.17.5.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			264,41	100,00	-	100,00	264,41	-	264,41
1.17.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			2.434,35	100,00	-	100,00	2.434,35	-	2.434,35
1.17.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			1.009,97	100,00	-	100,00	1.009,97	-	1.009,97
1.17.5.4.	SAIBRO GRADUADO/ PENEIRADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO			2.117,68	-	90,00	90,00	-	1.905,91	1.905,91
1.17.5.5.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017			272,35	100,00	-	100,00	272,35	-	272,35
1.17.5.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018			36.421,33	-	-	-	-	-	-
1.17.5.7.	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020			45.651,60	-	-	-	-	-	-
1.17.5.8.	TÁBUA DE MADEIRA PINUS 2,5x30CM PARA CERCA EM VOLTA DA CANCHA DE BOCHA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			50.519,04	-	73,48	73,48	-	37.123,84	37.123,84
1.18.	ESQUADRIAS			267.060,64	82,78	5,91	88,69	221.065,81	15.777,82	236.843,63
1.18.1.	Janelas			230.303,18	95,99	1,77	97,76	221.065,81	4.071,17	225.136,98
1.18.1.1.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			18.684,96	85,00	15,00	100,00	15.882,22	2.802,74	18.684,96
1.18.1.2.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			3.030,27	100,00	-	100,00	3.030,27	-	3.030,27
1.18.1.3.	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			1.268,43	-	100,00	100,00	-	1.268,43	1.268,43
1.18.1.4.	MOLDURA PARA JANELAS 80X80CM, EM MADEIRA MACIÇA			2.728,42	-	-	-	-	-	-
1.18.1.5.	MOLDURA PARA JANELA EM GRANITO 1,5X1,2M			618,84	-	-	-	-	-	-
1.18.1.6.	MOLDURA PARA JANELAS 2X1,2M, EM MADEIRA MACIÇA			1.818,94	-	-	-	-	-	-
1.18.1.7.	JANELA VENEZIANA FIXA 1,10X1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			202.153,32	100,00	-	100,00	202.153,32	-	202.153,32
1.18.2.	Portas			34.345,09	-	34,09	34,09	-	11.706,65	11.706,65



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:					82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.18.2.1.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			845,31	-	-	-	-	-	-
1.18.2.2.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			1.531,94	-	-	-	-	-	-
1.18.2.3.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			4.454,58	-	-	-	-	-	-
1.18.2.4.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			6.037,16	-	100,00	100,00	-	6.037,16	6.037,16
1.18.2.5.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			10.980,61	-	-	-	-	-	-
1.18.2.6.	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, COM GUARNICAO 0,8 X 2,10M			1.671,78	-	100,00	100,00	-	1.671,78	1.671,78
1.18.2.7.	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NÚMERO 24			1.347,07	-	-	-	-	-	-
1.18.2.8.	PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 2 FOLHAS COM ALUMÍNIO BRANCO 2,20X2,10			3.997,71	-	100,00	100,00	-	3.997,71	3.997,71
1.18.2.9.	PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,8X2,10M COR BRANCO			2.258,25	-	-	-	-	-	-
1.18.2.10.	BOX DE VIDRO TEMPERADO 1,20X1,90M - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO			1.220,68	-	-	-	-	-	-
1.18.3.	Fechaduras e Puxadores			2.412,37	-	-	-	-	-	-
1.18.3.1.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			1.143,67	-	-	-	-	-	-
1.18.3.2.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			888,20	-	-	-	-	-	-
1.18.3.3.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			380,50	-	-	-	-	-	-
1.19.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			30.357,65	-	6,50	6,50	-	1.973,91	1.973,91
1.19.0.1.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			1.545,20	-	-	-	-	-	-
1.19.0.2.	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)			156,64	-	-	-	-	-	-
1.19.0.3.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			383,12	-	-	-	-	-	-





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA					82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
TOTAL:										
1.19.0.4.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			780,84	-	-	-	-	-	-
1.19.0.5.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			910,10	-	-	-	-	-	-
1.19.0.6.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			345,92	-	-	-	-	-	-
1.19.0.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			420,08	-	-	-	-	-	-
1.19.0.8.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020			495,74	-	-	-	-	-	-
-	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO			-	-	-	-	-	-	-
-	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO			-	-	-	-	-	-	-
1.19.0.9.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2.342,64	-	-	-	-	-	-
1.19.0.10.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			4.688,11	-	-	-	-	-	-
1.19.0.11.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2.306,37	-	-	-	-	-	-
1.19.0.12.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			461,20	-	-	-	-	-	-
1.19.0.13.	BANCADA DE GRANITO PARA BANHEIRO 2,5X 0,6M, COM 4 CUBAS 35X50CM, FLEXÍVEIS E SIFÃOS			6.034,10	-	-	-	-	-	-
1.19.0.14.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			441,44	-	-	-	-	-	-
1.19.0.15.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			440,70	-	100,00	100,00	-	440,70	440,70
1.19.0.16.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			808,60	-	-	-	-	-	-
1.19.0.17.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			6.263,64	-	-	-	-	-	-
1.19.0.18.	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			845,55	-	100,00	100,00	-	845,55	845,55
1.19.0.19.	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			252,63	-	100,00	100,00	-	252,63	252,63
1.19.0.20.	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			113,19	-	100,00	100,00	-	113,19	113,19





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
				Nº MEDIÇÃO 8	

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.19.0.21.	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			321,84	-	100,00	100,00	-	321,84	321,84
1.20.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO			17.446,83	-	70,00	70,00	-	12.212,78	12.212,78
1.20.0.1.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P			1.273,31	-	70,00	70,00	-	891,32	891,32
1.20.0.2.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P			16.173,52	-	70,00	70,00	-	11.321,46	11.321,46
1.21.	PINTURA			28.654,46	32,02	65,78	97,80	9.173,78	18.849,34	28.023,12
1.21.1.	Parede Internas			16.810,89	20,77	79,23	100,00	3.491,68	13.319,21	16.810,89
1.21.1.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			1.332,25	100,00	-	100,00	1.332,25	-	1.332,25
1.21.1.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			8.637,71	25,00	75,00	100,00	2.159,43	6.478,28	8.637,71
1.21.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			6.840,93	-	100,00	100,00	-	6.840,93	6.840,93
1.21.2.	Parede Externa			6.313,44	90,00	-	90,00	5.682,10	-	5.682,10
1.21.2.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			915,25	90,00	-	90,00	823,73	-	823,73
1.21.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014			5.398,19	90,00	-	90,00	4.858,37	-	4.858,37
1.21.3.	Teto			5.530,13	-	100,00	100,00	-	5.530,13	5.530,13
1.21.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			351,59	-	100,00	100,00	-	351,59	351,59
1.21.3.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			3.401,71	-	100,00	100,00	-	3.401,71	3.401,71
1.21.3.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			1.776,83	-	100,00	100,00	-	1.776,83	1.776,83
1.22.	Equipamento PPCIP			8.286,31	-	35,93	35,93	-	2.977,39	2.977,39
1.22.0.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P			198,76	-	-	-	-	-	-
1.22.0.2.	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 2A-20B:C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.020,35	-	-	-	-	-	-
1.22.0.3.	FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			956,26	-	-	-	-	-	-
1.22.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 13X26 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			120,90	-	-	-	-	-	-
1.22.0.5.	PLACA DE CAPACIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO (M2) 78X45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			76,75	-	-	-	-	-	-
1.22.0.6.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			121,08	-	-	-	-	-	-
1.22.0.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 15 X 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			208,24	-	-	-	-	-	-
1.22.0.8.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 30X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			749,58	-	-	-	-	-	-
1.22.0.9.	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES COR BRANCA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.658,78	-	100,00	100,00	-	1.658,78	1.658,78





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.22.0.10.	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA COR BRANCA PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.318,61	-	100,00	100,00	-	1.318,61	1.318,61
1.22.0.11.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM FAROLETE 2X55W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.373,35	-	-	-	-	-	-
1.22.0.12.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *28,5 X 57* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)			137,64	-	-	-	-	-	-
1.22.0.13.	ABRIGO PARA EXTINTOR 75x30x25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			311,60	-	-	-	-	-	-
1.22.0.14.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 38X19 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			34,41	-	-	-	-	-	-
1.23.	GLP			22.332,18	76,73	-	76,73	17.135,70	-	17.135,70
1.23.1.	Serviços preliminares			1.173,03	100,00	-	100,00	1.173,03	-	1.173,03
1.23.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019			0,45	100,00	-	100,00	0,45	-	0,45
1.23.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018			433,49	100,00	-	100,00	433,49	-	433,49
1.23.1.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			739,09	100,00	-	100,00	739,09	-	739,09
1.23.2.	Movimentação de terra			225,95	100,00	-	100,00	225,95	-	225,95
1.23.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			202,86	100,00	-	100,00	202,86	-	202,86
1.23.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			23,09	100,00	-	100,00	23,09	-	23,09
1.23.3.	Fundações			330,23	100,00	-	100,00	330,23	-	330,23
1.23.3.1.	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK=30 MPA, COM USO DE FORMAR EM MADEIRA SERRADA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 10MM			330,23	100,00	-	100,00	330,23	-	330,23
1.23.4.	Pilares			1.748,94	100,00	-	100,00	1.748,94	-	1.748,94
1.23.4.1.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			140,91	100,00	-	100,00	140,91	-	140,91
1.23.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			409,22	100,00	-	100,00	409,22	-	409,22
1.23.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			172,30	100,00	-	100,00	172,30	-	172,30
1.23.4.4.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			1.026,51	100,00	-	100,00	1.026,51	-	1.026,51
1.23.5.	Vigas			4.601,87	100,00	-	100,00	4.601,87	-	4.601,87



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento CANCHA DE BOCHA	Início de Obra 24/08/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Período da Medição 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº Medição 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.23.5.1.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015			274,63	100,00	-	100,00	274,63	-	274,63
1.23.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			100,10	100,00	-	100,00	100,10	-	100,10
1.23.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			375,79	100,00	-	100,00	375,79	-	375,79
1.23.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			329,33	100,00	-	100,00	329,33	-	329,33
1.23.5.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020			3.522,02	100,00	-	100,00	3.522,02	-	3.522,02
1.23.6.	Laje			747,82	100,00	-	100,00	747,82	-	747,82
1.23.6.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020			578,16	100,00	-	100,00	578,16	-	578,16
1.23.6.2.	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 10/2021			96,60	100,00	-	100,00	96,60	-	96,60
1.23.6.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015			73,06	100,00	-	100,00	73,06	-	73,06
1.23.7.	Alvenaria			667,26	100,00	-	100,00	667,26	-	667,26
1.23.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021			667,26	100,00	-	100,00	667,26	-	667,26
1.23.8.	Impermeabilização			565,97	-	-	-	-	-	-
1.23.8.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018			525,00	-	-	-	-	-	-
1.23.8.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018			40,97	-	-	-	-	-	-
1.23.9.	Esquadrias			4.575,72	-	-	-	-	-	-
1.23.9.1.	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA			3.107,53	-	-	-	-	-	-
1.23.9.2.	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019			1.468,19	-	-	-	-	-	-
1.23.10.	Tubos e conexões			3.299,55	98,34	-	98,34	3.244,76	-	3.244,76
1.23.10.1.	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016			258,84	100,00	-	100,00	258,84	-	258,84
1.23.10.2.	KIT CENTRAL DE GÁS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			498,60	100,00	-	100,00	498,60	-	498,60





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANCHA DE BOCHA	INÍCIO DE OBRA 24/08/22
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 22/06/2023 a 10/08/2023
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA										
TOTAL:				2.920.210,92	82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.23.10.3.	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			54,79	-	-	-	-	-	-
1.23.10.4.	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.259,54	100,00	-	100,00	2.259,54	-	2.259,54
1.23.10.5.	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS DE COZINHA SEGUNDO ESTÁGIO, 2KG/H 2,8KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			50,15	100,00	-	100,00	50,15	-	50,15
1.23.10.6.	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS DE COZINHA PRIMEIRO ESTÁGIO, 2KG/H 2,8KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			50,15	100,00	-	100,00	50,15	-	50,15
1.23.10.7.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			127,48	100,00	-	100,00	127,48	-	127,48
1.23.11.	Revestimento			2.201,24	100,00	-	100,00	2.201,24	-	2.201,24
1.23.11.1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			1.896,29	100,00	-	100,00	1.896,29	-	1.896,29
1.23.11.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			304,95	100,00	-	100,00	304,95	-	304,95
1.23.12.	Pintura			2.194,60	100,00	-	100,00	2.194,60	-	2.194,60
1.23.12.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			96,37	100,00	-	100,00	96,37	-	96,37
1.23.12.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017			1.082,56	100,00	-	100,00	1.082,56	-	1.082,56
1.23.12.3.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016			451,09	100,00	-	100,00	451,09	-	451,09
1.23.12.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016			564,58	100,00	-	100,00	564,58	-	564,58
1.24.	SERVIÇOS FINAIS			1.523,39	-	-	-	-	-	-
1.24.0.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019			332,06	-	-	-	-	-	-
1.24.0.2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019			203,49	-	-	-	-	-	-
1.24.0.3.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019			987,84	-	-	-	-	-	-
1.25.	PLANTIO DE GRAMA NA ÁREA EXTERNA			14.852,32	-	-	-	-	-	-
1.25.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			14.852,32	-	-	-	-	-	-
1.26.	PASSEIO PÚBLICO			21.061,32	-	70,64	70,64	-	14.878,32	14.878,32
1.26.0.1.	RETIRADA DE CALÇADA EXISTENTE EM LAJOTAS DE CONCRETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL			6.800,71	-	100,00	100,00	-	6.800,71	6.800,71
1.26.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			3.246,64	-	100,00	100,00	-	3.246,64	3.246,64
1.26.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			4.391,61	-	100,00	100,00	-	4.391,61	4.391,61
1.26.0.4.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			1.007,00	-	-	-	-	-	-





BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento CANCHA DE BOCHA	Início de Obra 24/08/22
Nº CTEF 0	Empresa Executora BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 07.830.558/0001	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 8

Realizado Acumulado: 91,06%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CANCHA DE BOCHA						82,91	8,15	91,06	2.421.193,51	238.042,62	2.659.236,13
1.26.0.5.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016				5.176,00	-	-	-	-	-	-
1.26.0.6.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE				439,36	-	100,00	100,00	-	439,36	439,36

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR

Local

quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: CREA-PR 107.389/D

ART/RRT: 0



Declaração para Dispensa da Retenção de INSS.

A/C Setor Financeiro / Contábil

Município de Pato Branco, com sede na Rua Caramuru, 271, centro, inscrita no CNPJ sob nº 76.995.448\0001-54

Brava Construções Ltda., com sede na Rua Lirio Salvador Martarello, 350, Bairro Industrial, na Cidade de Vitorino -PR, inscrita no CNPJ sob 07.830.558\0001-43

DECLARA à Prefeitura de Pato Branco, já qualificada, para fins de não retenção de INSS que trata a IN RFB 2110/2022, tendo como base a IN RFB 2110/2022, Art. 114, VII. Segue:

" Art. 114. Não se aplica a retenção de que trata o art. 110 à contratação de serviços:

VII - por órgãos públicos da administração direta, autarquias e fundações de direito público, quando contratantes de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, por meio de empreitada total, observado o disposto no inciso II do § 2º do art. 135. "

Cabe Salientar que Obras a Preço Unitário recebe tratamento de empreitada Global, conforme IN RFB 2021/2021, Art. 7, § 1º, III, Segue:

"Art. 7º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:

§ 1º Considera-se ainda empreitada total:

III - a empreitada por preço unitário e a tarefa cuja contratação atenda aos requisitos definidos no art. 158 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009."

Declaramos ainda que:

I – A Brava Construções Ltda. preenche os requisitos necessários

II - Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

III - Apresenta anualmente ECD (Escrita Contábil Digital) e ECF (Escrita Contábil Fiscal) em conformidade com os dispostos em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumi o compromisso de informar à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual alteração que constatar na legislação vigente a qual tomou como base para não retenção.

Informamos também que a CNO (Cadastro Nacional de Obras) foi aberta pela Brava Construção Ltda. , o que constata que a obra se trata de empreita total, caso contrário a instituição Prefeitura de Pato Branco, deveria ter aberto e repassado a empresa para que alocar seus funcionários, porém sem responsabilidade de regularização, a qual consta no contrato referente a obra, tendo como base legal a IN 2021/2021.

Diante do exposto requeremos a não retenção de INSS.

07.830.558/0001 43
BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA
RUA LIRIO SALVADOR MANTARELLO, 350
INDUSTRIAL - CEP 85.520-000
VITORINO PR

Vitorino – PR, 10/08/23

Assinatura do responsável



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030354973-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.830.558/0001-43**

Nome: **BRAVA CONSTRUCOES LTDA -ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/08/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRAVA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.830.558/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:41:45 do dia 16/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2023.

Código de controle da certidão: **6FC0.91DB.386B.0A9F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.830.558/0001-43
Razão Social: BRAVA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: RUA LIRIO SALVADOR MARTARELLO 350 / INDUSTRIAL / VITORINO / PR / 85520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2023 a 25/08/2023

Certificação Número: 2023072705575579214263

Informação obtida em 27/07/2023 15:25:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Pato Branco, 10 de Agosto de 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

DANIEL PARCIANELLO
Secretário de Engenharia e Obras

BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 07.830.558/0001-43
Contrato nº 202/2022/GP

Construção da Cancha de Bocha com área de 1.073,42 m²
localizada na Rua Afonso Pena, esquina com Rua Visconde de Nacar Bairro Anchieta no Município de
Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CONTRATO	100%		2.920.210,92	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar em 19/10/2022	8,59%	250.751,47	91,41%	R\$ 2.669.459,45
A liberar em 21/11/2022	3,04%	88.676,85	88,38%	R\$ 2.580.782,60
A liberar em 13/12/2022	4,34%	126.622,15	84,04%	R\$ 2.454.160,45
A liberar em 13/02/2023	5,02%	146.624,79	79,02%	R\$ 2.307.535,66
A liberar em 15/03/2023	17,88%	522.161,16	61,14%	R\$ 1.785.374,50
A liberar em 26/04/2023	27,06%	790.316,38	34,07%	R\$ 995.058,12
A liberar em 21/06/2023	16,99%	496.040,71	17,09%	R\$ 499.017,41
A liberar em 10/08/2023	8,15%	238.042,62	8,94%	R\$ 260.974,90

Valor a ser liberado	R\$ 238.042,62
----------------------	----------------

Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, recebimento de obras, materiais e produtos,
serviços de Engenharia e mão de obra (Decreto Nº 8.303 de 04/05/2018)

Fernanda Zianni Manarim

Férias
Jorge Eduardo Chioqueta

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 07830558000143

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 6563 - BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: Rua LIRIO SALVADOR MARTARELLO, 350 - Bairro INDUSTRIAL - CEP 85.520-000

Código de Controle

CWBWRLINU9LASI41

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.vitorino.pr.gov.br/>

Vitorino (PR), 26 de Junho de 2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		Número do RPS	Número da nota 454								
		Data da emissão da nota 10/08/2023 10:20:14									
		Data do fato gerador 10/08/2023 10:20:14									
		Código de verificação JPZ8OCOGP									
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome fantasia: BRAVA Nome/Razão social: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07.830.558/0001-43 Inscrição municipal: 4727 Inscrição estadual: 9058624648 Endereço: R LIRIO SALVADOR MARTARELLO Número: 350 Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85520-000 Telefone: (46) 3224-2620 Complemento: Município: Vitorino UF: PR E-mail: guilherme@brava.eng.br Site:											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome fantasia: PATO BRANCO PREFEITURA Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: R CARAMURU Número: 271 Bairro: Centro CEP: 85501-064 Complemento: Município: Pato Branco UF: PR E-mail: Telefone: Celular:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
		Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	Valor do serviço					
Nota fiscal referente a 8 medição do contrato 202\2022\GP Referente a construção da Cancha de Bocha com área de 1.073, 42 m sendo : Valor do Material : R\$ 178.531, 96 Valor da Mão de Obra: R\$ 59.510, 66 Valor Total da Nota: R\$ 238.042, 62 Empresa optante pelo simples nacional, não retém IRF , conforme artigo 1 da instrução normativa SRF 765, 02 de agosto de 2007. Empenho : 016444/2022 Dados Bancários: Banco do Brasil Agência : 0495-2 Conta Corrente : 57802-9 Titular: Brava Construções Ltda- ME C.N.P.J : 07.830.558/0001-43 Obs: Dispensa de retenção de INSS, conforme IN 2110/2022, seção IV, Art. 114, Item VII; INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 Seção IV Do Casos não Sujeitos à Retenção Art. 114. Não se aplica a retenção de que trata o art. 110 à contratação de serviços: VII - por órgãos públicos da administração direta, autarquias e fundações de direito público, quando contratantes de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, por meio de empreitada total, observado o disposto no inciso II do § 2º do art. 135.		238.042,6200	1,0000	238.042,6200	59.510,66x2,00 =	1.190,11					
Forma de Pagamento											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	236.852,41								
RETENÇÕES FEDERAIS											
PIS/PASEP R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IR R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 238.042,62				Valor líquido = R\$ 236.852,41				Crédito tributário = R\$ 0,00			
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços que fica sujeito ao ICMS).											
Desc. condicionado(R\$) 0,00		Desc. incondicionado(R\$) 0,00		Deduções(R\$) 178.531,96		Base de cálculo(R\$) 59.510,66		Valor ISS(R\$) 1.190,21			

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA ZOCHE e ALEXANDRE ZOCHE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.pato Branco.1doc.com.br/verificacao/BA35-7427-FC95-7039 e informe o código BA35-7427-FC95-7039

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	Número do RPS	Número da nota 454
	Data da emissão da nota 10/08/2023 10:20:14	
	Data do fato gerador 10/08/2023 10:20:14	
	Código de verificação JPZ8OCOGP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: BRAVA Nome/Razão social: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07.830.558/0001-43 Inscrição municipal: 4727 Inscrição estadual: 9058624648 Endereço: R LIRIO SALVADOR MARTARELLO Número: 350 Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85520-000 Telefone: (46) 3224-2620 Complemento: Município: Vitorino UF: PR E-mail: guilherme@brava.eng.br Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: PATO BRANCO PREFEITURA Nome/Razão social: MUNICIPIO DE PATO BRANCO CPF/CNPJ: 76.995.448/0001-54 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: R CARAMURU Número: 271 Bairro: Centro CEP: 85501-064 Complemento: Município: Pato Branco UF: PR E-mail: Telefone: Celular:		
TRIBUTAÇÃO DO ISSQN		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Pato Branco		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI Nº 1479/2015. A autenticidade desse documento fiscal pode ser consultado no site: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2% Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.004,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.356,62 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.830.558/0001-43**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BRAVA CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



**Construção da Cancha de Bocha com área de 1.073,42 m²,
localizada na Rua Afonso Pena, esquina com Rua Visconde de
Nacar Bairro Anchieta no Município de Pato Branco, atendendo
as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**


CONTRATO Nº202/2022/GP



Relatório de Medição nº 08


Empresa Contratada: BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA


Responsável: Thiago Ferreira dos Santos


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a oitava medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

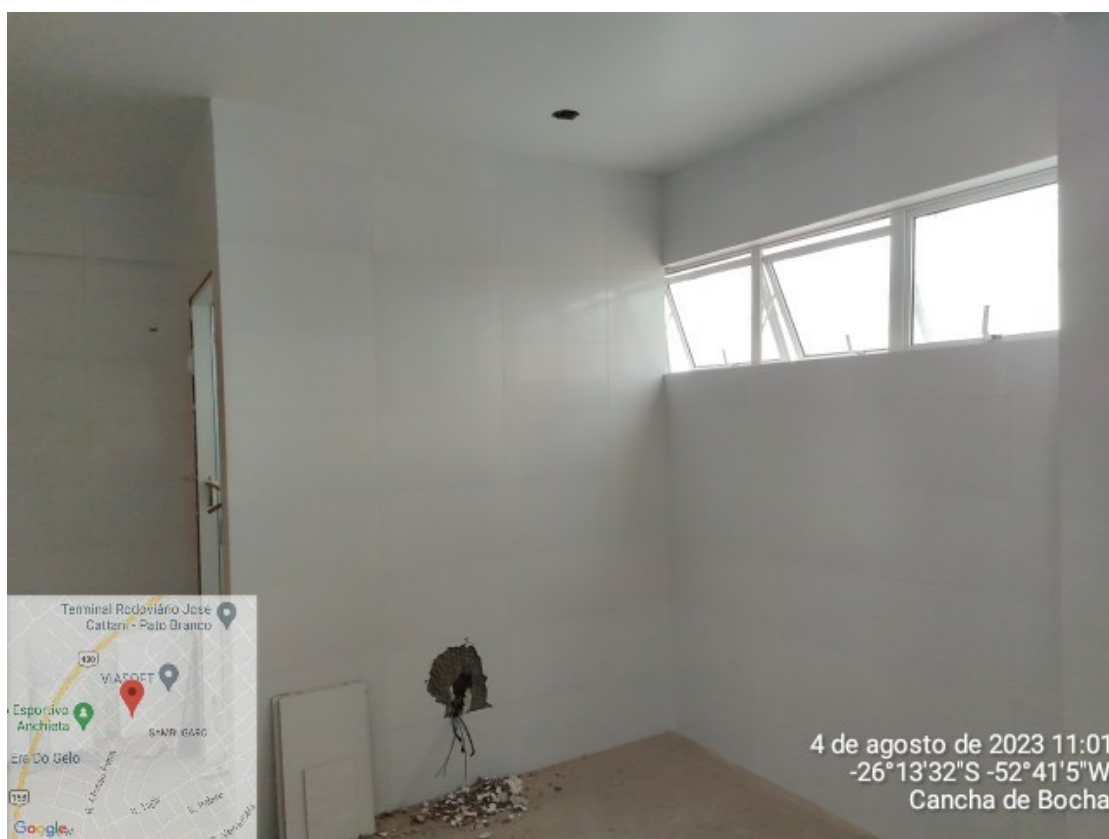


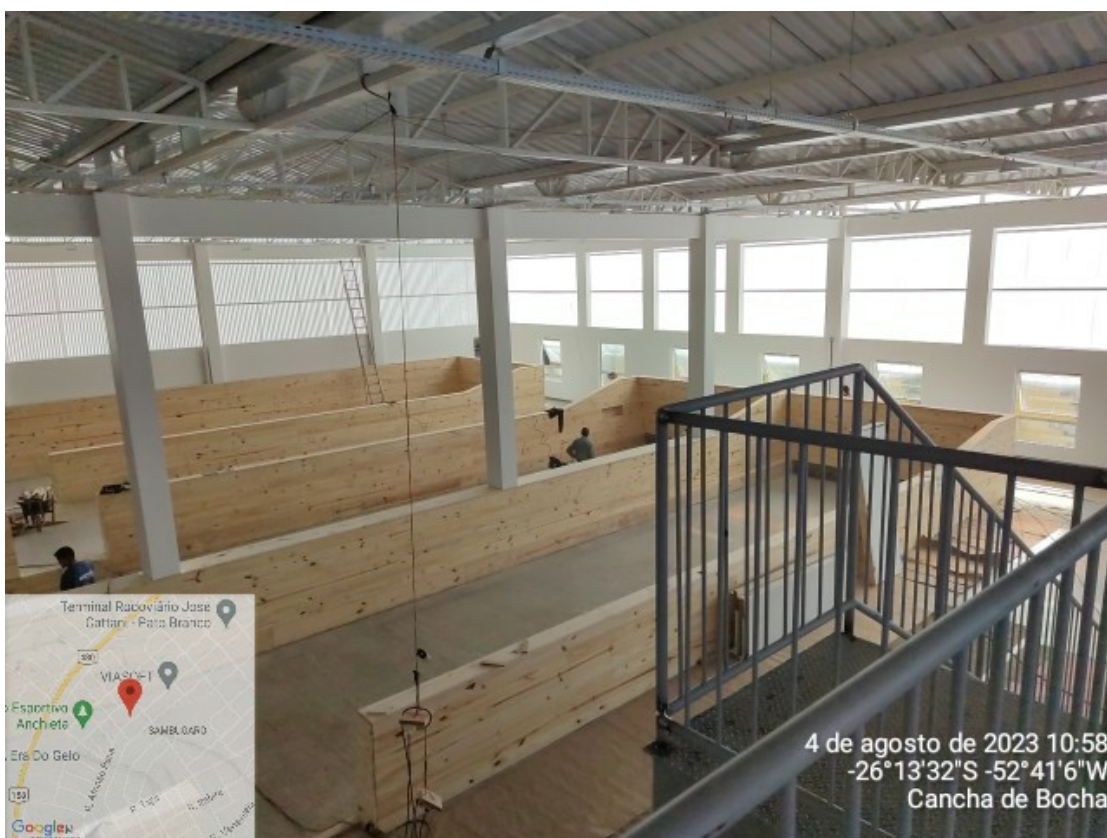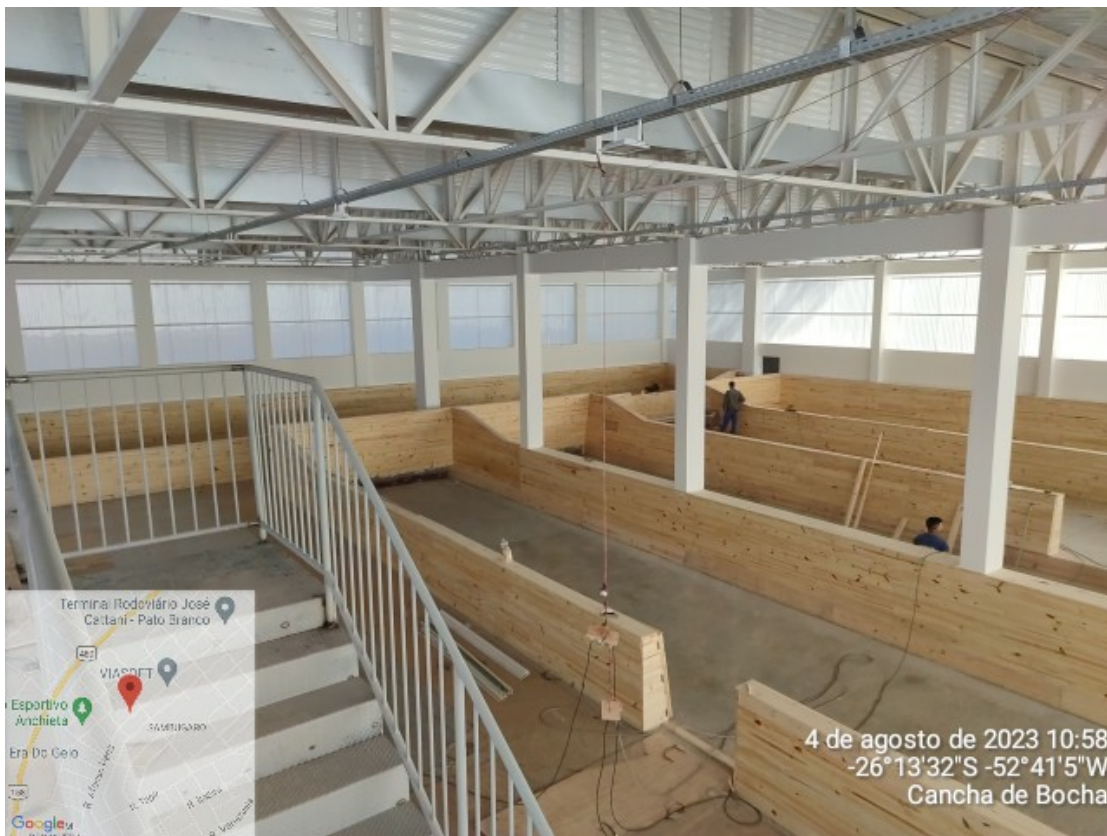

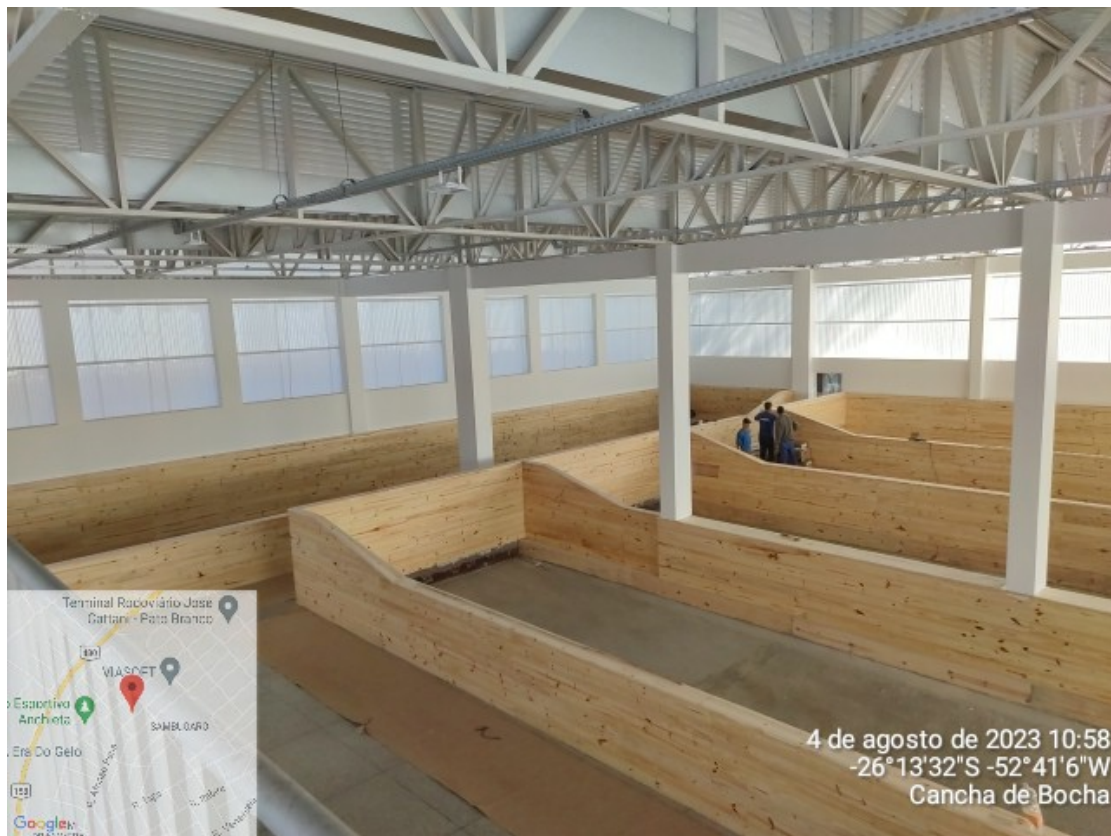


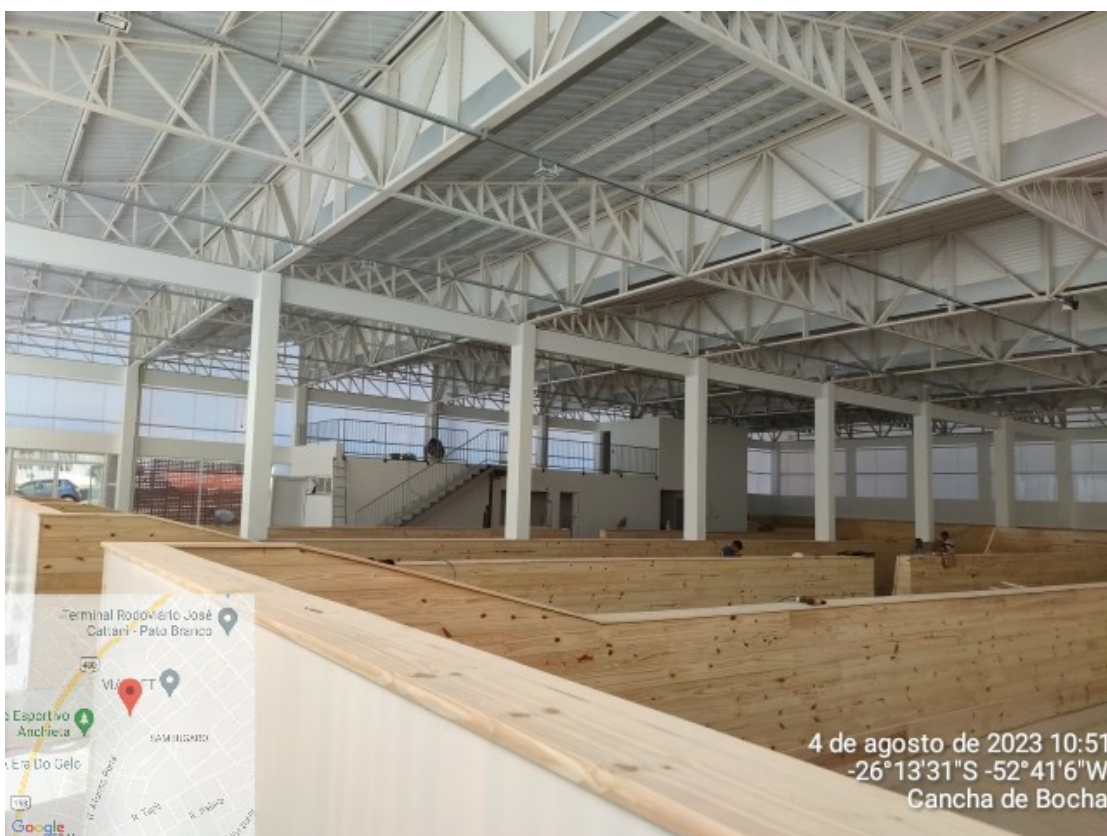

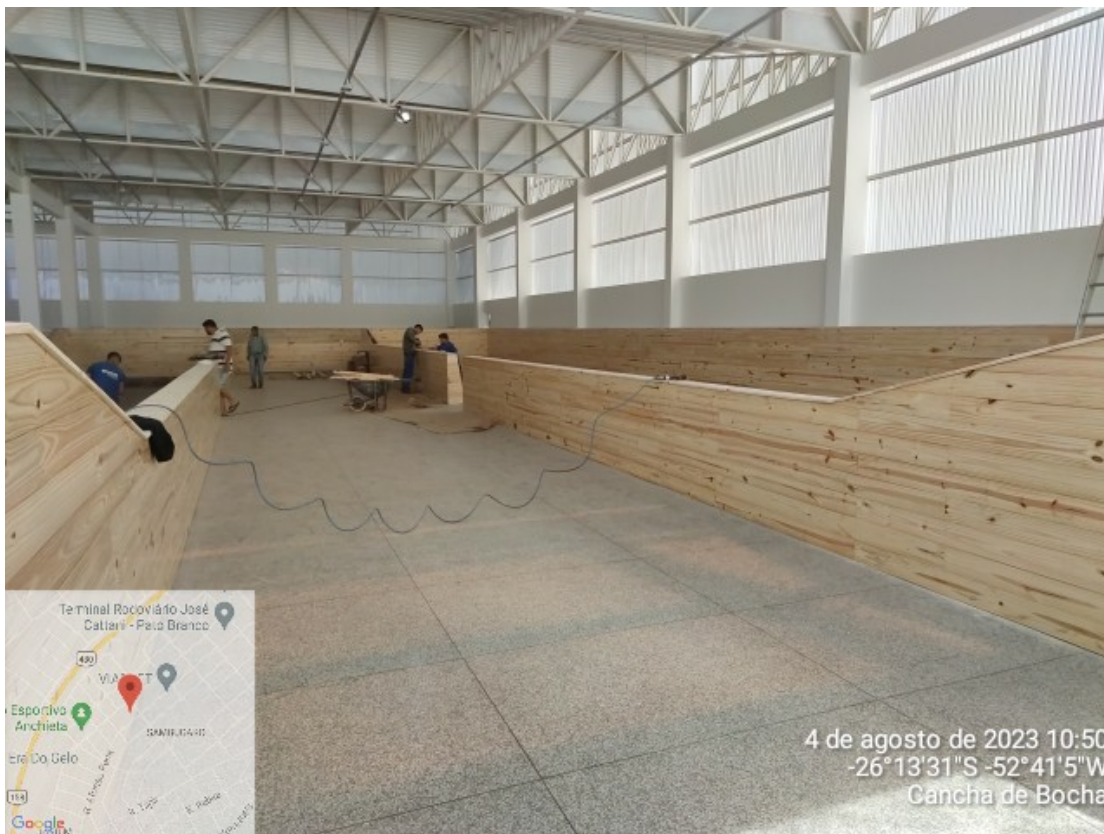

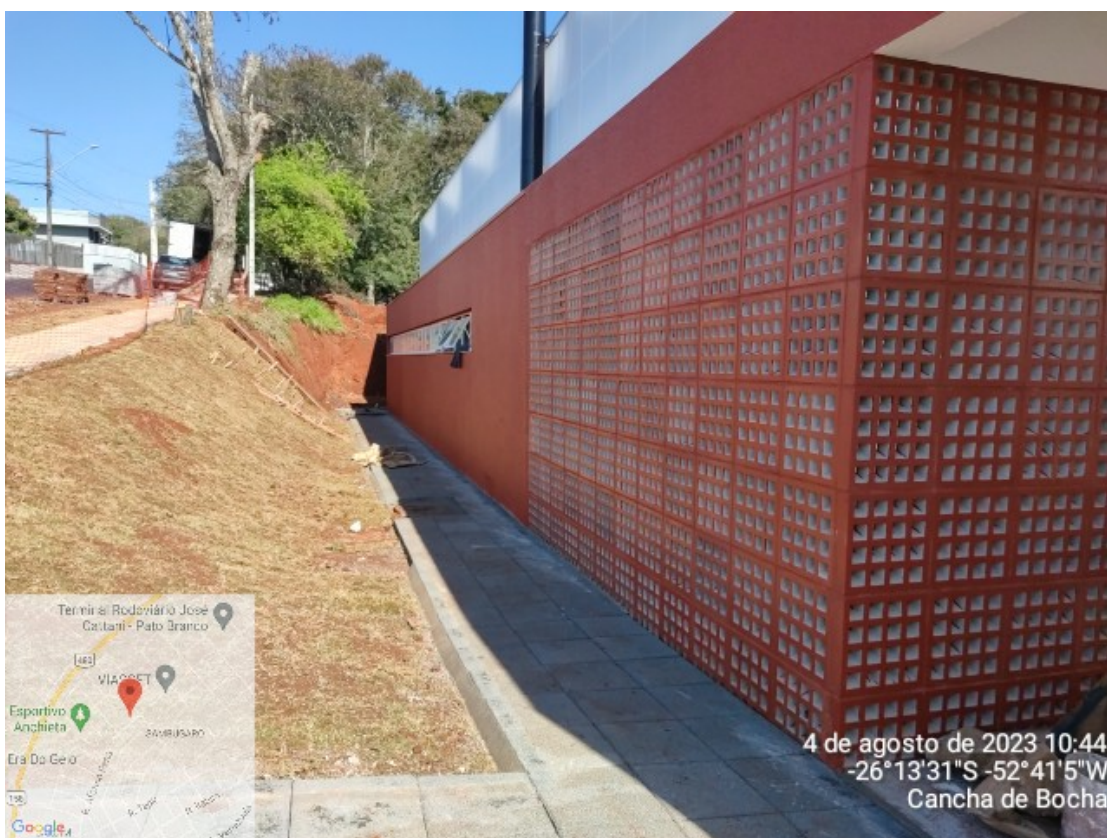



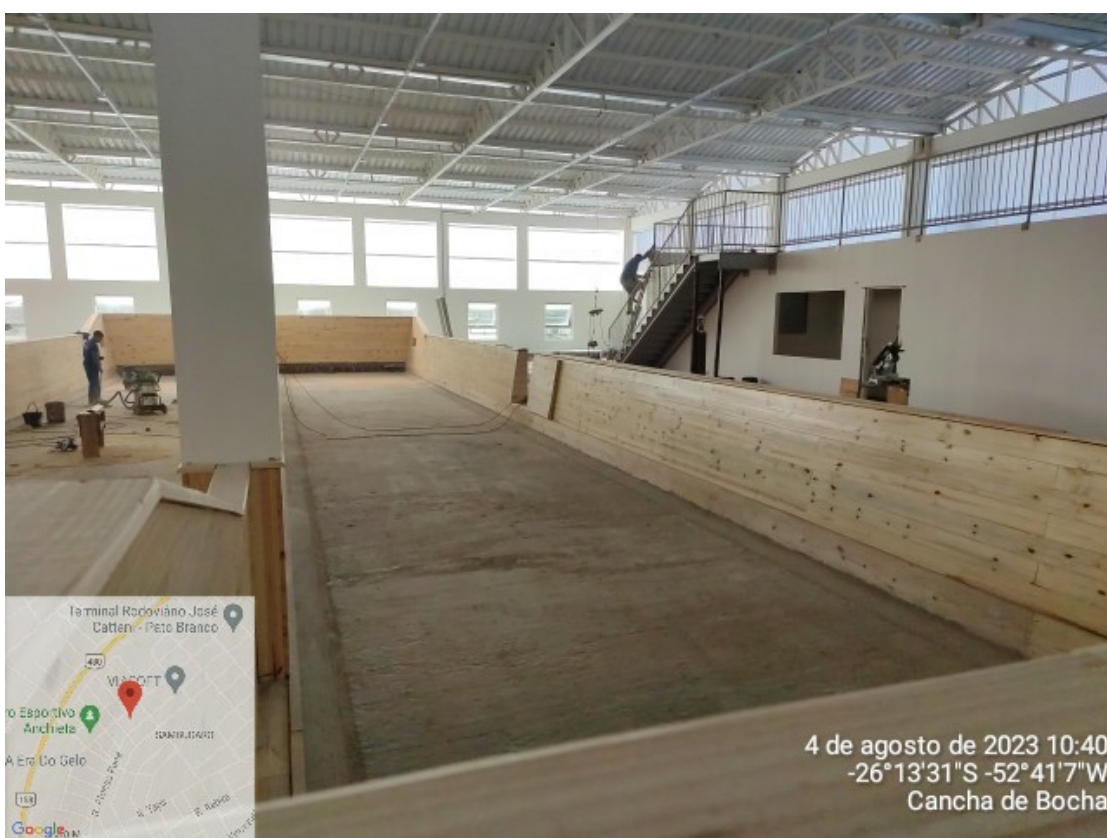



Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 238.042,62**.

Pato Branco, 10 de Agosto de 2023.

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAVA CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.830.558/0001-43

Certidão nº: 37147619/2023

Expedição: 25/07/2023, às 14:17:20

Validade: 21/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAVA CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.830.558/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA35-7427-FC95-7039

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDA ZIANNI MANARIM (CPF 009.XXX.XXX-81) em 11/08/2023 15:25:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALEXANDRE ZOCHÉ (CPF 044.XXX.XXX-05) em 14/08/2023 08:59:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/BA35-7427-FC95-7039>
