



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	2ª	DATA	25/07/2024 - qui
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO:									ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITERA:									Nº	21/2024	Nº	
									DATA:	14/02/2024	DATA	
MÊS												
JUL												
SAM												
Lote												
Ano												
2024												
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-					-	-	-
	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	309,74	100,00%	0,0137	1,37%	18,57	5.751,87	5.751,87	-
	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	105,10	100,00%	0,0002	0,02%	0,85	89,34	89,34	-
	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	100,00%	0,0001	0,01%	1,92	28,80	28,80	-
	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	100,00%			1,63	16,30	16,30	-
	1.1.2		LOCACAO		-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	100,00%	0,0070	0,70%	73,50	2.940,00	2.940,00	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	83,33%	0,0222	1,85%	1.554,47	7.772,35	9.326,82	1.554,47
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0087	0,87%	3.671,01	3.671,01	3.671,01	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	88,75	100,00%	0,0021	0,21%	9,89	877,74	877,74	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	GRELHA DE CONCRETO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59,03	100,00%	0,0131	excesso	93,57	5.523,43	5.523,43	-
3	4		ESTRUTURAS							-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3) ESPESSURA 3,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,11	100,00%	0,0009	0,09%	114,92	357,40	357,40	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0) ESPESSURA 5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	4,44	100,00%	0,0014	0,14%	132,50	588,30	588,30	-
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	2ª	DATA	25/07/2024 - qui
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO:									ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITERA:									Nº	21/2024	Nº	
									DATA:	14/02/2024	DATA	
MÊS												
SAM									74			
Lote									5			
Ano									2024			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00	85,71%	0,0072	0,62%	17,33	2.599,50	3.032,75	433,25
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-	-	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	24,62	73,86	73,86	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	960,00		0,0110		4,80	-	4.608,00	4.608,00
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	117,36	117,36	117,36	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		84,67	-	84,67	84,67
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0001		46,98	-	46,98	46,98
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0005		207,63	-	207,63	207,63
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29,00		0,0090		130,54	-	3.785,66	3.785,66
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO - METÁLICO, COM FLANGE, PINTADO ELETROSTATICAMENTE 50X40X35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,0009		359,47	-	359,47	359,47
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 4,5, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA RUBI TOPO DE POSTE - SOQUETE E-27 PARA LAMPADA DE LED 20W	UNID	30,00	100,00%	0,0851	8,51%	1.191,75	35.752,50	35.752,50	-
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBRAMENTO FM AIVFNARTIA. AF_12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	187,49	187,49	187,49	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	200,00%	0,0007	excesso	297,61	297,61	297,61	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	200,00%	0,0004	excesso	166,29	166,29	166,29	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	2ª	DATA	25/07/2024 - qui
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO:									ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITERA:									Nº	21/2024	Nº	
									DATA:	14/02/2024	DATA	
MÊS												
Mês												
Jul												
SAM												
Lote												
Ano												
2024												
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0002		102,65	-	102,65	102,65
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,72	100,00%	0,0002	0,02%	15,52	104,29	104,29	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,25	100,00%	0,0002	0,02%	45,33	101,99	101,99	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,70	30,70	30,70	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0022	0,22%	912,16	912,16	912,16	-
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO		-				-	-	-	-
	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	145,90	100,00%	0,0168	1,68%	48,27	7.042,59	7.042,59	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	42,43		0,0052		51,34	-	2.178,36	2.178,36
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	91,40	100,00%	0,0147	1,47%	67,37	6.157,62	6.157,62	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	202,76	100,00%	0,0355	3,55%	73,55	14.913,00	14.913,00	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	245,56	59,28%	0,0474	2,81%	81,12	11.807,83	19.919,83	8.112,00
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	88,75		0,0184		87,28	-	7.746,10	7.746,10



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO	Amsop				
									Mês	Jul	PARCELA	2ª		DATA	25/07/2024 - qui		
									SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:				
									Lote	5	Nº	21/2024		Nº			
FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.									Ano	2024		DATA:	14/02/2024		DATA		
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS													ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato					
7		COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO														
		COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO														
		COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO														
	11																
	11.1																
	11.1.9																
	94263	SINAPI															
	x																
	605000G	DER-PR fev/23															
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO															
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO															
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO															
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO															
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO															
	GLOBAL - LOTE 1									% PREVIST	30,88%	% EXECUTADO :	71,82%	SOMAS	301.849,92	420.267,54	118.417,62
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:				R\$420.267,54				
									Medição Acumulada:				301.849,92				
									Total Anterior:				62.051,83				



ESTADO DO PARANÁ

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):		
 Documento assinado digitalmente RODRIGO PIRES FRANCO Data: 12/08/2024 14:11:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES Data: 12/08/2024 15:10:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	ROBSON CANTU:4414 3664968 Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968 Dados: 2024.08.12 17:13:52 -03'00'
Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda. Rodrigo Pires Franco Arq. Urb. CAU A9102039	PREF. MUN. DE PATO BRANCO FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D	PREFEITO DE PATO BRANCO ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - São Luiz

CONVÊNIO : Nº. 611/2023

PAM

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 21/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 420.267,54

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 5

MEDICÃO Nº: 2ª

DATA DA MEDIÇÃO : 25/07/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/05/2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2023

DATA : 14/02/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	21.824,14	92,88%	21.824,14	20.269,67
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	6.401,17	100,00%	6.401,17	6.401,17
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	945,70	100,00%	945,70	945,70
4	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	20,00%	9.613,77	80,18%	48.068,88	38.543,22
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10,00%	190,31	94,61%	1.903,18	1.800,53
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	15,00%	21.457,65	67,58%	143.051,00	96.679,33
7	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	35,00%	69.325,71	69,27%	198.073,47	137.210,30
8				-		-	-
9				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				129.758,45	TOTAL MEDIÇÃO		301.849,92

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
18715,19	1.554,48	7,12%
614,42	5.786,75	90,40%
945,70	-	
	38.543,22	80,18%
463,90	1.336,63	70,23%
21070,62	75.608,71	52,85%
20242,00	116.968,30	59,05%
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
OK	Parcial	
Acumulado	Destas	
Med. Anterior	Medição	
62.051,83	239.798,09	

Importa a presente medição no valor total de R\$ **R\$239.798,09**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

gov.br
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 12/08/2024 14:11:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 12/08/2024 15:10:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON
CANTU:44143
664968
Assinado de forma digital por ROBSON
CANTU:44143664968
Dados: 2024.08.12 17:13:36 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda. Rodrigo Pires Franco Arq. Urb. CAU A9102039	PREF. MUN. DE PATO BRANCO FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D	PREFEITO DE PATO BRANCO ROBSON CANTU
---	---	---

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medicação:	74 / 5 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato N°:	21/2024
Data da Vistoria:	30/07/2024

Objeto:

Revitalização da Praça São Luís, contendo: área de convivência, play-ground, espaço sacro e calçadas.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **17/06/2024** até **25/07/2024**.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA




2 | DETALHE DA PLACA



5 | Mapa



3 | PAVER E GRAMAS

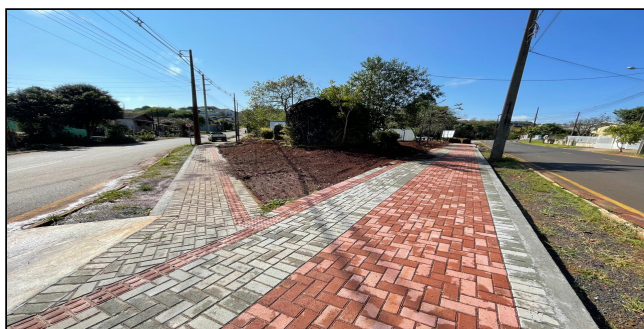

4 | PAVER



5 | REGULARIZAÇÃO TERRENO



6 | BANCOS E BEBEDOURO



7 | BANCOS E BEBEDOURO



8 | BANCOS E BEBEDOURO



9 | BRINQUEDOS



10 | BRINQUEDOS



11 | BRINQUEDOS

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19329/medicao/11631/relatorio-fotografico/287>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 31 de julho de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 31/07/2024 15:58:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
