



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	1ª	DATA	14/06/2024 - sex
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Campo do São Roque	Lote	2	Nº	18/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI	Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-					-	-	-
	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	2,16	60,00%	0,0003	0,02%	79,04	102,44	170,73	68,29
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	66,67%	0,0200	1,33%	1.722,11	6.888,44	10.332,66	3.444,22
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0070	0,70%	3.597,59	3.597,59	3.597,59	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	M2	818,30	100,00%	0,0008	0,08%	0,51	417,33	417,33	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			100,00%			-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	38,39	100,00%	0,0015	0,15%	19,56	750,91	750,91	-
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	21,55	100,00%	0,0006	0,06%	14,48	312,04	312,04	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	M2	80,82	100,00%	0,0017	0,17%	10,96	885,79	885,79	-
	2.3.9		TUBOS DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	22,45	100,00%	0,0006	0,06%	14,28	320,59	320,59	-
3	4		ESTRUTURAS						-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-				-	-	-	-
	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF 09/2020	M2	104,02	100,00%	0,0288	2,88%	142,88	14.862,38	14.862,38	-
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.2		ARMAÇAO CA-25		-				-	-	-	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	1ª	DATA	14/06/2024 - sex
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Campo do São Roque	Lote	2	Nº	18/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI	Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	319,24	100,00%	0,0098	0,98%	15,84	5.056,76	5.056,76	-
	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	647,85	100,00%	0,0199	1,99%	15,86	10.274,90	10.274,90	-
	4,3		CONCRETOS E GRAUTES		-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-				-	-	-	-
	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	18,72	100,00%	0,0245	2,45%	677,22	12.677,56	12.677,56	-
	4.3.5		GRAUTES		-				-	-	-	-
	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,12	%	0,0001	excesso	591,23	70,95	70,95	-
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	7,18	55,00%	0,0019	0,10%	134,16	529,80	963,27	433,47
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,07	55,00%	0,0003	0,02%	134,40	79,10	143,81	64,71
4	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-				-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-				-	-	-	-
	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,40		0,0082		160,61	-	4.240,10	4.240,10
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ALAMBRADO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO H:6,0M E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA CAMPO SÃO ROQUE	M2	477,00		0,1684		182,44	-	87.023,88	87.023,88
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	GRADIL TIPO NYLOFOR3D OU SIMILAR, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, COR AZUL, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,43M) E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	585,72		0,4455		392,95	-	230.158,67	230.158,67
5	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-	-	-
	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00		0,0004		18,85	-	226,20	226,20
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	1ª	DATA	14/06/2024 - sex
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO			SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - Campo do São Roque			Lote	2	Nº	18/2024
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI			Ano	2024	DATA:	09/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00		0,0004		5,32	-	212,80	212,80
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00		0,0005		8,09	-	242,70	242,70
	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00		0,0023		19,75	-	1.185,00	1.185,00
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,0003		130,02	-	130,02	130,02
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0018		919,58	-	919,58	919,58
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0001		75,63	-	75,63	75,63
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		93,81	-	93,81	93,81
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0001		52,05	-	52,05	52,05
	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00		0,0008		196,88	-	393,76	393,76
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	Ref 101658	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V3 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	UN	2,00		0,0038		980,84	-	1.961,68	1.961,68
	16.105.0000	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00		0,0058		3.013,91	-	3.013,91	3.013,91
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0004		230,03	-	230,03	230,03
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO H=6,00M LIVRE COM TRÊS REFLETORES LED 200W, IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00		0,0168		2.896,22	-	8.688,66	8.688,66
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO H=6,00M LIVRE COM CINCO REFLETORES LED 200W, IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00		0,0187		3.219,45	-	9.658,35	9.658,35



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	1ª	DATA	14/06/2024 - sex
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO			SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - Campo do São Roque			Lote	2	Nº	18/2024
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI			Ano	2024	DATA:	09/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
6	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CABO TRIPOLAR DE ALUMÍNIO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00		0,0067		11,56	-	3.468,00	3.468,00
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONECTOR PERFURANTE 1,5-10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00		0,0003		13,68	-	136,80	136,80
	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00		0,0006		329,70	-	329,70	329,70
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0004		184,22	-	184,22	184,22
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0002		113,72	-	113,72	113,72
7	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-				-	-	-	-
	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	56,40		0,0011		9,68	-	545,95	545,95
	10.1.3		EMBOCO		-				-	-	-	-
	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	56,40		0,0054		49,67	-	2.801,39	2.801,39
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.4		PISO CIMENTADO		-				-	-	-	-
	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021	M2	18,08		0,0002		5,04	-	91,12	91,12
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	238,00		0,0344		74,64	-	17.764,32	17.764,32
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	199,00	45,00%	0,0314	1,41%	81,48	7.296,53	16.214,52	8.917,99
	10.4		PINTURAS		-				-	-	-	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-				-	-	-	-
	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF 06/2014	M2	56,40		0,0032		29,37	-	1.656,47	1.656,47
	10.4.16		PINTURA EM PISO		-				-	-	-	-
	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	5,28		0,0003		25,82	-	136,33	136,33
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M2	12,80		0,0046		184,84	-	2.365,95	2.365,95



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	1ª	DATA	14/06/2024 - sex
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Campo do São Roque	Lote	2	Nº	18/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI	Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
8	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZACAO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	437,00		0,0026		3,13	-	1.367,81	1.367,81
	11.1.10		SINALIZACAO		-				-	-	-	-
	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICACÃO MANUAL. AF 05/2021	M	525,45		0,0058		5,71	-	3.000,32	3.000,32
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	26,00		0,0062		123,66	-	3.215,16	3.215,16
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	1.650,12	80,00%	0,0516	4,13%	16,17	21.345,95	26.682,44	5.336,49
	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	15,00	100,00%	0,0031	0,31%	106,10	1.591,50	1.591,50	-
	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.20 M E MENOR OUE 0.40 M.AF 05/2018	UN	15,00	100,00%	0,0028	0,28%	95,26	1.428,90	1.428,90	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	352,96		0,0166		24,25	-	8.559,28	8.559,28
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	7,00		0,0078		579,17	-	4.054,19	4.054,19
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TRAVES DE FUTEBOL, MEDIDAS OFICIAIS 7,32X2,44M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4", COM RECUOS EM TUBOS DE 1 1/2" (0,80M SUPERIOR, 1,80M INFERIOR E TRAVAMENTO), INCLUI REDE DE NYLON FIO 8,0MM COM PROTEÇÃO LIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00		0,0202		10.420,72	-	10.420,72	10.420,72
9	12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	437,00		0,0023		2,73	-	1.193,01	1.193,01
									-	-	-	-
									-	-	-	-

GLOBAL - LOTE 1				% PREVIST	5,16%	% EXECUTADO :	17,13%	SOMAS	88.489,46	516.665,92	428.176,46
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:		R\$516.665,92	
								Medição Acumulada:		88.489,46	
								Total Anterior:		-	
								Valor Desta Medição:		R\$88.489,46	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

						REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				Mês	Jun	PARCELA	1ª	DATA	14/06/2024 - sex
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO					SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Campo do São Roque					Lote	2	Nº	18/2024
FIRMA EMPREITERA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI					Ano	2024	DATA:	09/02/2024
								Nº	
								DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

MARCOS VINICIUS GOMES
07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES:
07976998994
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34682908000144, OU=videoconferencia, CN=MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994
* Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.06.24 14:38:15-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 27/06/2024 10:15:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.06.28 08:45:58 -03'00'

ERGE CONSTRUTORA EIRELI
MARCOS VINICIUS GOMES
ARQ. URB. CAU A129.307-9

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - Campo do São Roque

CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

MEDIÇÃO Nº: 1ª

DATA DA MEDIÇÃO : 14/06/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/05/2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2023

EMPRESA VENCEDORA : ERGE CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATO EMPREITADA Nº: 18/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 516.665,92

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 2

DATA : 09/02/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	14.518,31	75,81%	14.518,31	11.005,80
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	50,00%	1.134,66	100,00%	2.269,33	2.269,33
3	4	ESTRUTURAS	25,00%	11.012,40	98,87%	44.049,63	43.551,45
4	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-		321.422,65	-
5	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-		30.688,98	-
6		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-		627,64	-
7	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	17,55%	41.576,05	7.296,53
8	11.1	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		-	40,39%	60.320,32	24.366,35
9	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		1.193,01	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				26.665,37		TOTAL MEDIÇÃO	88.489,46

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
	11.005,80	75,81%
	2.269,33	100,00%
	43.551,45	98,87%
	-	-
	-	-
	-	-
	7.296,53	17,55%
	24.366,35	40,39%
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
OK	Parcial	
Acumulado	Destas	
Med. Anterior	Medição	
-	88.489,46	

Importa a presente medição no valor total de R\$ **R\$88.489,46**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), CN=660200000014, OU=videoconferencia, CN=MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994

Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

data: 2024.06.24 14:37:55-0300

Font: PhantomPDF Versão: 10.1.0

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 27/06/2024 10:15:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:4414 3664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968

Dados: 2024.06.28 08:45:44 -03'00'

ERGE CONSTRUTORA EIRELI

MARCOS VINICIUS GOMES

ARQ. URB. CAU A129.307-9

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

PROJETO/LOTE: Nº 74 / LOTE 02

PROGRAMA: TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIAS

CONTRATADA: ERGE CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATO Nº 18/2024

OBJETO (descrição conforme edital de licitação)

O objeto do presente Contrato é a execução de Construção da Praça Campo do São Roque, na Rua Sorocaba, Lote 01, Quadra 2340 - Bairro São Roque; Contendo: campo de futebol, alambrados, mureta de contenção, calçadas, iluminação e paisagismo. Serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; instalações hidrossanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto. Colocação de placas de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 11/2023, fornecida pelo contratante.

MEDIÇÃO Nº 01

DATA DA VISTORIA: 18/06/2024


Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 19/02/2024 até 14/06/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS.

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
 46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



PLACA DA OBRA ATUALIZADA (FOTO OBRIGATÓRIA)

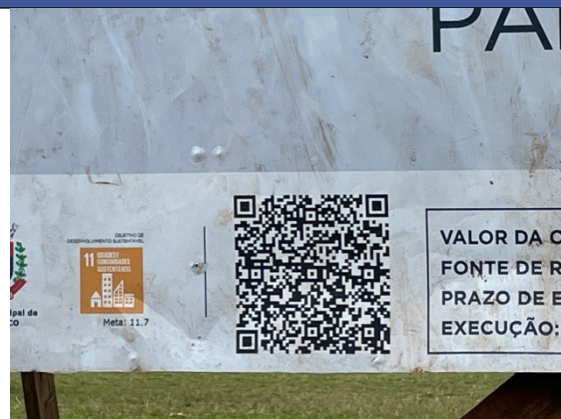

DETALHE DA PLACA DA OBRA (QR CODE)
 (FOTO OBRIGATÓRIA)



MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



F1-MURO DE CONTEÇÃO



F2- MURO DE CONTEÇÃO



F3- DETALHE DA CALÇADA



F4- DETALHE DA CALÇADA



F5-DETALHE DA CALÇADA



F6-PLANTIO DE GRAMA



F7- PLANTIO DE GRAMA



F8- PLANTIO DE GRAMA



F9- FOTO PANORÂMICA DA OBRA

PATO BRANCO, 19 de JUNHO de 2023.



Documento assinado digitalmente

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 19/06/2024 10:59:36-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENG° CIVIL – CREA PR-178408/D
ART Nº 1720243131422
