



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: 13 Período: 24/07/2024 a 26/09/2024 % Realizado Período.: 2,68% % Realizado Acum.: 87,14%

		GERAL	SETORA	SETORB	SETORC	SETORD	SETORE	SETORF	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contratament o	travamento do banco inferior	ADM LOCAL - PLE 01	ADM LOCAL - PLE 02	ADM LOCAL - PLE 03	ADM LOCAL - PLE 04	ADM LOCAL - PLE 05	ADM LOCAL - PLE 06	ADM LOCAL - PLE 07	ADM LOCAL - PLE 08
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
2	Serviços Preliminares	2																								
3	Movimentação de terra - escavação	1																								
4	Movimentação de terra - reaterro																									
5	Locação da obra	1																								
6	Fundações - Movimentação de terra - Blocos		1	1	1	1	1	1	1																	
7	Fundações - Movimentação de terra - Baldrames		12	12	12	12	12	12	12																	
8	Fundações - Estacas		3	2	2	2	2	1	3																	
9	Fundações - Blocos		3	3	4	3	4	3	4																	
10	Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames		6	5	6	6	10		5																	
11	Estrutura moldada in loco - Pilares		10	10			11	11	5																	
12	Estrutura moldada in loco - Vigas		10	10			11	11	11																	
13	Estrutura moldada in loco - Escadas		13	13					10																	
14	Estrutura moldada in loco - Lajes maciças		12	11			13	12	6																	
15	Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar		6	5			10	10																		
16	Estrutura pré-moldada - Pilares		4	3	4	4	4	4	4																	
17	Estrutura pré-moldada - Vigas		4	3	4	4	4	4	4																	
18	Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré		5	5	6	6	5	6																		
19	Estrutura pré-moldada - Laje arquibancada		5	5	6	6	5	6																		
20	Estrutura pré-moldada - Laje alveolar		4	3			4	4																		
21	Impermeabilizações																									
22	Alvenarias, vergas e contravergas		8	9			11	11	11																	
23	Alvenarias - peitoril em granito																									
24	Divisórias																									
25	Instalações hidrossanitárias - movimentação de água	13																								
26	Ramal de distribuição de água	13																								
27	Tubulação PVC soldável e registros																									
28	Bomba Centrífuga																									
29	Reservatório para armazenamento de água																									
30	Kit cavalete entrada de água																									
31	Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto	12																								
32	Tubulação 150mm - Esgoto	13																								
33	Caixas enterradas - inc. caixa de gordura																									
34	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tubulação	12																								
35	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tubulação	13																								
36	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - caixa de gordura																									
37	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - caixa de gordura																									
38	Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulação	12																								
39	Instalações elétricas - movimentação de terra	12																								
40	Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins	12																								
41	Instalações elétricas - conexões para eletrod	12																								

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1060756-29	874951	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ARENA PATO BRANCO	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	370/2022-GP

Medição:	13	Período:	24/07/2024 a 26/09/2024	% Realizado Período.:	2,68%	% Realizado Acum.:	87,14%
----------	----	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	--------

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETORA	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1, 3 E 4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do barzo inferior	ADM LOCAL - PLE 01	ADM LOCAL - PLE 02	ADM LOCAL - PLE 03	ADM LOCAL - PLE 04	ADM LOCAL - PLE 05	ADM LOCAL - PLE 06	ADM LOCAL - PLE 07	ADM LOCAL - PLE 08
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes																									
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição																									
44	Instalações elétricas - Disjuntores																									
45	Instalações elétricas - Suporte e vergalhão	12																								
46	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5																									
47	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16,																									
48	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95,																									
49	Instalações elétricas - Caixas enterradas																									
50	Instalações elétricas - Interruptores e tomada																									
51	Instalações elétricas - Eletrocalhas																									
52	Instalações elétricas - Luminárias																									
53	Instalações elétricas - Refletores	13																								
54	Instalações elétricas - Entrada de energia																									
55	SPDA - Terminál aéreo e malha superior																									
56	SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior																									
57	SPDA - Barra chata de alumínio																									
58	SPDA - Descidas																									
59	SPDA - Caixas enterradas e caixa de equipor																									
60	PSCIP - Abrigos																									
61	PSCIP - Bomba de Incêndio																									
62	PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões	12																								
63	PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões																									
64	PSCIP - Reservatório, registros e conexões																									
65	PSCIP - Recalque no passeio																									
66	PSCIP - Acionador manual de bomba de incê																									
67	PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça																									
68	PSCIP - Barras anti-pânico																									
69	PSCIP - Extintores e sinalização																									
70	Revestimentos - fechamento lateral em telha				13	10																				
71	Revestimentos - paredes internas (chapisco e		11	12			13	13																		
72	Revestimentos - paredes fachada (chapisco e		12	13			11	13																		
73	Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)																									
74	Revetimentos - Pisos - Lastro		12	12	12	12				12																
75	Revestimentos - Pisos - Regularização, revest																									
76	Revestimentos - Pisos - Piso industrial em CA		11	12	11	12				10																
77	Revestimentos - Pisos - Acabamento polido		11	12	11	12																				
78	Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante									12																
79	Revestimentos - Forro e teto																									
80	Cobertura - Treliças principais		8		8	7	8	7		7																

Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

CONTRATO Nº370/2022-GP

Relatório de Medição nº 13

Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Responsável: Sálvio Pedro Machado

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a décima terceira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:


















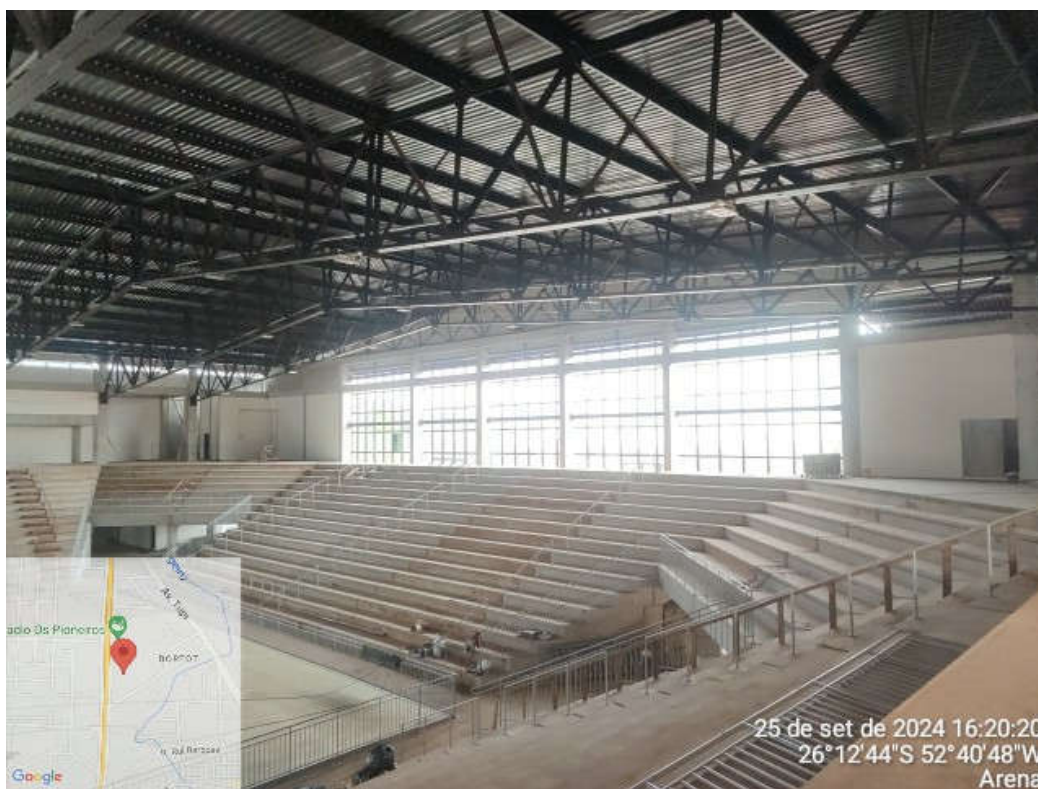

Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 731.791,51**.

Pato Branco, 26 de Setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA ZIANNI MANARIM**
Data: 27/09/2024 16:51:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
