



REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
----------	-------------------------	------------	-------

Mês	Jun	PARCELA	1ª	DATA	19/06/2024 - qua
-----	-----	---------	----	------	------------------

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEN DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte	Lote	4	Nº	20/2024
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	222,47	100,00%	0,0314	3,14%	73,50	16.351,55	16.351,55	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0179	1,79%	1.554,47	9.326,82	9.326,82	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0062	0,62%	3.247,38	3.247,38	3.247,38	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.100,00	100,00%	0,0010	0,10%	0,46	506,00	506,00	-
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,65	100,00%	0,0003	0,03%	17,66	170,42	170,42	-
	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	67,36	100,00%	0,0006	0,06%	4,74	319,29	319,29	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,20	100,00%	0,0021	0,21%	13,07	1.100,49	1.100,49	-
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,91	100,00%	0,0006	0,06%	40,55	320,75	320,75	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	180,00	100,00%	0,0034	0,34%	9,89	1.780,20	1.780,20	-
	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	56,65	100,00%	0,0062	0,62%	56,93	3.225,08	3.225,08	-
	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	50,65	100,00%	0,0074	0,74%	76,36	3.867,63	3.867,63	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO (ARGILA, COM TRANSPORTE ATÉ 10KM), ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE.	M3	84,45	100,00%	0,0113	1,13%	70,00	5.911,50	5.911,50	-
	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	412,77	100,00%	0,0028	0,28%	3,49	1.440,57	1.440,57	-
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,30	100,00%	0,0014	0,14%	116,76	735,58	735,58	-
	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M	311,54	100,00%	0,0353	3,53%	59,03	18.390,21	18.390,21	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ESCALA EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UNID	1,00	100,00%	0,0285	2,85%	14.861,32	14.861,32	14.861,32	-
	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRFPARO MANUAI. AF_12/2021	M2	5,00	100,00%	0,0007	0,07%	68,33	341,65	341,65	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ALAMBRADO PARA MEIA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO H:4,0M E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	77,36		0,0271		182,78	-	14.139,86	14.139,86



REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1ª	DATA	19/06/2024 - qua
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	20/2024	Nº	
DATA:	14/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Jun
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	4
		Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
99855		SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	10,30	100,00%	0,0026	0,26%	129,00	1.328,70	1.328,70	-
91836		SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	335,00		0,0111		17,33	-	5.805,55	5.805,55
91871		SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00		0,0002		18,74	-	112,44	112,44
93008		SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	6,00		0,0003		26,26	-	157,56	157,56
91928		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.005,00		0,0141		7,30	-	7.336,50	7.336,50
91927		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00		0,0001		5,33	-	42,64	42,64
92980		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00		0,0011		11,14	-	557,00	557,00
97881		SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,0002		117,36	-	117,36	117,36
93662		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,0001		68,26	-	68,26	68,26
93663		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,0001		68,26	-	68,26	68,26
93666		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,0002		84,67	-	84,67	84,67
92004		SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00		0,0003		65,95	-	131,90	131,90
101632		SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,00		0,0001		46,98	-	46,98	46,98
16.105.0000		PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ACESSÓRIOS. AF 12/2020	UN	1,00		0,0052		2.720,52	-	2.720,52	2.720,52
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO		CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0004		207,63	-	207,63	207,63
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO		POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67	UNID	18,00	100,00%	0,0434	4,34%	1.257,30	22.631,40	22.631,40	-
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO		POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETORES LED 200W IP-67	UNID	6,00	100,00%	0,0305	3,05%	2.644,88	15.869,28	15.869,28	-
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO		CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00		0,0060		130,54	-	3.132,96	3.132,96
89957		SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00		0,0004		185,79	-	185,79	185,79



REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A) ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Jun PARCELA 1ª DATA 19/06/2024 - qua

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte	Lote	4	Nº	20/2024
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	297,61	297,61	297,61	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	158,71	158,71	158,71	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0002		102,65	-	102,65	102,65
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,71	100,00%	0,0006	0,06%	15,52	290,38	290,38	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	15,70	100,00%	0,0014	0,14%	45,33	711,68	711,68	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	100,00%	0,0005	0,05%	31,62	252,96	252,96	-
	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	3,00	100,00%	0,0008	0,08%	139,86	419,58	419,58	-
	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	2,00	100,00%	0,0006	0,06%	143,33	286,66	286,66	-
	89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	9,00	100,00%	0,0023	0,23%	131,01	1.179,09	1.179,09	-
	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00		0,0005		284,51	-	284,51	284,51
	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00		0,0004		215,59	-	215,59	215,59
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM 30X35X60CM, INCLUI GRELHA DE CONCRETO FURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,40		0,0304		210,37	-	15.861,90	15.861,90
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,75		0,0003		8,08	-	167,66	167,66
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20,75	80,00%	0,0025	0,20%	62,36	1.035,18	1.293,97	258,79
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	130,28	75,00%	0,0168	1,26%	67,37	6.582,72	8.776,96	2.194,24
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	74,48	80,00%	0,0105	0,84%	73,55	4.382,40	5.478,00	1.095,60
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	238,90	75,00%	0,0186	1,40%	40,52	7.260,17	9.680,22	2.420,05



REFEITURA MUNICIPAL DE PATÓ BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PATÓ BRANCO	Mês	Jun	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte	PARCELA	1ª	DATA	19/06/2024 - qua		
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:		
		Lote	4	Nº	20/2024	Nº	
		Ano	2024	DATA:	14/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	412,77	40,00%	0,0796	3,18%	100,50	16.593,36	41.483,39	24.890,03
	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	32,02		0,0014		23,31	-	746,39	746,39
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	115,20		0,0193		87,28	-	10.054,66	10.054,66
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATÓ BRANCO	M2	64,80		0,0135		108,85	-	7.053,48	7.053,48
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DTL UJNTF	M2	238,90		0,0432		94,17	-	22.497,21	22.497,21
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	173,85		0,0916		274,42	-	47.707,92	47.707,92
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M2	22,00	15,00%	0,0070	0,11%	166,84	550,57	3.670,48	3.119,91
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	311,54		0,0003		0,48	-	149,54	149,54
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018	UN	8,00		0,0017		111,62	-	892,96	892,96
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	430,50	70,00%	0,0121	0,85%	14,60	4.399,71	6.285,30	1.885,59
	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	206,17	206,17	206,17	-
	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	153,16	153,16	153,16	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 08/2017	M3	30,54		0,0071		121,31	-	3.704,81	3.704,81
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	297,00		0,0125		21,89	-	6.501,33	6.501,33
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	1,00	70,00%	0,0067	0,47%	3.505,09	2.453,56	3.505,09	1.051,53
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	1,00		0,0088		4.562,24	-	4.562,24	4.562,24
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	1,00		0,0048		2.476,65	-	2.476,65	2.476,65
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00		0,0048		2.476,65	-	2.476,65	2.476,65
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4,00	75,00%	0,0040	0,30%	522,79	1.568,37	2.091,16	522,79
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MULTI CORDAS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,1817		94.655,78	-	94.655,78	94.655,78
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0029		1.515,86	-	1.515,86	1.515,86
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	3,00		0,0142		2.457,72	-	7.373,16	7.373,16
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0087		4.556,48	-	4.556,48	4.556,48
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0055		2.840,72	-	2.840,72	2.840,72



REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ


REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1ª	DATA	19/06/2024 - qua


MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Jun	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte	Lote	4	Nº	20/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA:	14/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO	UNID	1,00		0,0796		41.482,09	-	41.482,09	41.482,09
99802	SINAPI		PINTURA LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	384,00		0,0005		0,67	-	257,28	257,28

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO PIRES FRANCO**
 Data: 24/06/2024 17:15:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES**
 Data: 26/06/2024 13:34:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON
CANTU:441436
64968
 Assinado de forma digital por ROBSON
 CANTU:44143664968
 Dados: 2024.06.26 14:25:11 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
 Rodrigo Pires Franco
 Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
 FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
 ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
 ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
PROJETO : PRAÇA - Novo Horizonte
CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

MEDIÇÃO Nº: 1ª
DATA DA MEDIÇÃO : 19/06/2024

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
CONTRATO EMPREITADA Nº : 20/2024 DATA : 14/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO : 521.015,31

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/05/2023
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2023

SAM : Nº. 74
LOTE : Nº. 4

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	29.431,75	100,00%	29.431,75	29.431,75
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	16.695,36	100,00%	16.695,36	16.695,36
3	3	FUNDACOES		-	100,00%	1.440,57	1.440,57
4	4	ESTRUTURAS		-	100,00%	33.987,11	33.987,11
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	2,36%	14.481,51	341,65
6	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	100,00%	1.328,70	1.328,70
7	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	65,14%	59.106,43	38.500,68
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5,00%	1.012,35	17,76%	20.247,11	3.596,67
9	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	5,00%	7.930,51	22,95%	158.610,34	36.404,40
10	11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	20,00%	37.085,83	4,74%	185.429,15	8.780,97
11	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20,00%	51,45		257,28	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				92.207,25		TOTAL MEDIÇÃO	170.507,86

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$170.507,86

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 24/06/2024 17:15:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 26/06/2024 13:34:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON
CANTU:441436
64968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.06.26 14:27:25 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
	29.431,75	100,00%
	16.695,36	100,00%
	1.440,57	100,00%
	33.987,11	100,00%
	341,65	2,36%
	1.328,70	100,00%
	38.500,68	65,14%
	3.596,67	17,76%
	36.404,40	22,95%
	8.780,97	4,74%
	-	
	-	
OK	Parcial	
Acumulado	Destá	
Med. Anterior	Medição	
-	170.507,86	

ROBSON
CANTU:4414366
4968

Assinado de forma digital
por ROBSON
CANTU:44143664968
Dados: 2024.06.26 14:27:35
-03'00'

CO
RO GIBES
8/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO


Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medicação:	74 / 4 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato N°:	20/2024
Data da Vistoria:	14/06/2024

Objeto:

Construção da Praça Novo Horizonte, contendo: Área de convivência, play-ground, mini-quadra de basquete, pista de caminhada, calçadas e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **14/02 a 14/06**

SERVIÇOS EXECUTADOS

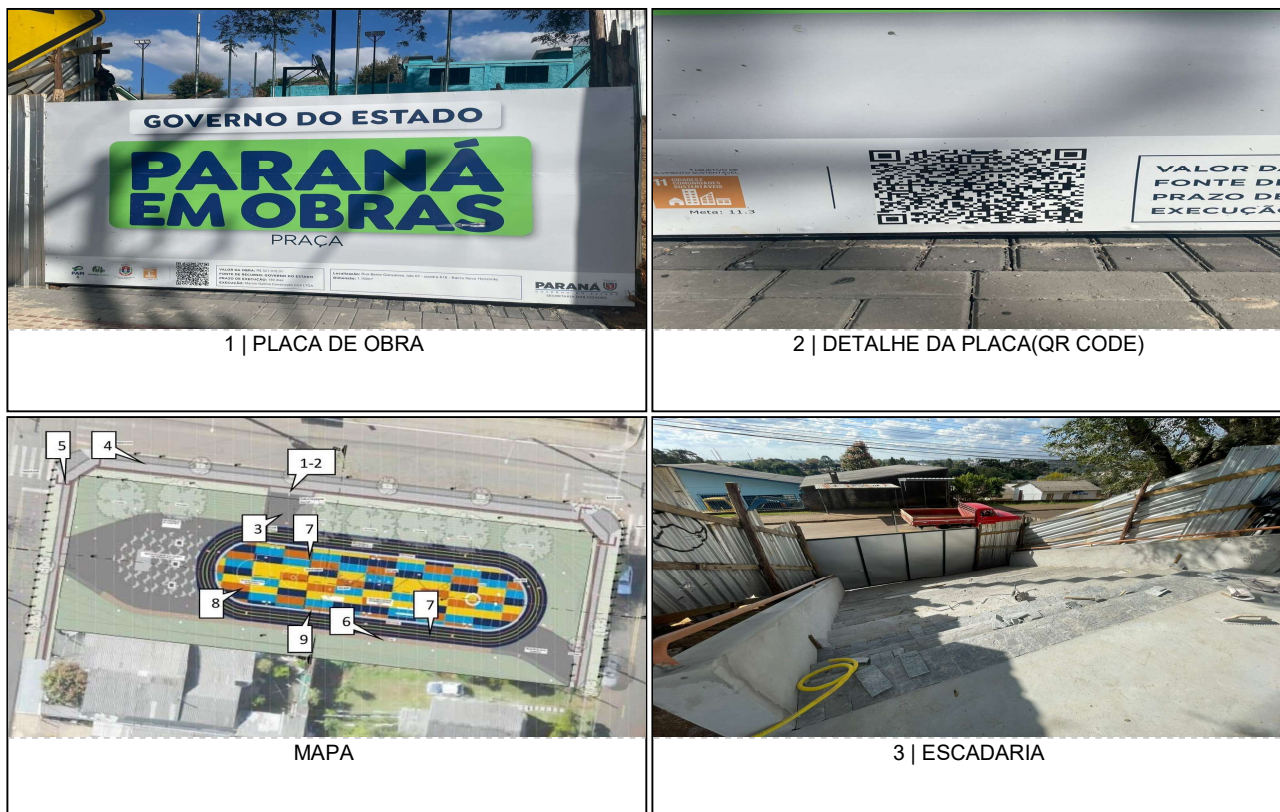



4 | DETALHE CALÇADA



5 | DETALHE CALÇADA



6 | BANCOS



7 | TABELA DE BASQUETE



8 | PISO E QUADRAS



9 | PISO E QUADRAS



10 | PISO E QUADRAS

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/ lote/19328/medicao/9554/relatorio-fotografico/122>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 21 de junho de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D
