

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA											
TOTAL:					1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.	CASA TEMÁTICA				1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				71.068,00	52,06	7,03	59,09	36.998,00	4.996,08	41.994,08
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSIDERANDO ENGENHEIRO CIVIL 10H/SEMANAIS E ENCARREGADO E APONTADOR MENSAL)				71.068,00	52,06	7,03	59,09	36.998,00	4.996,08	41.994,08
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				22.441,64	86,07	3,45	89,52	19.315,34	773,74	20.089,08
1.2.0.1.	REMOÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA/HIDRÁULICA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ATÉ O BOTA-FORA				245,85	100,00	-	100,00	245,85	-	245,85
1.2.0.2.	REMOÇÃO DE PEDRAS (MONTE DAS OLIVEIRAS), INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM				574,20	100,00	-	100,00	574,20	-	574,20
1.2.0.3.	REMOÇÃO DOS MONUMENTOS DE CONCRETO (INCLUSIVE FUNDAÇÃO), REVITALIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO, INCLUSIVE IÇAMENTO				3.868,72	30,00	20,00	50,00	1.160,62	773,74	1.934,36
1.2.0.4.	REMOÇÃO DE ÁRVORES, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DA ÁRVORE ATÉ O HORTO FLORESTAL				1.079,75	100,00	-	100,00	1.079,75	-	1.079,75
1.2.0.5.	REMOÇÃO DE ÁRVORES E PLANTIO EM OUTRO LOCAL NO MESMO LOTE				836,40	50,00	-	50,00	418,20	-	418,20
1.2.0.6.	RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL NA GARAGEM MUNICIPAL				11.335,92	100,00	-	100,00	11.335,92	-	11.335,92
1.2.0.7.	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO COM MINIESCAVADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ATÉ O BOTA-FORA				4.018,25	100,00	-	100,00	4.018,25	-	4.018,25
1.2.0.8.	RETIRADA DO MONUMENTO DO PATO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL NA GARAGEM MUNICIPAL				210,47	100,00	-	100,00	210,47	-	210,47
1.2.0.9.	RETIRADA DE LIXEIRA COM REAPROVEITAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL NA GARAGEM MUNICIPAL				159,28	100,00	-	100,00	159,28	-	159,28
1.2.0.10.	RETIRADA DE REFLETORES, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL				99,00	100,00	-	100,00	99,00	-	99,00
1.2.0.11.	RETIRADA DE FLOREIRAS COM REAPROVEITAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DA ATÉ O HORTO FLORESTAL				13,80	100,00	-	100,00	13,80	-	13,80
1.3.	TERRAPLENAGEM				10.247,34	100,00	-	100,00	10.247,34	-	10.247,34
1.3.0.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020				2.790,94	100,00	-	100,00	2.790,94	-	2.790,94
1.3.0.2.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)				4.306,94	100,00	-	100,00	4.306,94	-	4.306,94
1.3.0.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				3.149,46	100,00	-	100,00	3.149,46	-	3.149,46
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES				53.966,44	63,90	4,91	68,81	34.484,37	2.647,51	37.131,88
1.4.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.169,28	100,00	-	100,00	1.169,28	-	1.169,28
1.4.0.2.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				12.957,70	-	-	-	-	-	-
1.4.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016				7.246,32	100,00	-	100,00	7.246,32	-	7.246,32
1.4.0.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)				2.941,68	-	90,00	90,00	-	2.647,51	2.647,51

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA											
TOTAL:					1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.4.0.5.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)				3.340,00	-	-	-	-	-	-
1.4.0.6.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA				242,69	-	-	-	-	-	-
1.4.0.7.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018				26.068,77	100,00	-	100,00	26.068,77	-	26.068,77
1.5.	LOCAÇÃO DA OBRA				4.345,40	100,00	-	100,00	4.345,40	-	4.345,40
1.5.0.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018				4.345,40	100,00	-	100,00	4.345,40	-	4.345,40
1.6.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO				35.065,54	100,00	-	100,00	35.065,54	-	35.065,54
1.6.1.	Movimentação de Terra				2.036,78	100,00	-	100,00	2.036,78	-	2.036,78
1.6.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017				1.267,51	100,00	-	100,00	1.267,51	-	1.267,51
1.6.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017				295,41	100,00	-	100,00	295,41	-	295,41
1.6.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				473,86	100,00	-	100,00	473,86	-	473,86
1.6.2.	Sapatas				24.438,80	100,00	-	100,00	24.438,80	-	24.438,80
1.6.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017				435,55	100,00	-	100,00	435,55	-	435,55
1.6.2.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				8.432,27	100,00	-	100,00	8.432,27	-	8.432,27
1.6.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				457,01	100,00	-	100,00	457,01	-	457,01
1.6.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				36,06	100,00	-	100,00	36,06	-	36,06
1.6.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				7.205,65	100,00	-	100,00	7.205,65	-	7.205,65
1.6.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				724,24	100,00	-	100,00	724,24	-	724,24
1.6.2.7.	CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.				7.148,02	100,00	-	100,00	7.148,02	-	7.148,02
1.6.3.	Vigas Baldrames				8.589,96	100,00	-	100,00	8.589,96	-	8.589,96
1.6.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017				114,51	100,00	-	100,00	114,51	-	114,51
1.6.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				3.227,39	100,00	-	100,00	3.227,39	-	3.227,39
1.6.3.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				1.242,73	100,00	-	100,00	1.242,73	-	1.242,73
1.6.3.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				2.189,96	100,00	-	100,00	2.189,96	-	2.189,96
1.6.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				240,76	100,00	-	100,00	240,76	-	240,76
1.6.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				127,26	100,00	-	100,00	127,26	-	127,26

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	CASA TEMÁTICA	17/01/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	L. RITA - EIRELI	27.541.407/0001-82	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO
					7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.6.3.7.	CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.				1.447,35	100,00	-	100,00	1.447,35	-	1.447,35	
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA - TÉRREO E MEZANINO				123.734,08	100,00	-	100,00	123.734,08	-	123.734,08	
1.7.1.	Vigas e Pilares				123.734,08	100,00	-	100,00	123.734,08	-	123.734,08	
1.7.1.1.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P				95.641,11	100,00	-	100,00	95.641,11	-	95.641,11	
1.7.1.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P				28.092,97	100,00	-	100,00	28.092,97	-	28.092,97	
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO				2.592,94	100,00	-	100,00	2.592,94	-	2.592,94	
1.8.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018				2.592,94	100,00	-	100,00	2.592,94	-	2.592,94	
1.9.	DIVISÓRIAS				8.125,52	31,83	68,17	100,00	2.586,23	5.539,29	8.125,52	
1.9.0.1.	PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU) VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS				3.203,75	50,00	50,00	100,00	1.601,88	1.601,87	3.203,75	
1.9.0.2.	PAREDE COM PLACA CIMENTÍCIA LISA E=6MM, PARA USO INTERNO E EXTERNO E ESTRUTURA METÁLICA SEM VÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				4.921,77	20,00	80,00	100,00	984,35	3.937,42	4.921,77	
1.10.	COBERTURA				246.775,22	84,78	-	84,78	209.225,83	-	209.225,83	
1.10.0.1.	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P				108.670,41	100,00	-	100,00	108.670,41	-	108.670,41	
1.10.0.2.	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P				30.425,35	100,00	-	100,00	30.425,35	-	30.425,35	
1.10.0.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				49.749,32	100,00	-	100,00	49.749,32	-	49.749,32	
1.10.0.4.	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				5.326,05	100,00	-	100,00	5.326,05	-	5.326,05	
1.10.0.5.	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				8.633,16	100,00	-	100,00	8.633,16	-	8.633,16	
1.10.0.6.	RINCÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.				5.671,30	100,00	-	100,00	5.671,30	-	5.671,30	
1.10.0.7.	CONTRARRUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.				750,24	100,00	-	100,00	750,24	-	750,24	
1.10.0.8.	OITÃO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.307,43	-	-	-	-	-	-	

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		0	0	CASA TEMÁTICA	17/01/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	L. RITA - EIRELI	27.541.407/0001-82	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO
					7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.10.0.9.	BEIRAL DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				30.590,96	-	-	-	-	-	-	
1.10.0.10.	TABEIRA DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				5.651,00	-	-	-	-	-	-	
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				17.177,84	63,70	19,49	83,19	10.942,49	3.348,36	14.290,85	
1.11.1.	Movimentação de Terra				942,07	100,00	-	100,00	942,07	-	942,07	
1.11.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				214,92	100,00	-	100,00	214,92	-	214,92	
1.11.1.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				727,15	100,00	-	100,00	727,15	-	727,15	
1.11.2.	Água Fria				4.166,77	48,09	38,47	86,57	2.003,88	1.603,11	3.606,99	
1.11.2.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016				222,93	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.2.	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				170,22	-	-	-	-	-	-	
1.11.2.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				3.332,62	50,00	45,00	95,00	1.666,31	1.499,68	3.165,99	
1.11.2.4.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021				337,57	100,00	-	100,00	337,57	-	337,57	
1.11.2.5.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				103,43	-	100,00	100,00	-	103,43	103,43	
1.11.3.	Esgoto				12.069,00	66,26	14,46	80,72	7.996,54	1.745,25	9.741,79	
1.11.3.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				2.649,23	50,00	40,00	90,00	1.324,62	1.059,69	2.384,31	
1.11.3.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015				1.233,79	50,00	45,00	95,00	616,90	555,20	1.172,10	
1.11.3.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015				5.960,59	100,00	-	100,00	5.960,59	-	5.960,59	

PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.11.3.4.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				45,37	-	100,00	100,00	-	45,37	45,37	
1.11.3.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020				1.991,16	-	-	-	-	-	-	
1.11.3.6.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO				188,86	50,00	45,00	95,00	94,43	84,99	179,42	
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				101.528,80	20,55	10,31	30,86	20.862,46	10.470,21	31.332,67	
1.12.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				129,70	100,00	-	100,00	129,70	-	129,70	
1.12.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				438,65	100,00	-	100,00	438,65	-	438,65	
1.12.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				378,80	-	70,00	70,00	-	265,16	265,16	
1.12.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				124,56	-	70,00	70,00	-	87,19	87,19	
1.12.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				2.200,50	80,00	-	80,00	1.760,40	-	1.760,40	
1.12.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				8.866,80	70,00	-	70,00	6.206,76	-	6.206,76	
1.12.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				6.175,80	80,00	-	80,00	4.940,64	-	4.940,64	
1.12.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				4.508,00	70,00	-	70,00	3.155,60	-	3.155,60	
1.12.0.9.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020				226,94	-	100,00	100,00	-	226,94	226,94	
1.12.0.10.	TOMADA DE PISO INCLUINDO CAIXA DE ALUMÍNIO, 2 TOMADAS E PLACA TIPO UNHA DUPLA PARA PISO 4X4 CROMADA				2.801,16	-	50,00	50,00	-	1.400,58	1.400,58	
1.12.0.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				74,48	-	50,00	50,00	-	37,24	37,24	
1.12.0.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				323,64	-	50,00	50,00	-	161,82	161,82	
1.12.0.13.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				558,80	-	50,00	50,00	-	279,40	279,40	
1.12.0.14.	CONTATOR MODULAR 2 POLOS 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				212,85	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.15.	TIMER DIGITAL TRILHO DIN 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				134,20	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.16.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				65,76	-	100,00	100,00	-	65,76	65,76	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.12.0.17.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				164,32	-	100,00	100,00	-	164,32	164,32	
1.12.0.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				867,20	-	100,00	100,00	-	867,20	867,20	
1.12.0.19.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				229,48	-	100,00	100,00	-	229,48	229,48	
1.12.0.20.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				134,63	-	100,00	100,00	-	134,63	134,63	
1.12.0.21.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				216,55	-	100,00	100,00	-	216,55	216,55	
1.12.0.22.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				400,44	-	100,00	100,00	-	400,44	400,44	
1.12.0.23.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				6.588,70	50,00	40,00	90,00	3.294,35	2.635,48	5.929,83	
1.12.0.24.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				936,36	100,00	-	100,00	936,36	-	936,36	
1.12.0.25.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				213,66	-	100,00	100,00	-	213,66	213,66	
1.12.0.26.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				42,28	-	100,00	100,00	-	42,28	42,28	
1.12.0.27.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				26,20	-	100,00	100,00	-	26,20	26,20	
1.12.0.28.	PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				131,24	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.29.	LUSTRE PENDENTE CRISTAL 80CM COM 18 LÂMPADAS HALOPIN G9 9W, INCLUSO CABO DE AÇO PARA LUSTRE 1,2X5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				8.136,43	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.30.	LUSTRE PENDENTE CRISTAL 80CM COM 18 LÂMPADAS HALOPIN G9 5W, INCLUSO CABO DE AÇO PARA LUSTRE 1,2X5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				47.092,02	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.31.	REFLETOR LED IP 66 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				4.657,20	-	-	-	-	-	-	
1.12.0.32.	SPOT LED EMBUTIR QUADRADO 3000K 11W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2.687,04	-	45,83	45,83	-	1.231,47	1.231,47	
1.12.0.33.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 52 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.784,41	-	100,00	100,00	-	1.784,41	1.784,41	
1.13.	SPDA				129,29	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.1.	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE REFORÇADO PARA DOIS CABOS E UMA HASTE, PARA CABOS DE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				23,34	-	-	-	-	-	-	
1.13.0.2.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017				105,95	-	-	-	-	-	-	
1.14.	REVESTIMENTOS				179.248,89	13,57	13,39	26,96	24.324,35	23.994,66	48.319,01	
1.14.1.	Pisos				85.067,89	19,37	25,42	44,79	16.477,71	21.622,47	38.100,18	
1.14.1.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021				124,33	100,00	-	100,00	124,33	-	124,33	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.14.1.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_ 08/2017				940,77	100,00	-	100,00	940,77	-	940,77	
1.14.1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 07/2016				15.412,61	100,00	-	100,00	15.412,61	-	15.412,61	
1.14.1.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021				4.795,39	-	100,00	100,00	-	4.795,39	4.795,39	
1.14.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 06/2014				779,61	-	100,00	100,00	-	779,61	779,61	
1.14.1.6.	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				11.022,67	-	90,00	90,00	-	9.920,40	9.920,40	
1.14.1.7.	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_ 09/2020				42.915,70	-	-	-	-	-	-	
1.14.1.8.	DEGRAU PARA ESCADA DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2.069,09	-	-	-	-	-	-	
1.14.1.9.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020				6.807,86	-	90,00	90,00	-	6.127,07	6.127,07	
1.14.1.10.	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_ 09/2020				199,86	-	-	-	-	-	-	
1.14.2.	Paredes				15.332,59	-	12,98	12,98	-	1.990,18	1.990,18	
1.14.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.990,18	-	100,00	100,00	-	1.990,18	1.990,18	
1.14.2.2.	REVESTIMENTO DE TIJOLINHO NATURAL RÚSTICO 25X7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				13.342,41	-	-	-	-	-	-	
1.14.3.	Forro				78.848,41	9,95	0,48	10,44	7.846,64	382,01	8.228,65	
1.14.3.1.	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				78.466,40	10,00	-	10,00	7.846,64	-	7.846,64	
1.14.3.2.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_ 05/2017_P				382,01	-	100,00	100,00	-	382,01	382,01	
1.15.	ESQUADRIAS				179.932,05	83,06	9,77	92,84	149.458,62	17.583,37	167.041,99	
1.15.1.	Fachada				175.833,67	85,00	10,00	95,00	149.458,62	17.583,37	167.041,99	
1.15.1.1.	FACHADA EM VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, COM PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, INCLUSO PORTAS SANFONADAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, COM FECHADURAS E PUXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				175.833,67	85,00	10,00	95,00	149.458,62	17.583,37	167.041,99	
1.15.2.	Portas de Madeira				4.098,38	-	-	-	-	-	-	
1.15.2.1.	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019				1.167,52	-	-	-	-	-	-	
1.15.2.2.	PORTA DE MADEIRA DE CORRER EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90x210CM, INCLUSO TRILHO, PORTA, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.153,14	-	-	-	-	-	-	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.15.2.3.	PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO (PESADA OU SUPERPESADA), 2 FOLHAS, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BATENTE, ALIZAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.777,72	-	-	-	-	-	-	
1.16.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				6.341,77	-	10,38	10,38	-	658,45	658,45	
1.16.0.1.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				191,93	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				658,45	-	100,00	100,00	-	658,45	658,45	
1.16.0.3.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				116,68	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.4.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				120,40	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.5.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				60,20	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.6.	BANCADA DE GRANITO, DE 1,30 X 0,55 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE SAIA E RODAPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1.148,66	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.7.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				787,03	-	-	-	-	-	-	
1.16.0.8.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020				3.258,42	-	-	-	-	-	-	
1.17.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO				121.243,46	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.1.	GUARDA-CORPO EM BALAUSTRÉS DE MADEIRA ITAÚBA PINTADO NA COR BRANCA COM ALTURA DE 1,10M, COM UMA PORTA EM BALAUSTRÉ 70X110CM, INCLUSIVE CORRIMÃO INSTALADO A 92CM DE ALTURA NA ESCADA CONFORME PROJETO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO				106.776,26	-	-	-	-	-	-	
1.17.0.2.	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P				14.467,20	-	-	-	-	-	-	
1.18.	PINTURA				15.774,96	-	-	-	-	-	-	
1.18.1.	Piso				5.644,96	-	-	-	-	-	-	
1.18.1.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021				581,07	-	-	-	-	-	-	
1.18.1.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021				5.063,89	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.	Forro				10.130,00	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021				1.043,52	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021				8.993,62	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				12,59	-	-	-	-	-	-	
1.18.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				80,27	-	-	-	-	-	-	
1.19.	DETALHES E ACESSÓRIOS				36.248,53	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.1.	EXAUSTOR E DUTO DE VENTILAÇÃO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				702,04	-	-	-	-	-	-	

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.19.0.2.	CHAPÉU ALETADO PARA CHAMINÉ EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EPÓXI, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.175,01	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.3.	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				24.574,00	-	-	-	-	-	-	
1.19.0.4.	CORTINA DE AR PARA PORTAS DE 250CM DE LARGURA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				7.797,48	-	-	-	-	-	-	
1.20.	PSCIP				2.196,27	-	81,08	81,08	-	1.780,77	1.780,77	
1.20.0.1.	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG - 2A - 20B:C COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.232,20	-	100,00	100,00	-	1.232,20	1.232,20	
1.20.0.2.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				423,12	-	70,00	70,00	-	296,18	296,18	
1.20.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				166,44	-	80,00	80,00	-	133,15	133,15	
1.20.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 22X22CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				149,05	-	80,00	80,00	-	119,24	119,24	
1.20.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 78X45CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820				225,46	-	-	-	-	-	-	
1.21.	ÁREA EXTERNA				542.440,11	51,69	10,78	62,47	280.377,30	58.472,53	338.849,83	
1.21.1.	Infraestrutura para Irrigação				14.372,91	91,12	-	91,12	13.096,22	-	13.096,22	
1.21.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				4.131,56	100,00	-	100,00	4.131,56	-	4.131,56	
1.21.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				1.594,30	100,00	-	100,00	1.594,30	-	1.594,30	
1.21.1.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				2.667,55	90,00	-	90,00	2.400,80	-	2.400,80	
1.21.1.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				1.252,01	90,00	-	90,00	1.126,81	-	1.126,81	
1.21.1.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				3.128,10	100,00	-	100,00	3.128,10	-	3.128,10	
1.21.1.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				392,80	90,00	-	90,00	353,52	-	353,52	
1.21.1.7.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				506,70	-	-	-	-	-	-	
1.21.1.8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				108,55	-	-	-	-	-	-	
1.21.1.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				9,21	90,00	-	90,00	8,29	-	8,29	
1.21.1.10.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				392,04	90,00	-	90,00	352,84	-	352,84	
1.21.1.11.	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP. DE 1"				40,68	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA					TOTAL:	1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.21.1.12.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016				88,38	-	-	-	-	-	-	
1.21.1.13.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014				24,12	-	-	-	-	-	-	
1.21.1.14.	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"				36,91	-	-	-	-	-	-	
1.21.2.	Drenagem				84.007,03	77,24	9,65	86,89	64.891,14	8.105,62	72.996,76	
1.21.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021				5.533,58	100,00	-	100,00	5.533,58	-	5.533,58	
1.21.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016				1.882,09	100,00	-	100,00	1.882,09	-	1.882,09	
1.21.2.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.				44.754,30	100,00	-	100,00	44.754,30	-	44.754,30	
1.21.2.4.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40M x 0,40M X VARIÁVEL.				14.523,32	50,00	15,00	65,00	7.261,66	2.178,50	9.440,16	
1.21.2.5.	CANALETA DE CONCRETO L:15CM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				11.854,23	-	50,00	50,00	-	5.927,12	5.927,12	
1.21.2.6.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF 07/2021				5.459,51	100,00	-	100,00	5.459,51	-	5.459,51	
1.21.3.	Iluminação				94.348,48	42,87	4,53	47,41	40.451,63	4.274,42	44.726,05	
1.21.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021				5.885,37	100,00	-	100,00	5.885,37	-	5.885,37	
1.21.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016				2.251,59	100,00	-	100,00	2.251,59	-	2.251,59	
1.21.3.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				5.010,00	30,00	30,00	60,00	1.503,00	1.503,00	3.006,00	
1.21.3.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				7.464,75	30,00	30,00	60,00	2.239,43	2.239,42	4.478,85	
1.21.3.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				4.416,00	30,00	-	30,00	1.324,80	-	1.324,80	
1.21.3.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020				7.199,92	80,00	-	80,00	5.759,94	-	5.759,94	
1.21.3.7.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				3.762,00	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.8.	CONTATOR MODULAR 2 POLOS 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				211,15	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.9.	TIMER DIGITAL TRILHO DIN 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				133,13	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.10.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				108,42	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.11.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				81,52	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.12.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				172,06	-	-	-	-	-	-	
1.21.3.13.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				430,15	-	-	-	-	-	-	

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA											
TOTAL:					1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.21.3.14.	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO NORMA DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				277,52	-	-	-	-	-	-
1.21.3.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				2.660,00	50,00	20,00	70,00	1.330,00	532,00	1.862,00
1.21.3.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				5.805,50	100,00	-	100,00	5.805,50	-	5.805,50
1.21.3.17.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				55,41	-	-	-	-	-	-
1.21.3.18.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				141,32	-	-	-	-	-	-
1.21.3.19.	BALIZADOR EXTERNO RETANGULAR 5W IP67 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				19.260,98	-	-	-	-	-	-
1.21.3.20.	SUPERPOSTE DE CONCRETO ARMADO, CÔNICO CONTÍNUO, 12M DE ALTURA TOTAL, 170MM NO TOPO, CONTENDO SUPORTE PARA CONEXÃO DAS LUMINÁRIAS DE 4 PÉTALAS EM LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				28.704,00	50,00	-	50,00	14.352,00	-	14.352,00
1.21.3.21.	CONTATOR TRIPOLAR 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				317,69	-	-	-	-	-	-
1.21.4.	Pisos e Canteiros				265.387,45	50,53	17,37	67,90	134.110,16	46.092,49	180.202,65
1.21.4.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017				4.796,61	100,00	-	100,00	4.796,61	-	4.796,61
1.21.4.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				18.466,47	100,00	-	100,00	18.466,47	-	18.466,47
1.21.4.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021				36.022,14	100,00	-	100,00	36.022,14	-	36.022,14
1.21.4.4.	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)				24.962,43	100,00	-	100,00	24.962,43	-	24.962,43
1.21.4.5.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, PAGINAÇÃO PADRÃO PATO BRANCO 2 CORES, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE				27.202,78	10,00	50,00	60,00	2.720,28	13.601,39	16.321,67
1.21.4.6.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, 1 COR, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE				72.682,83	-	40,00	40,00	-	29.073,13	29.073,13
1.21.4.7.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM TÁTIL DIRECIONAL ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE				7.659,88	-	40,00	40,00	-	3.063,95	3.063,95
1.21.4.8.	PISO VIBRO PRENSADO MARMORIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA 40X40CM TÁTIL ALERTA ESPESSURA MÍNIMA DE 1,8CM, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA E REJUNTE				885,06	-	40,00	40,00	-	354,02	354,02

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	INÍCIO DE OBRA 17/01/23
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA L. RITA - EIRELI	CNPJ 27.541.407/0001-82	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 21/11/2023 a 07/02/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 61,42%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CASA TEMÁTICA											
TOTAL:					1.782.530,83	54,11	7,31	61,42	964.560,29	130.264,97	1.094.825,26
1.21.4.9.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016				24.604,93	-	-	-	-	-	-
1.21.4.10.	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018				48.104,32	98,00	-	98,00	47.142,23	-	47.142,23
1.21.5.	Escadas e Muros de Pedra				30.487,36	91,28	-	91,28	27.828,15	-	27.828,15
1.21.5.1.	MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA				25.618,32	90,00	-	90,00	23.056,49	-	23.056,49
1.21.5.2.	ESCADA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA				4.869,04	98,00	-	98,00	4.771,66	-	4.771,66
1.21.6.	Parede Verde				53.836,88	-	-	-	-	-	-
1.21.6.1.	PAREDE VERDE 6,00X2,50M EM ESTRUTURA METÁLICA COM KIT PARA JARDIM VERTICAL CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				39.468,00	-	-	-	-	-	-
1.21.6.2.	PAREDE VERDE 5,16X2,50M EM ESTRUTURA METÁLICA COM KIT PARA JARDIM VERTICAL CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				14.368,88	-	-	-	-	-	-
1.22.	SERVIÇOS FINAIS				1.906,74	-	-	-	-	-	-
1.22.0.1.	LIMPEZA DE PISO DE MADEIRA				549,86	-	-	-	-	-	-
1.22.0.2.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019				10,01	-	-	-	-	-	-
1.22.0.3.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019				82,29	-	-	-	-	-	-
1.22.0.4.	LIMPEZA DE VIDRO				1.264,58	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR

Local

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Fernanda Zianni Manarim

Profissão: Engenheira Civil

CREA/CAU 107.389/D

ART/RRT: 1720230913036

Documento assinado digitalmente



FERNANDA ZIANNI MANARIM

Data: 15/02/2024 09:19:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construção De Casa Temática com área de 229,98 m² e revitalização de Praça de Transição e Sacra com área de 2.230,00 m², localizadas no lote 04 da quadra 014, no município de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CONTRATO Nº362/2022-GP

Relatório de Medição nº 07



Empresa Contratada: L. RITA - EIRELI

Responsável técnico: Josias Junior Orben



Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a sétima medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:






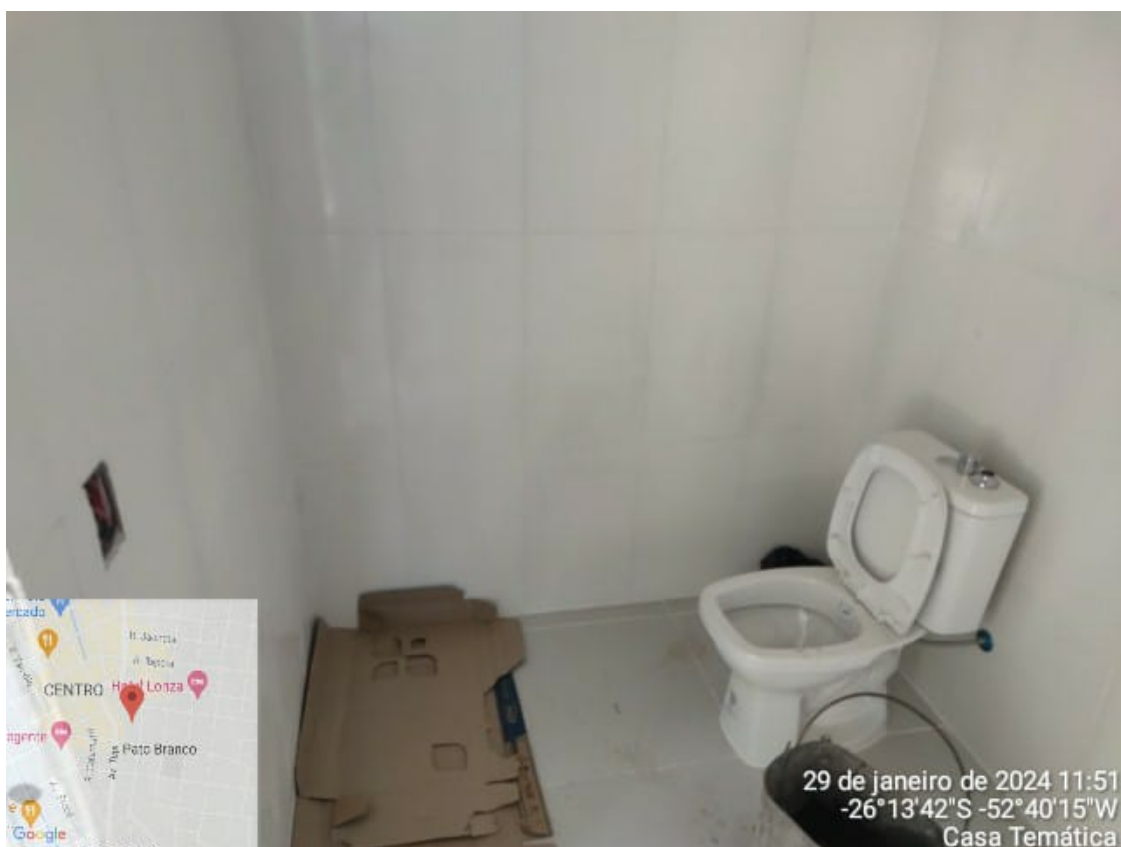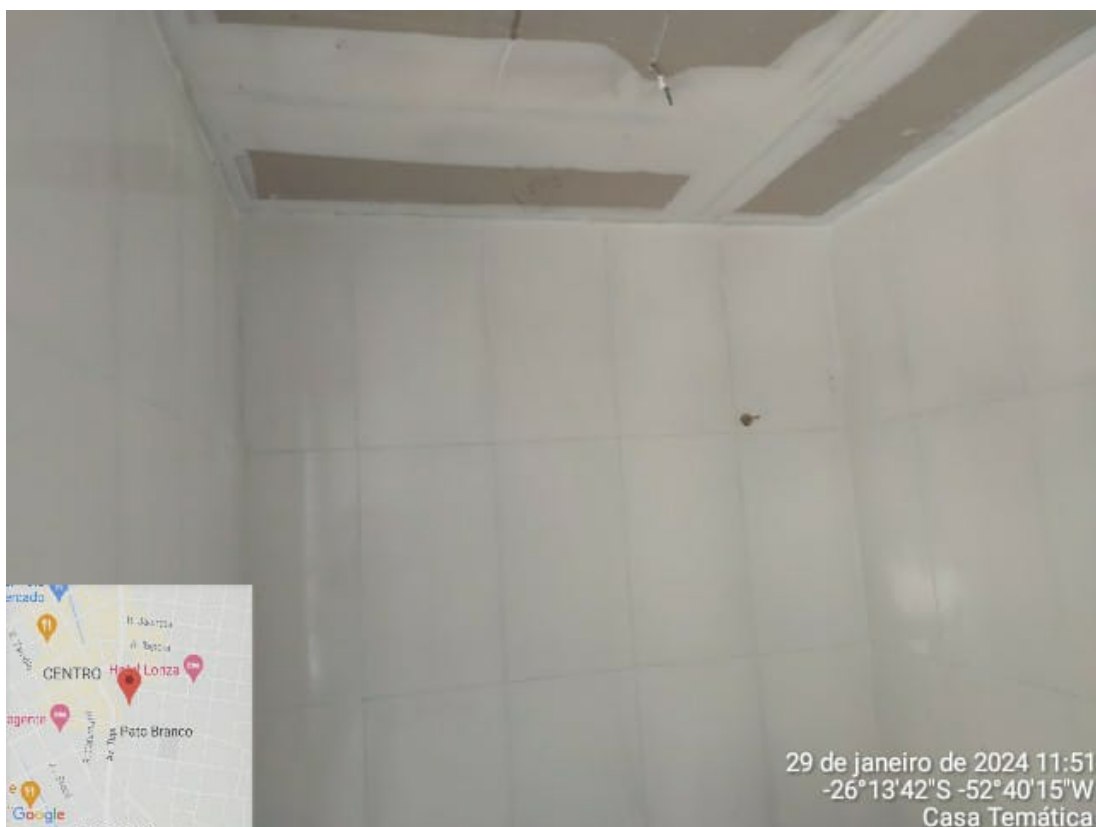



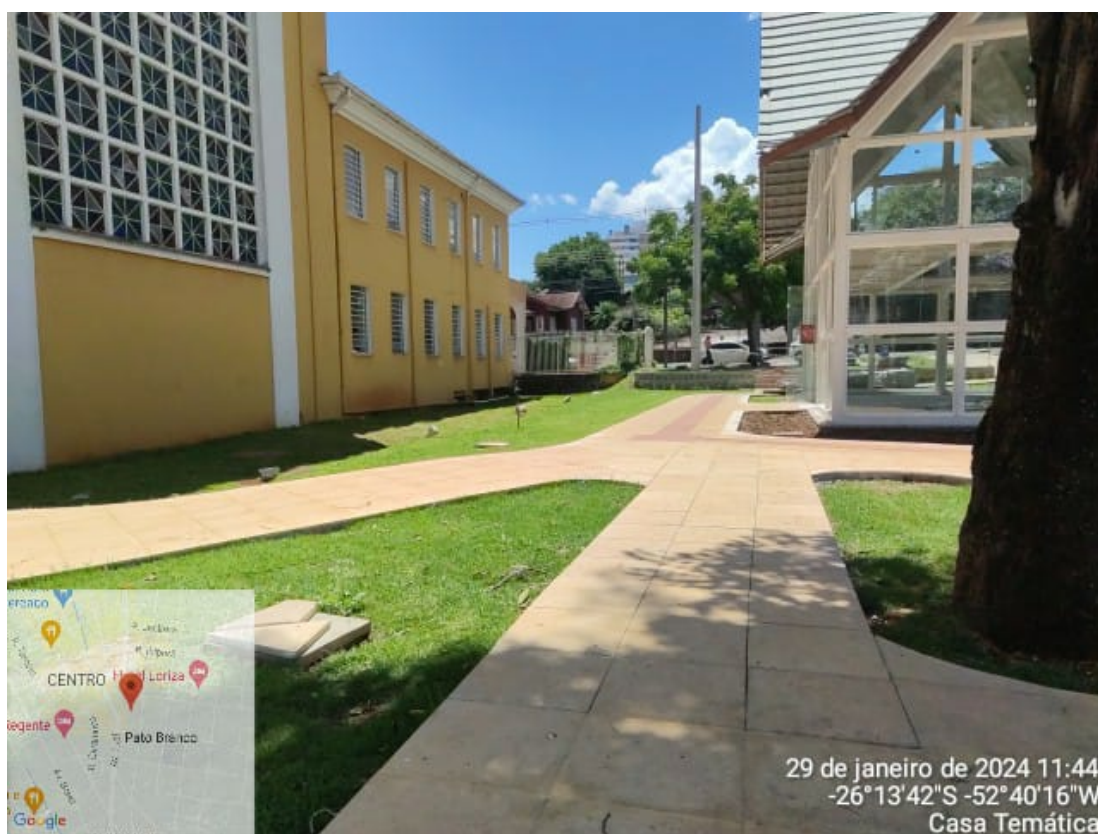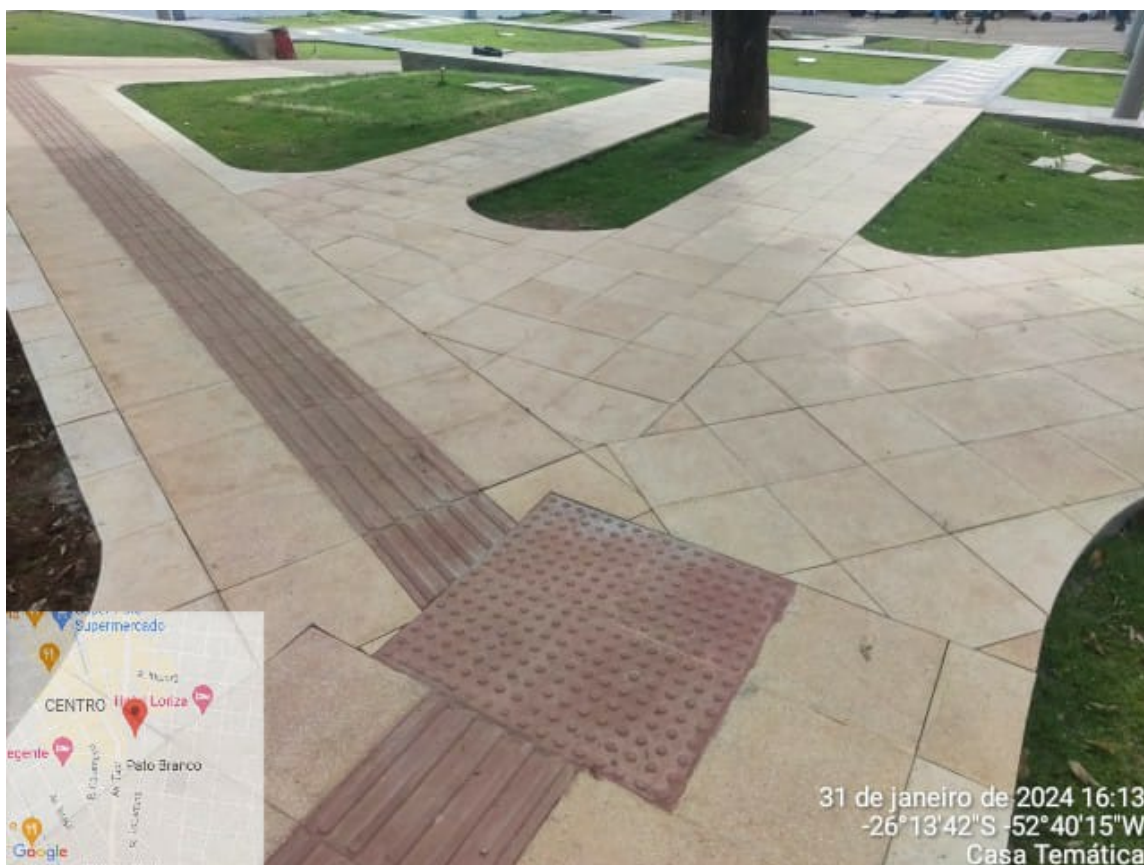

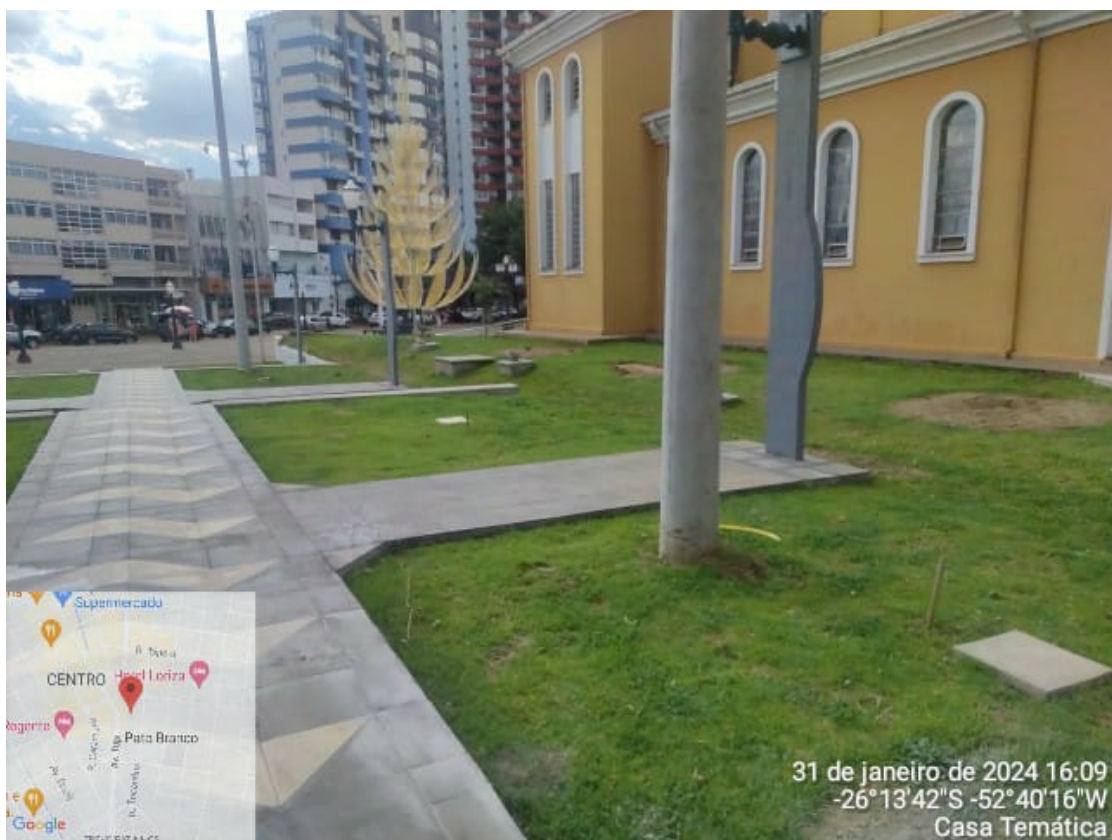



Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 130.264,97**.

Pato Branco, 07 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 15/02/2024 09:19:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
