



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop	
PARCELA		1ª		DATA		26/07/2024 - sex	
CONTRATO EMPREITADA:		Nº		17/2024		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº		1		Nº			
DATA:		09/02/2024		DATA			

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA - Sudoeste
FIRMA EMPREITEIRA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI

Mês	Jul
SAM	74
Lote	1
Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1

1	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	161,60	100,00%	0,0212	2,12%	70,63	11.413,81	11.413,81	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-				-	-	-	-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	94,45	100,00%	0,0260	2,60%	148,60	14.035,27	14.035,27	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	83,33%	0,0166	1,38%	1.493,67	7.468,35	8.962,02	1.493,67
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0058	0,58%	3.120,36	3.120,36	3.120,36	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,75	100,00%	0,0004	0,04%	16,97	199,40	199,40	-
	2.1.6		REATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,52	100,00%	0,0002	0,02%	38,96	98,18	98,18	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	146,00	100,00%	0,0026	0,26%	9,50	1.387,00	1.387,00	-
	2.3.9		TUBOS DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	130,60	100,00%	0,0192	1,92%	79,17	10.339,60	10.339,60	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-				-	-	-	-
	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.5 M. AF_12/2020	UN	2,00	100,00%	0,0012	0,12%	330,30	660,60	660,60	-
	2.4.7		RALOS		-				-	-	-	-
	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	100,00%			20,70	20,70	20,70	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	1ª	DATA	26/07/2024 - sex
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO:									ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITERA:									Nº	17/2024	Nº	
									DATA:	09/02/2024	DATA	
MÉDIA DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO (ARGILA, COM TRANSPORTE ATÉ 10KM), ESCAVACÃO. CARGA E TRANSPORTE.	M3	426,38	100,00%	0,0532	5,32%	67,26	28.678,32	28.678,32	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CANAleta DE CONCRETO COM GELHA DE CONCRETO - TIPO MEIA CANA DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL - INCLUI ESCAVACÃO FORNECIMENTO E INSTALACÃO	M	75,40	100,00%	0,0162	1,62%	116,20	8.761,48	8.761,48	-
3	3		FUNDACOES						-	-	-	-
	3.9		RADIER / OUTROS		-				-	-	-	-
	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	M2	860,00	100,00%	0,0053	0,53%	3,35	2.881,00	2.881,00	-
4	4		ESTRUTURAS						-	-	-	-
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF. 08/2017	M3	5,60	100,00%	0,0013	0,13%	124,25	695,80	695,80	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3) ESPESSURA 3,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	5,11	100,00%	0,0010	0,10%	110,42	564,24	564,24	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0) ESPESSURA 5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	7,30	100,00%	0,0017	0,17%	127,32	929,44	929,44	-
5	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-				-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-				-	-	-	-
	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRFPARO MANIAL. AF. 12/2021	M2	45,80	100,00%	0,0056	0,56%	65,65	3.006,77	3.006,77	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
	COTAÇÃO	COTAÇÃO	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	692,25	72,23%	0,2036	14,71%	158,65	79.325,00	109.825,46	30.500,46
6	7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS						-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-				-	-	-	-
	COTAÇÃO 32	COTAÇÃO	PORTÃO DE GIRO EM TLA DE ALAMBRADO 7X7 COM FIO 12	UN	1,00	100,00%	0,0032	0,32%	1.740,99	1.740,99	1.740,99	-
7	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	320,00	100,00%	0,0099	0,99%	16,65	5.328,00	5.328,00	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-	-	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	1ª	DATA	26/07/2024 - sex
									Mês	Jul		
									SAM	74		
									Lote	1		
									Ano	2024		
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:									Nº	17/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:									DATA:	09/02/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	100,00%	0,0003	0,03%	18,00	162,00	162,00	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	100,00%	0,0003	0,03%	23,66	141,96	141,96	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00		0,0021		4,62	-	1.155,00	1.155,00
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00		0,0004		10,70	-	224,70	224,70
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	100,00%	0,0015	0,15%	112,77	789,39	789,39	-
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0015		797,60	-	797,60	797,60
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00				12,69	-	12,69	12,69
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		81,36	-	81,36	81,36
	8.2.11.3		TRIPOLARES		-				-	-	-	-
	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,0003		83,30	-	166,60	166,60
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0001		45,14	-	45,14	45,14
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	16.105.0000	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00		0,0048		2.614,11	-	2.614,11	2.614,11
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67	UNID	17,00		0,0381		1.208,12	-	20.538,04	20.538,04
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETORES LED 200W IP-67	UNID	4,00		0,0188		2.541,43	-	10.165,72	10.165,72



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	1ª	DATA	26/07/2024 - sex
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO:									ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITERA:									Nº	17/2024	Nº	
									DATA:	09/02/2024	DATA	
MÉDIA DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00		0,0042		125,43	-	2.257,74	2.257,74
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CABO DE ALUMINIO SINGELO UNIPOLAR 10 MM² - ISOLADO XLPE - 0,6/1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.100,00		0,0148		7,25	-	7.975,00	7.975,00
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		0,0004		95,99	-	191,98	191,98
8	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	178,53	178,53	178,53	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	285,97	285,97	285,97	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	159,78	159,78	159,78	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	98,63	98,63	98,63	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	61,10	100,00%	0,0017	0,17%	14,91	911,00	911,00	-
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	100,00%			12,31	24,62	24,62	-
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	100,00%			11,37	22,74	22,74	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,50	100,00%	0,0002	0,02%	43,55	108,88	108,88	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,38	30,38	30,38	-
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	29,50	29,50	29,50	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0016	0,16%	876,49	876,49	876,49	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop										
									Mês		Jul		PARCELA		1ª		DATA		26/07/2024 - sex						
MUNICÍPIO:									PATO BRANCO									SAM		74		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:									PRAÇA - Sudoeste									Lote		1		Nº		17/2024	
FIRMA EMPREITERA:									ERGE CONSTRUTORA EIRELI									Ano		2024		DATA:		09/02/2024	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS														ORÇAMENTO											
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato													
9	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-													
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-				-	-	-	-													
	10.1.2		CHAPISCO		-				-	-	-	-													
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	91,60	100,00%	0,0013	0,13%	7,76	710,81	710,81	-													
	10.1.3		EMBOCO		-				-	-	-	-													
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	91,60	100,00%	0,0102	1,02%	59,93	5.489,59	5.489,59	-													
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-													
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-													
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	748,00	100,00%	0,0540	5,40%	38,94	29.127,12	29.127,12	-													
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	748,00	100,00%	0,1150	11,50%	82,92	62.024,16	62.024,16	-													
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	112,00	44,64%	0,0201	0,90%	96,57	4.828,50	10.815,84	5.987,34														
x			SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-													
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	105,00	47,62%	0,0163	0,78%	83,87	4.193,50	8.806,35	4.612,85													
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	41,00	48,78%	0,0079	0,39%	104,59	2.091,80	4.288,19	2.196,39													
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DILUENTE	M2	748,00	100,00%	0,1255	12,55%	90,48	67.679,04	67.679,04	-													
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COI ADO COM COI A PU MONOCOMPONENTE	M2	112,00		0,0547		263,69	-	29.533,28	29.533,28													
10	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-													
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-													
	11.1.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-													
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.559,50		0,0013		0,46	-	717,37	717,37													
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-													
	11.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-													
	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	150,00		0,0011		3,83	-	574,50	574,50													
	x			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-			-	-	-	-													



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL				Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop	
PARCELA				1ª		DATA		26/07/2024 - sex	
CONTRATO EMPREITADA:				Nº		17/2024		ORDEM DE SERVIÇO:	
DATA:				Ano		09/02/2024		Nº	
Mês				Jul		2024		DATA	
MUNICÍPIO:				SAM		74			
SUBPROJETO:				Lote		1			
FIRMA EMPREITEIRA:				Ano		2024			
PATO BRANCO									
PRAÇA - Sudoeste									
ERGE CONSTRUTORA EIRELI									

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2,00		0,0088		2.361,59	-	4.723,18	4.723,18
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0051		2.729,61	-	2.729,61	2.729,61
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA PLAYGROUND TRÊS TORRES - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00		0,0078		2.092,58	-	4.185,16	4.185,16
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	UN	1,00		0,0808		43.566,49	-	43.566,49	43.566,49
11	12		LIMPEZAS		-				-	-	-	-
	12.1		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		-				-	-	-	-
	99814	SINAPI		M2	748,00		0,0033		2,37	-	1.772,76	1.772,76
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-

GLOBAL - LOTE 1					% PREVISTO	11,74%	% EXECUTADO :	66,85%	SOMAS	360.618,70	539.437,44	178.818,74
-----------------	--	--	--	--	------------	--------	---------------	--------	-------	------------	------------	------------

OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$539.437,44	
									Medição Acumulada:		360.618,70	
									Total Anterior:		-	
									Valor Desta Medição:		R\$360.618,70	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
MARCOS VINICIUS GOMES 07976998994				gov.br ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES Data: 09/12/2024 09:11:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br				ROBSON CANTU:44143664968 3664968				
ERGE CONSTRUTORA EIRELI MARCOS VINICIUS GOMES ARQ.URB. CAU A129307-9				PREF. MUN. DE PATO BRANCO FISCAL: Antônio Alexandre Otto Guibes ENGº CIVIL - CREA PR-178.408/D				PREFEITO DE PATO BRANCO ROBSON CANTU				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
PROJETO : PRAÇA - Sudoeste
CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

MEDICÃO Nº: 1ª
DATA DA MEDIÇÃO : 26/07/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/08/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/02/2025

EMPRESA VENCEDORA : ERGE CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATO EMPREITADA Nº: 17/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO : 539.437,44
SAM : Nº. 74
LOTE : Nº. 1

DATA : 09/02/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	37.531,46	96,02%	37.531,46	36.037,79
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	50,00%	25.072,64	100,00%	50.145,28	50.145,28
3	3	FUNDAÇÕES	25,00%	720,25	100,00%	2.881,00	2.881,00
4	4	ESTRUTURAS	-	-	100,00%	2.189,48	2.189,48
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	72,97%	112.832,23	82.331,77
6	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	100,00%	1.740,99	1.740,99
7	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	12,20%	52.647,03	6.421,35
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	100,00%	2.726,52	2.726,52
9	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	80,62%	218.474,38	176.144,52
10	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	-	-	-	56.496,31	-
11	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	1.772,76	-
12			-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA			63.324,35		TOTAL MEDIÇÃO		360.618,70

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
	36.037,79	96,02%
	50.145,28	100,00%
	2.881,00	100,00%
	2.189,48	100,00%
	82.331,77	72,97%
	1.740,99	100,00%
	6.421,35	12,20%
	2.726,52	100,00%
	176.144,52	80,62%
	-	-
	-	-
	-	-
OK	Parcial	
Acumulado	Destas	
Med. Anterior	Medição	
-	360.618,70	

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$360.618,70

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994

Dir. Civil: Cuiçabá-CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF AL, OU=EM BRANCO, CN=366236030344, OU=eletronetconferencia, CN=MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994

Resumo: Este documento contém os termos eletrônicos por minha assinatura neste documento

Localização: Rua Washington de Assunção aqui

Data: 2024.12.09 09:59:28

Formato: PDF Versão: 1.0.1.0

Documento assinado digitalmente

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 09/12/2024 09:11:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968

68

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968

Dados: 2024.12.09 09:59:28

-03'00'

ERGE CONSTRUTORA EIRELI

MARCOS VINICIUS GOMES

ARQ.URB. CAU A129307-9

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: Antônio Alexandre Otto Guibes

ENGº CIVIL - CREA PR-178.408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU

Página 1 de 1

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI
Contrato Nº:	17/2024
Data da Vistoria:	26/07/2024

Objeto:

Revitalização da Praça Sudoeste, contendo: quadrapoliesportiva, playground, área de convivência e acessos em paver.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **19/02/2024** até **26/07/2024**.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA




1 | DETALHE DA PLACA

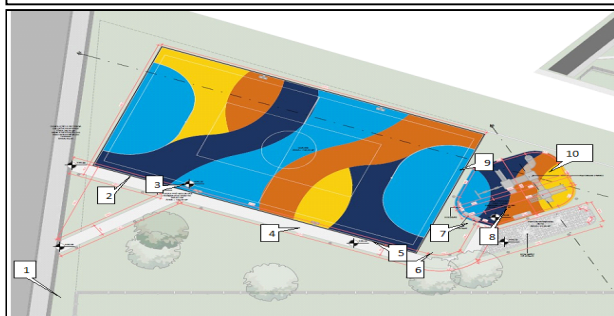


5 | Mapa



2 | quadra e alambrado

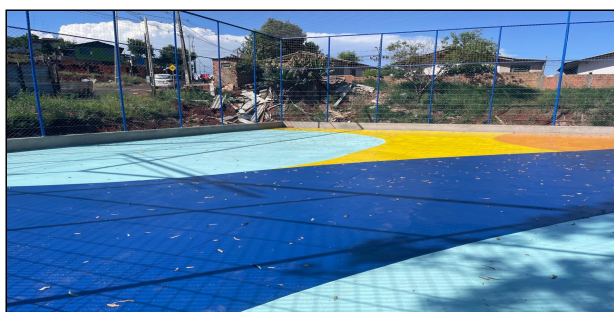

3 | quadra

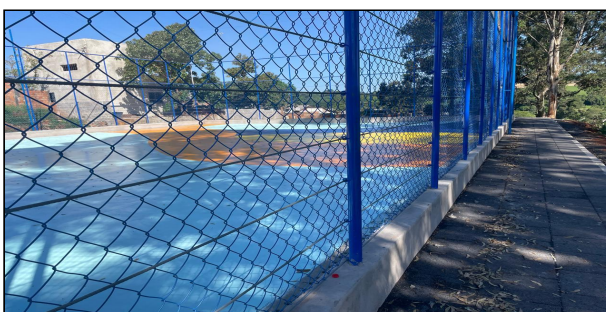

4 | quadra e alambrado



5 | quadra e alambrado



6 | calçadas e alambrado



7 | calçadas e mesas



8 | calçadas e mesas



9 | quadra e alambrado



10 | mesas

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19325/medicao/13675/relatorio-fotografico/2689>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 03 de dezembro de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D

Documento assinado eletronicamente por:
Antonio Alexandre Otto Guibes (03/12/2024 10:17:26)

Nome/controle do arquivo:
2024120310172687.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024120310172687>
