



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
94	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	(SELECIONAR)		3
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			05/10/2023 a 20/12/2023		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Escola Municipal Maria Jurema Ceni					TOTAL:	-	-	-	798.298,61	36.271,09	834.569,70
1.	TELHADOS	-	-	-	834.569,70	-	-	-	798.298,61	36.271,09	834.569,70
1.1.	Serviços Iniciais	-	-	-	9.600,00	-	-	-	9.120,00	480,00	9.600,00
1.1.1.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	25,00	5.000,00	190,00	10,00	200,00	4.750,00	250,00	5.000,00
1.1.2.	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,00	4.600,00	190,00	10,00	200,00	4.370,00	230,00	4.600,00
1.2.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	676.144,00	-	-	-	666.034,00	10.110,00	676.144,00
1.2.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.840,00	62,00	114.080,00	1.840,00	-	1.840,00	114.080,00	-	114.080,00
1.2.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	4,00	7.360,00	1.840,00	-	1.840,00	7.360,00	-	7.360,00
1.2.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	7,00	12.880,00	1.840,00	-	1.840,00	12.880,00	-	12.880,00
1.2.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.840,00	225,00	414.000,00	1.840,00	-	1.840,00	414.000,00	-	414.000,00
1.2.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	240,00	120,00	28.800,00	210,00	30,00	240,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00
1.2.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	380,00	75,00	28.500,00	340,00	40,00	380,00	25.500,00	3.000,00	28.500,00
1.2.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.840,00	30,00	55.200,00	1.723,00	117,00	1.840,00	51.690,00	3.510,00	55.200,00
1.2.8.	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	40,00	86,64	3.465,60	40,00	-	40,00	3.465,60	-	3.465,60
1.2.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6.480,00	1,83	11.858,40	6.480,00	-	6.480,00	11.858,40	-	11.858,40
1.3.	Forro de PVC	-	-	-	138.367,20	-	-	-	118.687,46	19.679,74	138.367,20
1.3.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	2,12	3.900,80	1.288,00	552,00	1.840,00	2.730,56	1.170,24	3.900,80
1.3.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.840,00	70,03	128.855,20	1.590,00	250,00	1.840,00	111.347,70	17.507,50	128.855,20
1.3.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	840,00	6,68	5.611,20	690,00	150,00	840,00	4.609,20	1.002,00	5.611,20
1.4.	OUTROS	-	-	-	10.458,50	-	-	-	4.457,15	6.001,35	10.458,50
1.4.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	585,00	9,70	5.674,50	459,50	125,50	585,00	4.457,15	1.217,35	5.674,50
1.4.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.840,00	2,60	4.784,00	-	1.840,00	1.840,00	-	4.784,00	4.784,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
94	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	(SELECIONAR)		3
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			05/10/2023 a 20/12/2023		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Escola Municipal Maria Jurema Ceni					TOTAL:	-	-	-	798.298,61	36.271,09	834.569,70

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO

Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JAKELINE LOUREIRO

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 185508/D

ART/RRT: 1720233708468

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma
digital por JAKELINE
LOUREIRO:0980297
4943
Dados: 2023.12.20
12:03:04 -03'00'



Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados na *ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUREMA CENI*, Rua Araribóia, nº 700, Bairro La Salle, no município de Pato Branco/PR, CEP: 85.505-031

Contrato nº 94/2023/GP


Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*
Responsável: *Lincoln Fernando Machado de Souza*

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:






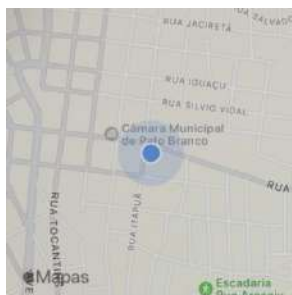


17/11/2023, 09:03
-26.229766,-52.667208
12° N
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni






17/11/2023, 09:04
-26.229655,-52.667071
209° SW
Rua Araribóia, 587
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni



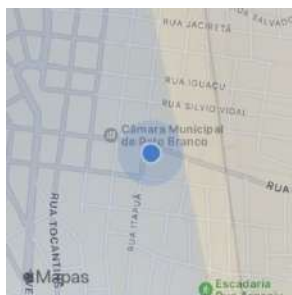

17/11/2023, 09:05
-26.229739,-52.667192
137° SE
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni



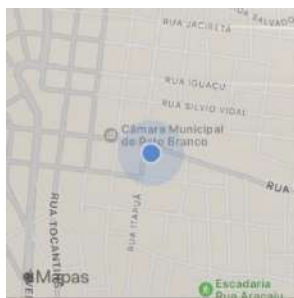

17/11/2023, 09:05
-26.229739,-52.667192
212° SW
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni






17/11/2023, 09:05
-26.229739 -52.667192
309° NW
Rua Itapua, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni




17/11/2023, 09:05
-26.229739,-52.667192
105° E
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni

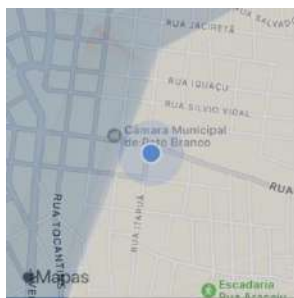

17/11/2023, 09:07
-26.229708,-52.667315
94° E
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni









17/11/2023, 09:08
-26.229774,-52.667216
235° SW
Rua Itapua, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni



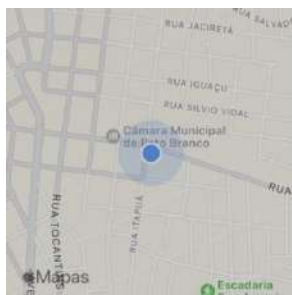

17/11/2023, 09:08
-26.229691,-52.667268
164° S
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni



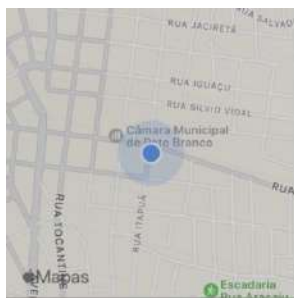

17/11/2023, 09:09
-26.229705,-52.667388
214° SW
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni







17/11/2023, 09:12
-26.229739,-52.667297
109° E
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni




17/11/2023, 09:13
-26.229739,-52.667297
149° SE
Rua Itapuã, 700
Pato Branco
Telhado Jurema Ceni









29/11/2023, 13:58
-26.229737,-52.667366
191° S
Rua Itapua, 700
Pato Branco
Escola Jurema Ceni





12/12/2023, 09:14
278° W
Escola Jurema Ceni







12/12/2023, 09:20
-26.229715,-52.667537
189° S
Escola Jurema Ceni



Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 36.271,10**.

Pato Branco, 20 de dezembro de 2023.

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D
