



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 27 de julho 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 339/2022-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 1.153.225,06	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 09/02/2023	18,95	218.515,00	81,05	R\$ 934.710,06
A liberar 2. ^a Parcela em 25/04/2023	33,87	390.646,96	47,18	R\$ 544.063,10
A liberar 3. ^a Parcela em 27/07/2023	47,18	544.063,10	-	R\$ 0,00

Valor a ser liberado em 27/07/2023 R\$ 544.063,10

Gestora e fiscal do contrato.



Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato



Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / TOMADOR

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

APELO DO EMPREENDIMENTO
0 TROCA DE TELHADOS

INÍCIO DE OBRA
22/09/22

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA
0 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA

CNPJ
10.783.587/0001-96

REGIME DE EXECUÇÃO
(SELECIONAR)

PERÍODO DA MEDIÇÃO
26/04/2023 a 27/07/2023

Nº MEDIÇÃO
3

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtds.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:							
1.1.	TELHADOS	-	-	-	1.153.225,06	-	-	-	609.151,96	544.063,10	1.153.225,06
1.1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	992.027,70	-	-	-	531.132,80	460.894,90	992.027,70
1.1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUIS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	2.115,00	62,00	131.130,00	1.130,00	985,00	2.115,00	70.050,00	61.070,00	131.130,00
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.115,00	4,00	8.460,00	1.130,00	985,00	2.115,00	4.520,00	3.940,00	8.460,00
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.115,00	7,00	14.805,00	1.130,00	985,00	2.115,00	7.970,00	6.895,00	14.805,00
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUIS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	2.115,00	225,00	475.875,00	1.130,00	985,00	2.115,00	254.250,00	221.625,00	475.875,00
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	246,00	120,00	29.520,00	100,00	146,00	246,00	12.000,00	17.520,00	29.520,00
1.1.6.	RUPO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	419,00	75,00	31.425,00	150,00	269,00	419,00	11.250,00	20.175,00	31.425,00
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUIS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	846,00	200,00	169.200,00	546,00	300,00	846,00	109.200,00	60.000,00	169.200,00
1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 160 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	306,00	129,45	39.611,70	100,00	206,00	306,00	12.945,00	26.666,70	39.611,70
1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P	M2	2.115,00	30,00	63.450,00	1.120,00	995,00	2.115,00	33.600,00	29.850,00	63.450,00
1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	150,00	86,64	12.996,00	70,00	80,00	150,00	6.064,80	6.931,20	12.996,00
1.1.11.	"X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	8.500,00	1,83	15.555,00	5.100,00	3.400,00	8.500,00	9.333,00	6.222,00	15.555,00
1.2.	Forro de PVC	-	-	-	154.291,86	-	-	-	76.589,16	77.692,70	154.291,86
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.986,00	2,12	4.210,32	1.060,00	926,00	1.986,00	2.247,20	1.963,12	4.210,32
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	1.986,00	70,03	139.079,58	1.000,00	986,00	1.986,00	70.030,00	69.049,58	139.079,58
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	1.647,00	6,68	11.001,96	647,00	1.000,00	1.647,00	4.321,96	6.680,00	11.001,96
1.3.	OUTROS	-	-	-	6.905,50	-	-	-	1.430,00	5.475,50	6.905,50
1.3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÁCAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	145,00	9,70	1.406,50	-	145,00	145,00	-	1.406,50	1.406,50
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	2.115,00	2,60	5.499,00	550,00	1.565,00	2.115,00	1.430,00	4.069,00	5.499,00

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sígilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0	0	0	0 TROCA DE TELHADOS	22/09/22
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº Medição
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.587/0001-96	(SELECIONAR)	3
			PERÍODO DA MEDIÇÃO	
			26/04/2023 a 27/07/2023	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incl. o Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:					

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local
quinta-feira, 27 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERLANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 0

Adernanda



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA E CMEI MUNICIPAL UNIÃO
CONTRATO Nº339/2022/GP**


Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 544.063,10.

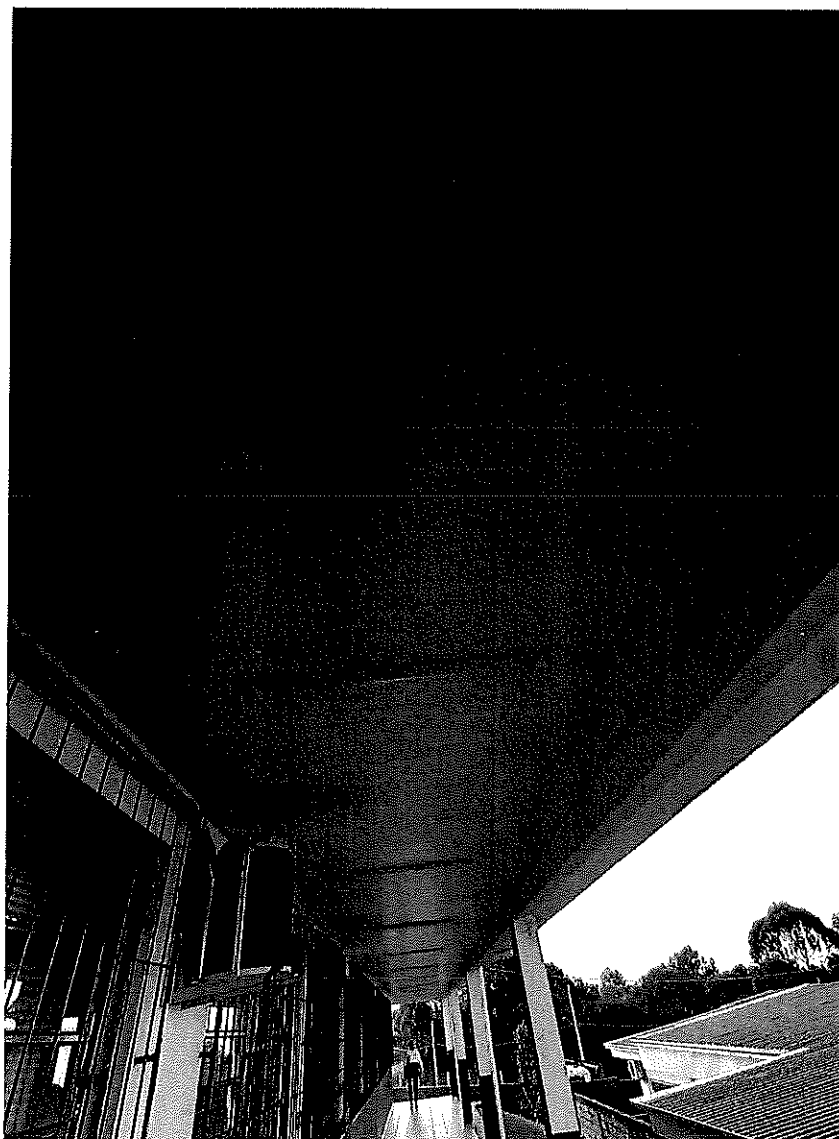










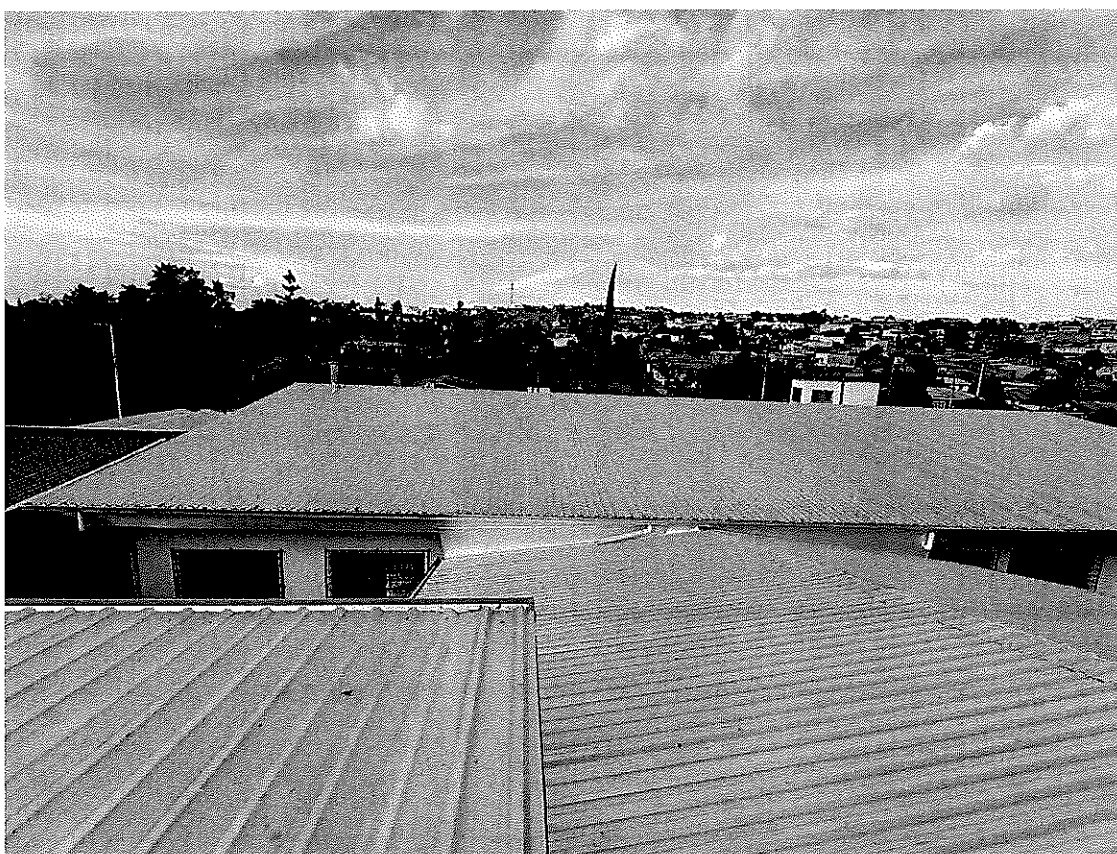


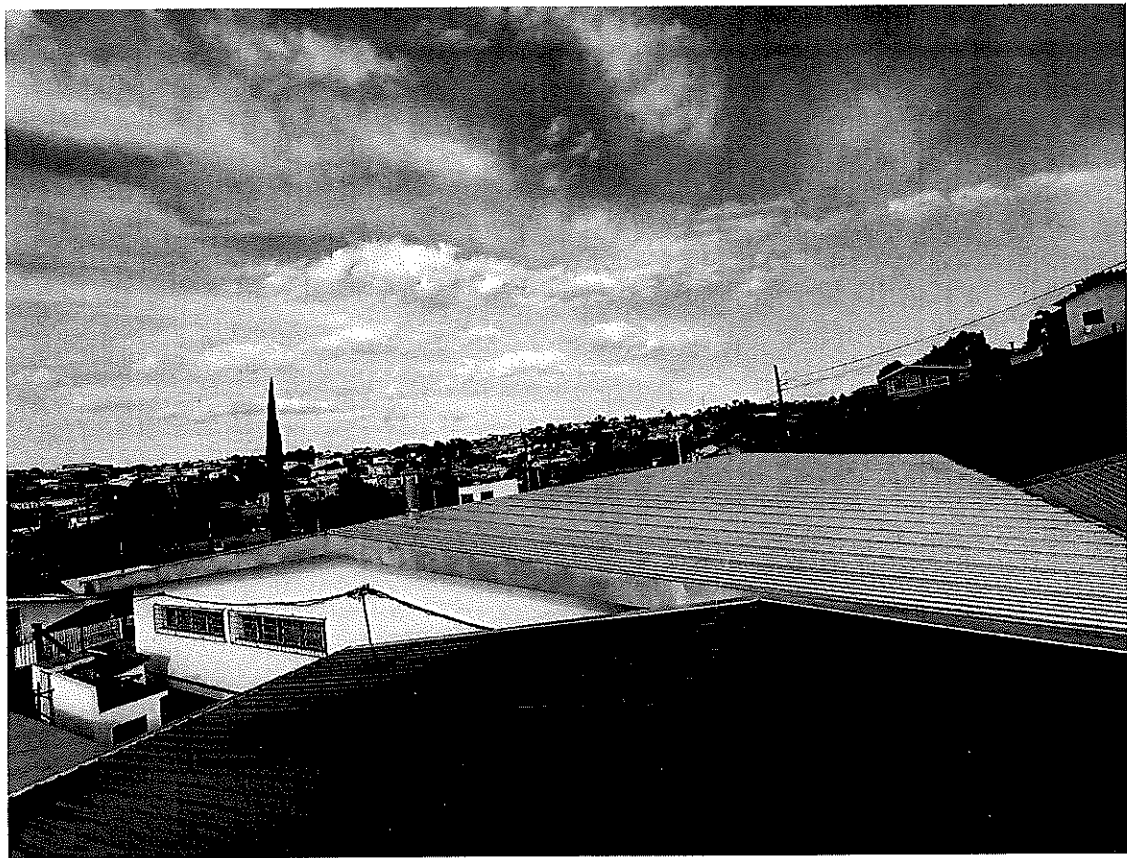


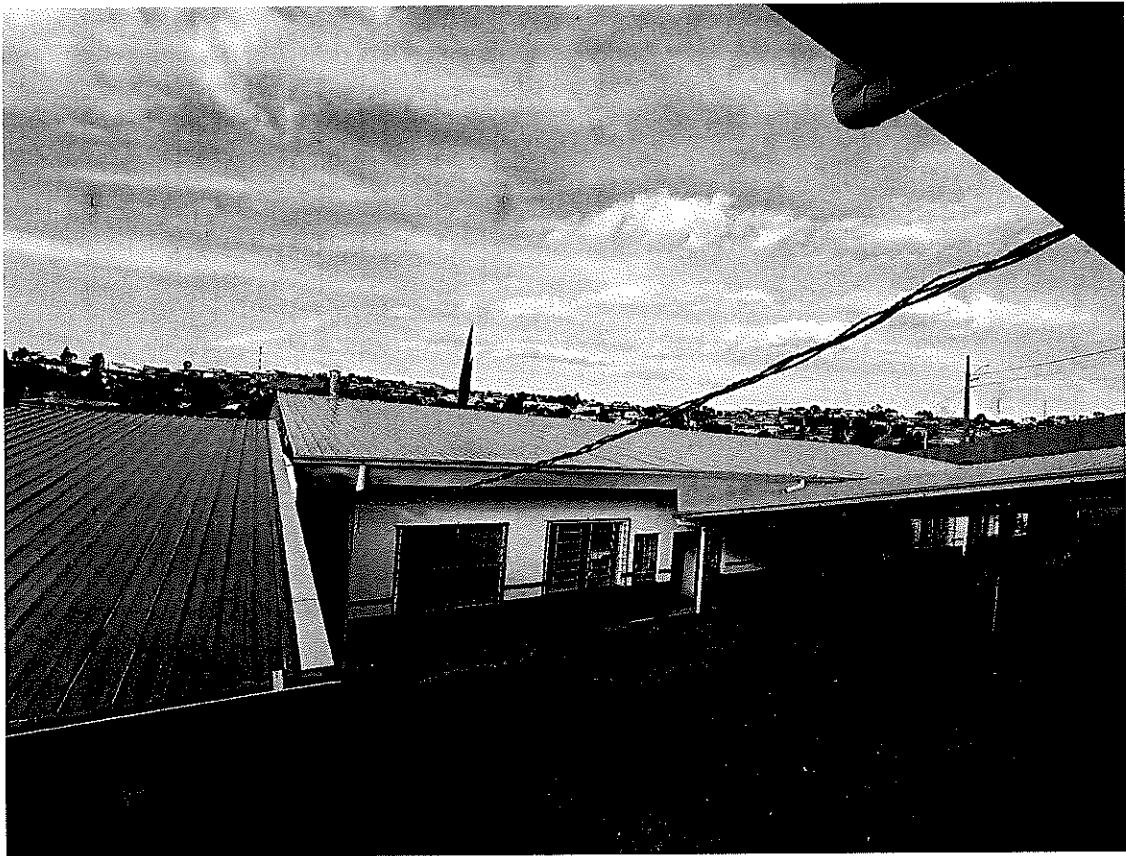


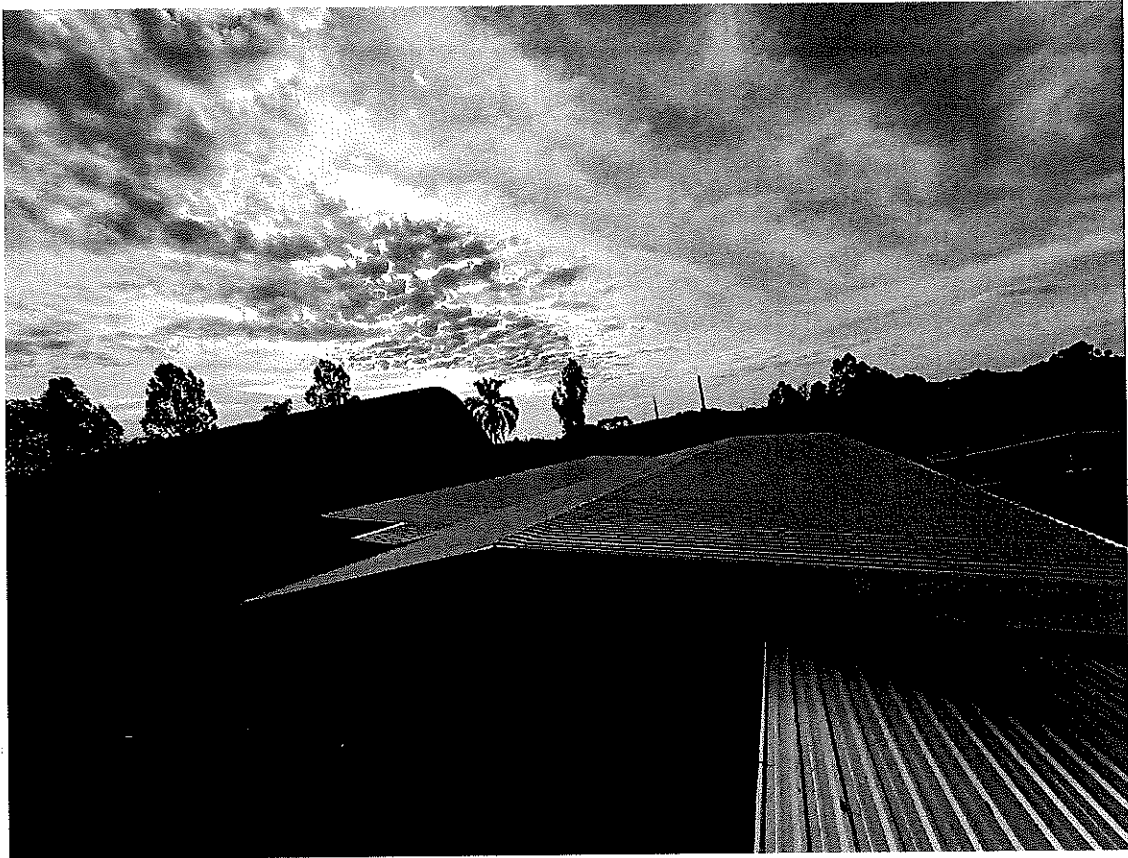






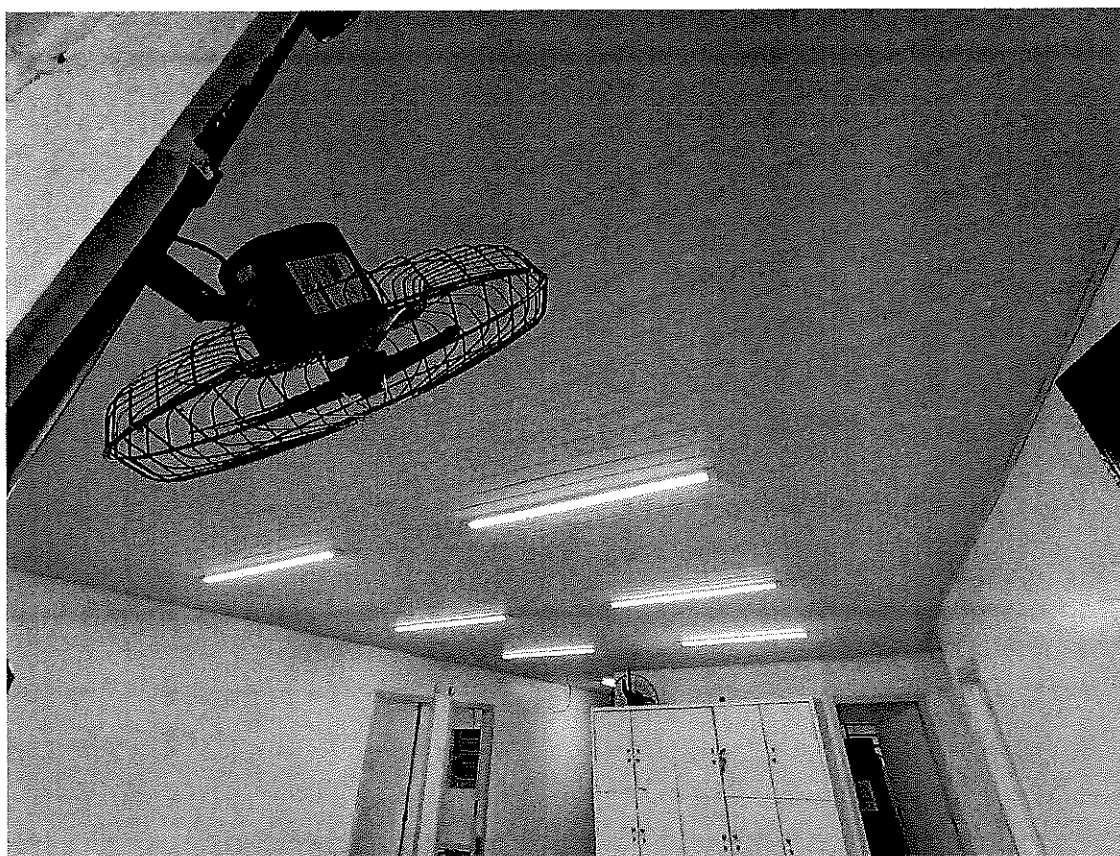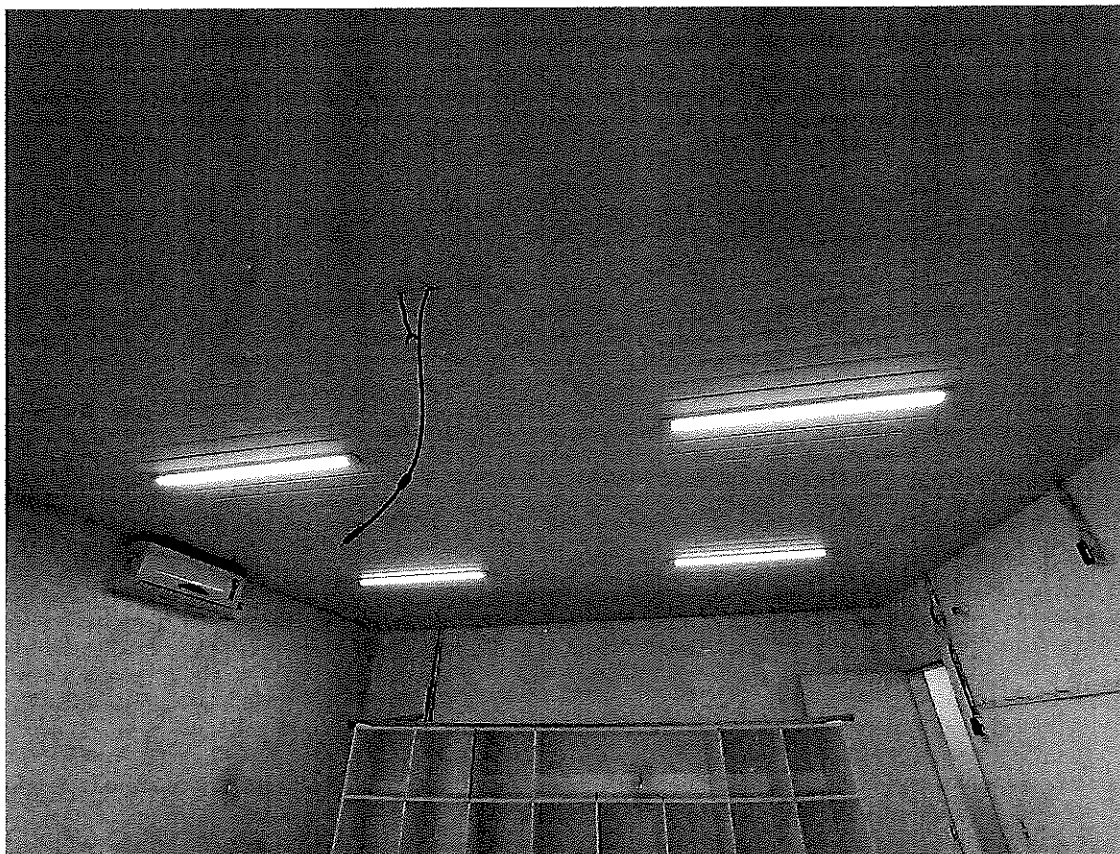

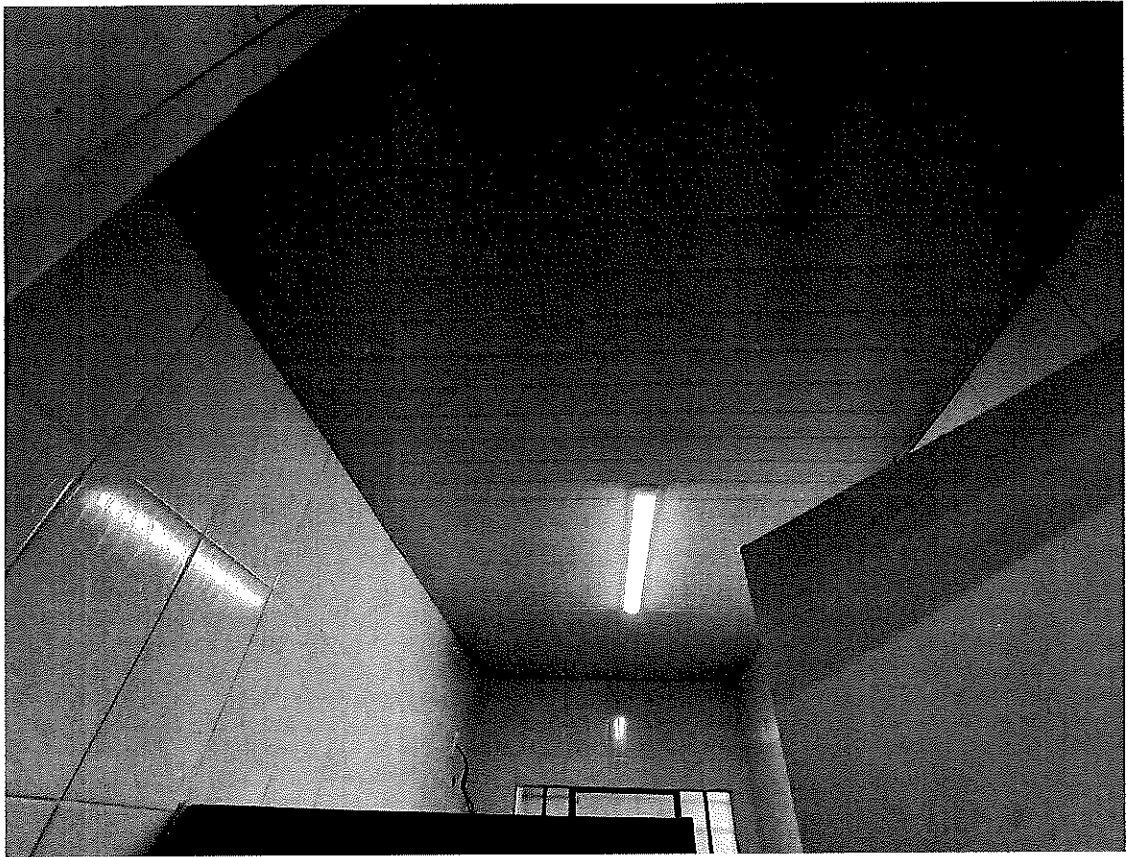

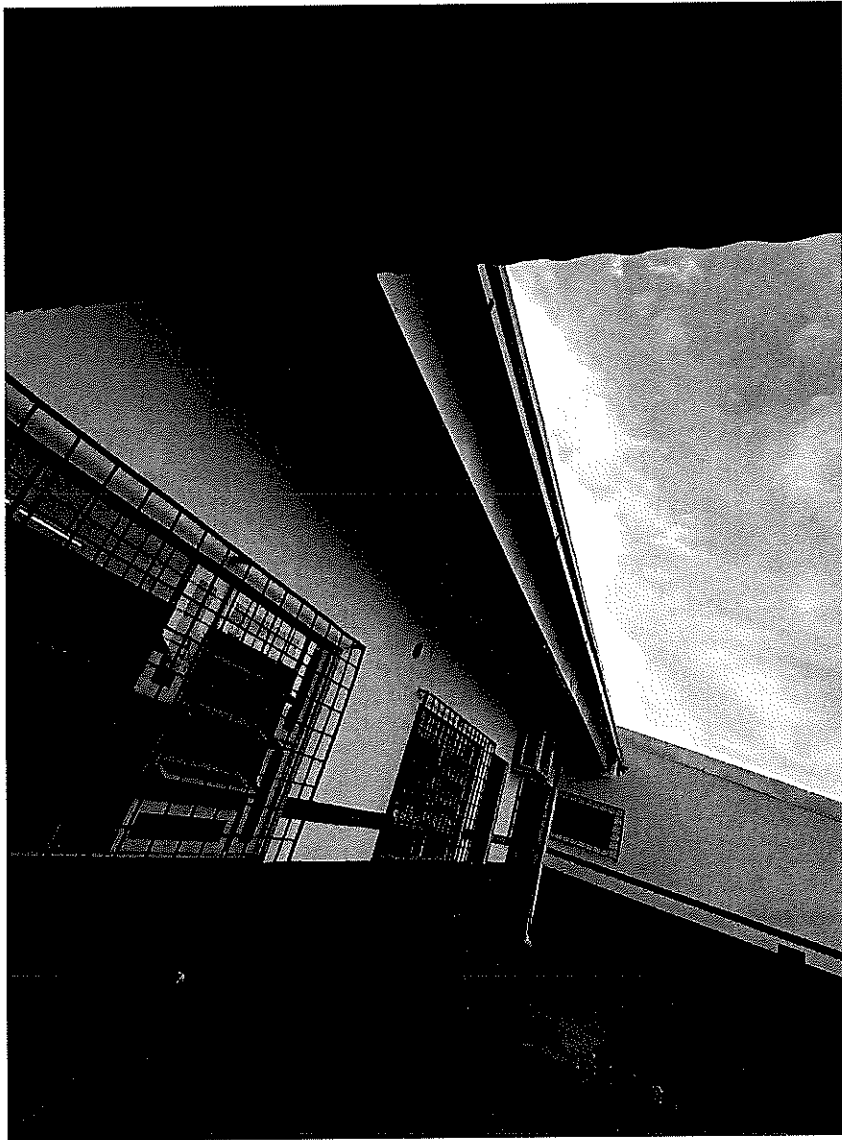








Pato Branco, 27 de julho de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
