



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ											
REGIONAL											
CASCABEL											
ASSOCIAÇÃO											
AMISOP											
PARCELA											
3											
DATA											
01/12/2021											
CONTRATO EMPREITADA:											
Nº											
89/2021											
DATA:											
19/08/2021											
ORÇAMENTO											
MUNICIPIO:											
SUBPROJETO:											
FIRMA EMPREITEIRA:											
PATO BRANCO											
PRAÇA ESPORTIVA											
JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI											
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES									
73822/2	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UT	M2	2992,55	100,00%	0,0033	0,33%	0,61	1.825,45	1.825,45	-
97622	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM RE	M3	2,67	100,00%	0,0003	0,03%	54,71	146,08	146,08	-
97625	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MEC	M3	10,88	100,00%	0,0008	0,08%	40,04	435,63	435,63	-
1.2	1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS									
1.2.1	1.2.1	ADMINISTRACAO DE OBRA									
1.2.1.1	1.2.1.1	ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL									
1.2.1.2	1.2.1.2	FECHAMENTOS									
98459	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M2	240,35	100,00%	0,0409	4,09%	93,11	22.378,99	22.378,99	-
1.2.1.3	1.2.1.3	LIGACOES PROVISORIAS									
41598	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POST	UN	1,00		0,0032		1741,03	1.741,03	1.741,03	-
1.2.2	1.2.2	BARRACAO DE OBRA									
1.2.3	1.2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO COM ESCRITÓRIO E BWC, MEDINDO 6,00	MES	5,00	60,00%	0,0051	0,31%	560,60	1.661,80	2.803,00	1.121,20
74209/1	74209/1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	M2	8,00	100,00%	0,0063	0,63%	430,89	3.447,12	3.447,12	-
10	10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	1,00	100,00%	0,0056	0,56%	3057,58	3.057,58	3.057,58	-
		SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS CONTÍNUOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	100,00%	0,0004		237,12	237,12	237,12	-
		ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	37,00	100,00%	0,0005	0,05%	8,89	328,93	328,93	-
		REMOÇÃO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO (MOURÕES), DE FORMA MANU	UN	1,00		0,0032		1762,72	1.762,72	1.762,72	-
02	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									
2.1	2.1	MOVIMENTO DE TERRA									
2.1.1	2.1.1	ESCAVACAO MANUAL									
93358	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	34,97	100,00%	0,0053	0,53%	82,79	2.895,17	2.895,17	-
2.1.6	2.1.6	REATERRO MECANIZADO									
93382	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2018	M3	20,90	100,00%	0,0012	0,12%	31,31	654,38	654,38	-
2.1.9	2.1.9	COMPACTACAO MECANICA									
74005/1	74005/1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA	M3	1575,16	100,00%	0,0183	1,83%	6,34	9.986,50	9.986,50	-
2.3	2.3	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									
2.3.4	2.3.4	DRENOS COM AGREGADOS									
83682	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M3	36,12	100,00%	0,0074	0,74%	112,14	4.050,50	4.050,50	-
2.3.9	2.3.9	TUBOS DE CONCRETO									
95567	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI	M	63,50	100,00%	0,0070	0,70%	59,97	3.808,10	3.808,10	-
2.4	2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS									
2.4.4	2.4.4	CAIXAS DE GORDURA									
99260	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS C	UN	5,00	100,00%	0,0037	0,37%	406,95	2.034,75	2.034,75	-
2.4.10	2.4.10	CAIXAS COM GRELHA E GRELHAS									
83623	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO	M	43,00		0,0209		265,03	11.396,29	11.396,29	-
		CALHA/CANALETA EM CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 300 M	M	43,00	100,00%	0,0041	0,41%	52,23	2.245,89	2.245,89	-
03	3	FUNDACOES									
3.1	3.1	MANUTENCAO / REPAROS - FUNDACOES									
97627	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECAN	M3	4,50	100,00%	0,0021	0,21%	260,02	1.170,09	1.170,09	-

Nº	Código	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unidade	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
3.2		ESTACA TIPO BROCA									
98228		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ	M	161,00	100,00%	0,0178	1,78%	60,29	9,706,69	9,706,69	-
04		ESTRUTURAS									
4.1		FORMAS									
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA									
92426		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E EST	M2	42,42	100,00%	0,0042	0,42%	53,78	2,281,35	2,281,35	-
96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAM	M2	138,72	100,00%	0,0161	1,61%	63,54	8,814,26	8,814,26	-
4.2		ARMADURAS									
4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60									
92775		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR	KG	338,82	100,00%	0,0095	0,95%	15,37	5,207,66	5,207,66	-
92778		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR	KG	1494,59	100,00%	0,0274	2,74%	10,01	14,960,85	14,960,85	-
4.3		CONCRETOS E GRAUTES									
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO									
4.3.4.1		CONCRETAGENS									
92720		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICA	M3	72,53	4,37%	0,0553	0,24%	416,85	1,321,41	30,234,13	28,912,72
		CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COAOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 N	M3	10,39	100,00%	0,0056	0,66%	349,41	3,630,37	3,630,37	-
		CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO	M3	5,19	100,00%	0,0034	0,34%	357,03	1,852,99	1,852,99	-
05		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									
5.1		ALVENARIA									
5.1.4		BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO									
87479		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE	M2	118,28	100,00%	0,0121	1,21%	55,73	6,591,74	6,591,74	-
		ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL, COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,	UN	1,00	100,00%	0,0589	5,89%	32,199,59	32,199,59	32,199,59	-
		ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVEST	UN	1,00	100,00%	0,0173	1,73%	9450,86	9,450,86	9,450,86	-
		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TUBOS DE AÇO GALVANIZA	UN	1,00	100,00%	0,0591	5,91%	31,732,03	31,732,03	31,732,03	-
		PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4	M²	7,35		0,0077		572,89	4,210,74	4,210,74	-
06		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES									
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS									
93009		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INST	M	6,00		0,0002		22,48	134,88	134,88	-
8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS									
97667		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E	M	1300,00	48,08%	0,0185	0,89%	7,76	10,088,00	10,088,00	5,238,00
8.2.5		CABOS									
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV									
91927		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR	M	447,17		0,0031		3,82	1,708,19	1,708,19	-
91931		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR	M	3751,79	49,98%	0,0492	2,45%	7,16	26,862,82	26,862,82	13,437,82
91933		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR	M	45,15		0,0009		11,15	503,42	503,42	-
8.2.8		CAIXAS									
97896		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CEI	UN	25,00	32,00%	0,0071	0,23%	154,33	3,853,25	3,853,25	2,623,61
8.2.11		DISJUNTORES									
8.2.11.2		BIPOLARES									
93662		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO	UN	1,00		0,0001		73,26	73,26	73,26	-
93663		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO	UN	1,00		0,0001		73,26	73,26	73,26	-
93664		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO	UN	1,00		0,0001		75,96	75,96	75,96	-
8.2.11.3		TRIPOLARES									
93672		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENT	UN	1,00		0,0002		102,75	102,75	102,75	-
93673		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENT	UN	1,00		0,0002		111,23	111,23	111,23	-
8.2.13		TOMADAS									
91997		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E F	UN	2,00		0,0001		35,28	70,56	70,56	-
8.2.16		CAMPAINHAS E SENSORES									
82399		RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FC	UN	1,00		0,0001		37,68	37,68	37,68	-
		TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMÁVEL, TRILHO DIN, 127/220V - FORNECIME	UN	2,00		0,0004		115,22	230,44	230,44	-
		CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 45A 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IN	UN	3,00		0,0049		901,55	2,704,65	2,704,65	-
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INS	M	9,00		0,0002		10,44	93,96	93,96	-
		LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	100,00%	0,0341	3,41%	777,50	18,660,00	18,660,00	-
		POSTE EM AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM CRUZETA E TRÊS REF	UN	6,00		0,0193		1769,34	10,556,04	10,556,04	-
		POSTE EM AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM CRUZETA E DOIS REF	UN	4,00		0,0112		1524,35	6,097,40	6,097,40	-

Negrito\med\03\zelada.xls											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unidade	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		POSTE EM AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO DE 6,0M ENGASTADO	UN	2,00		0,0090		2468,77	-	4.937,54	4.937,54
		MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONF	UN	1,00		0,0021		1150,08	-	1.150,08	1.150,08
		ENTRADA DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E IN	UN	1,00		0,0075		4125,25	-	4.125,25	4.125,25
07	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-	-	-
	10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							-	-	-
	10.1.2	CHAPISCO							-	-	-
	87984	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTUR	M2	382,90	100,00%	0,0044	0,44%	6,23	2.385,47	2.385,47	-
	10.1.3	EMBOCO							-	-	-
	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA	M2	382,90	100,00%	0,0220	2,20%	31,41	12.026,89	12.026,89	-
	10.2	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECOES							-	-	-
	10.2.6	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS							-	-	-
	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,	M2	80,92	100,00%	0,0017	0,17%	11,15	902,26	902,26	-
	10.3	REVESTIMENTO DE PISOS							-	-	-
	10.3.4	PISO CIMENTADO							-	-	-
	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESS	M2	688,10	100,00%	0,0410	4,10%	32,58	22.418,30	22.418,30	-
	10.3.11	PISO EM BLOCO DE CONCRETO							-	-	-
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	M2	137,11	85,00%	0,0165	1,40%	65,72	7.689,01	9.010,87	1.351,86
	98679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	M2	137,01	25,00%	0,0178	0,44%	71,13	2.436,20	9.745,92	7.309,32
	10.3.12	PISO EM CONCRETO							-	-	-
	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO	M2	153,70	100,00%	0,0156	1,56%	55,40	8.514,98	8.514,98	-
	94684	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	M2	534,40	100,00%	0,0822	8,22%	84,02	44.900,29	44.900,29	-
	10.4	PINTURAS							-	-	-
	10.4.7	FUNDO PREPARADOR							-	-	-
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06	M2	382,90		0,0019		2,68	1.026,17	1.026,17	1.026,17
	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	36,00		0,0002		3,11	111,96	111,96	111,96
	10.4.12	PINTURA EM FACHADAS							-	-	-
	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAN	M2	382,90		0,0120		17,10	6.547,59	6.547,59	6.547,59
	10.4.16	PINTURA EM PISO							-	-	-
	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO	M2	36,00		0,0012		17,59	633,24	633,24	633,24
		EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM PEÇAS DO TIPO 3 PC	M2	635,53	100,00%	0,0073	7,73%	66,50	42.262,75	42.262,75	-
08	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-	-	-
	11.1	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO							-	-	-
	11.1.1	MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
	94283	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXT	M	778,64	80,00%	0,0400	3,20%	28,11	17.510,00	21.887,57	4.377,57
	11.2	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-	-	-
	11.2.2	PLANTAS							-	-	-
	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	3744,60	80,00%	0,0578	4,62%	8,44	25.283,54	31.604,42	6.320,88
09	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							-	-	-
		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	888,68		0,0055		3,38	3.003,74	3.003,74	3.003,74
									-	-	-
									-	-	-
								SOMAS	412.366,09	546.516,22	134.150,13
OBSERVAÇÕES:								Valor Total do Contrato:		R\$	546.516,22
								Medição Acumulada:		R\$	412.366,09
								Total Anterior:		R\$	264.233,31
								Valor Destra Medição:		R\$	148.132,78

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos):

Marcelo Gabiatti

Eng. Civil. CREA/PR n 86.901/D

Empresa Executora

Alana Ruba milk-martin

Alana Paula Mulhmann

Eng. Civil CREA PR n° 124.497/D

Fiscalização Municipal

Robson Cantu

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
 PROJETO : PRAÇA ESPORTIVA
 CONVÊNIO : 0

MEDICÃO Nº: 3
 DATA DA MEDICÃO: 01/12/2021

CONTRATO EMPRESTIMO Nº :

EMPRESA VENCEDORA : JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI

CONTRATO EMPREITADA Nº :

VALOR TOTAL CONTRATADO :

SAM : N 52

LOTE : N 01

89/2021 DATA: 19/08/2021

ORDEM DE SERVIÇO Nº :

DATA:

R\$ 546.516,22

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDICÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	38.163,65	87,26%	38.163,65	33.301,58
02	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	37.071,58	69,26%	37.071,58	25.675,29
03	3	FUNDACOES	100,00%	10.876,78	100,00%	10.876,78	10.876,78
04	4	ESTRUTURAS	100,00%	66.981,61	56,83%	66.981,61	38.068,89
05	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	60,00%	50.510,97	95,00%	84.184,96	79.974,22
06	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	50,00%	46.127,81	41,37%	92.255,62	38.169,64
07	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS	50,00%	80.243,14	89,42%	160.486,29	143.506,15
08	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	50,00%	26.745,99	80,00%	53.491,99	42.793,54
09	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	3.003,74	-
10			-	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-
13			-	-	-	-	-
14			-	-	-	-	-
15			-	-	-	-	-
16			-	-	-	-	-
17			-	-	-	-	-
18			-	-	-	-	-
19			-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-
21			-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				356.721,53	TOTAL MEDICÃO		412.366,09
C.P.M. (%)					C.P.M. (%)		
F. Perdido (%)				-	F. Perdido (%)		-
PPU II (%)					PPU II (%)		

Importa a presente medição no valor total de **R\$ 148.132,78**
 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº, TP 002/2021 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Marcelo Gabiatti

Eng. Civil - CREA PR nº 86.901/D
 Empresa Executora

Alana Paula Mulhmann

Eng. Civil CREA PR nº 124.497/D
 Fiscalização Municipal

ROBSON CANTIL
 PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO
PROJETO/LOTE
PROGRAMA
CONTRATADA
CONTRATO Nº
OBJETO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
52/01
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
89/2021
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM 1 CAMPO DE FUTEBOL, 1 QUADRA POLIESPORTIVA, ESPAÇO PARA PLAYGROUND, ESPAÇO PARA GINÁSTICA E PAVIMENTAÇÕES, COM SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGENS, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, ALVENARIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REVESTIMENTOS, PINTURAS, PAVIMENTAÇÕES, ENTRE OUTROS, ALÉM DAS PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES.
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 7.475,98 M²,
LOCALIZADA NA RUA NA RUA JAURY HEITOR DE SOUZA – PARTE DA RESERVA MUNICIPAL Nº 197 – BAIRRO GRALHA AZUL

MEDIÇÃO Nº
DATA DA VISTORIA

03
01/12/2021

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 27/10/2021 até 01/12/2021.


SERVIÇOS EXECUTADOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

	Container para escritório
---	---------------------------



2. MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

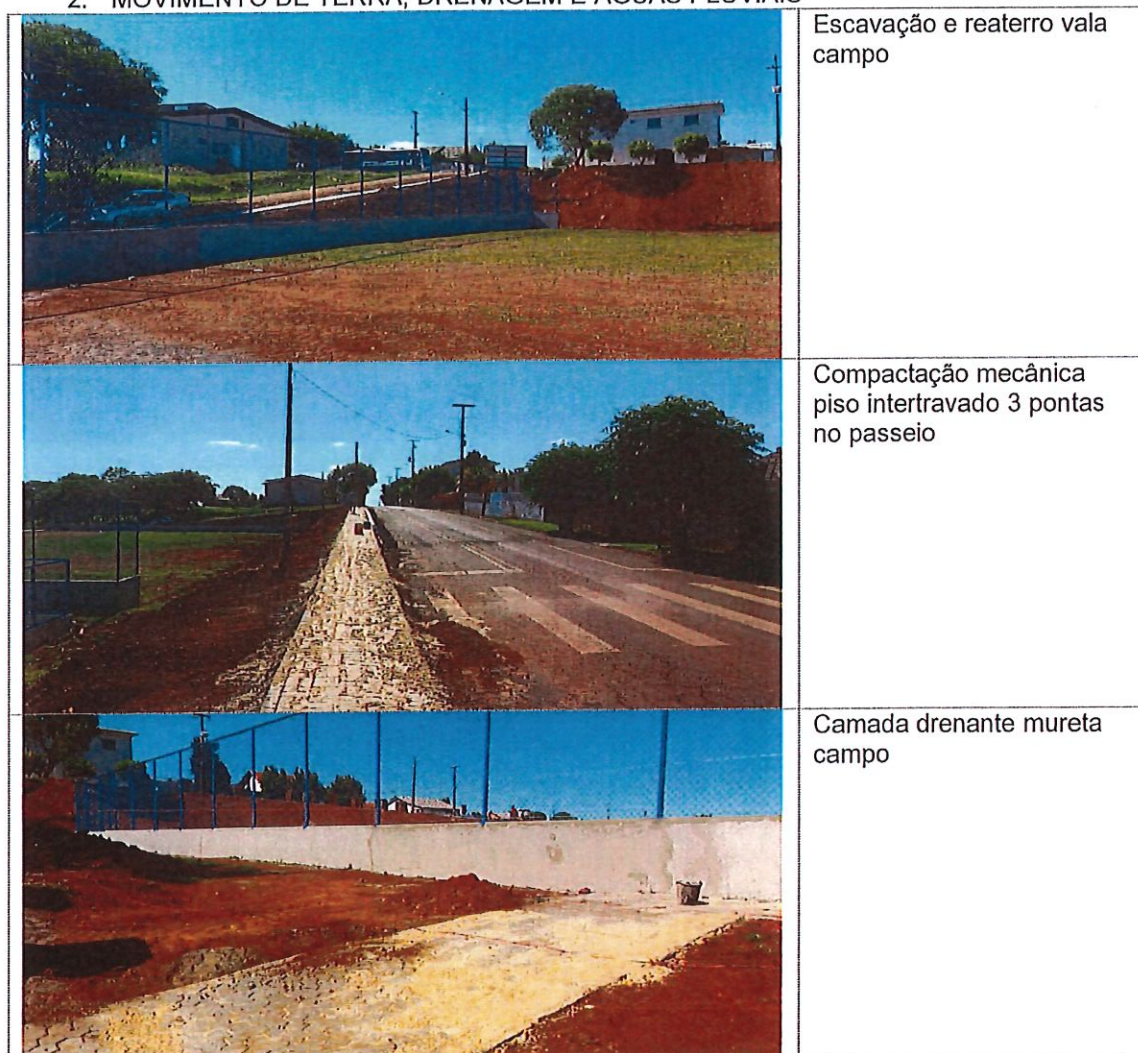

Ustrm

3. FUNDAÇÕES




Estaca broca campo

4. ESTRUTURAS



Execução de viga baldrame, pilares e viga da mureta do campo

5. ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

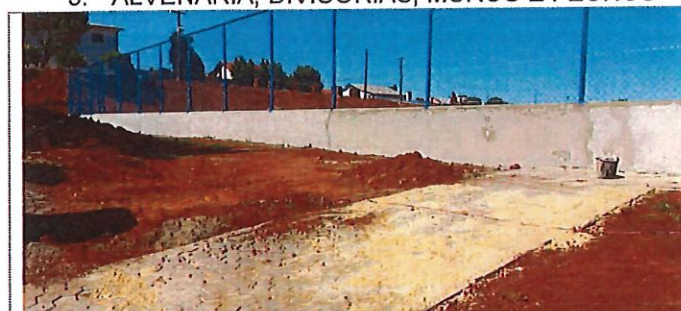


Alvenaria de vedação da mureta do campo





Alambrado do campo

Jm

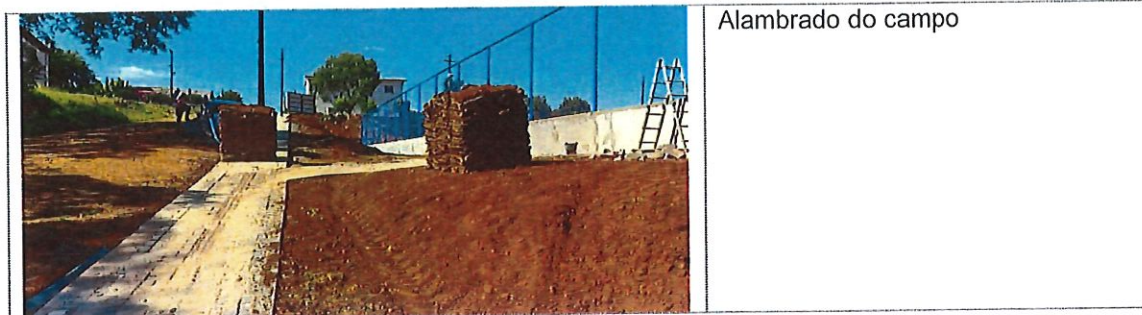


7. REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

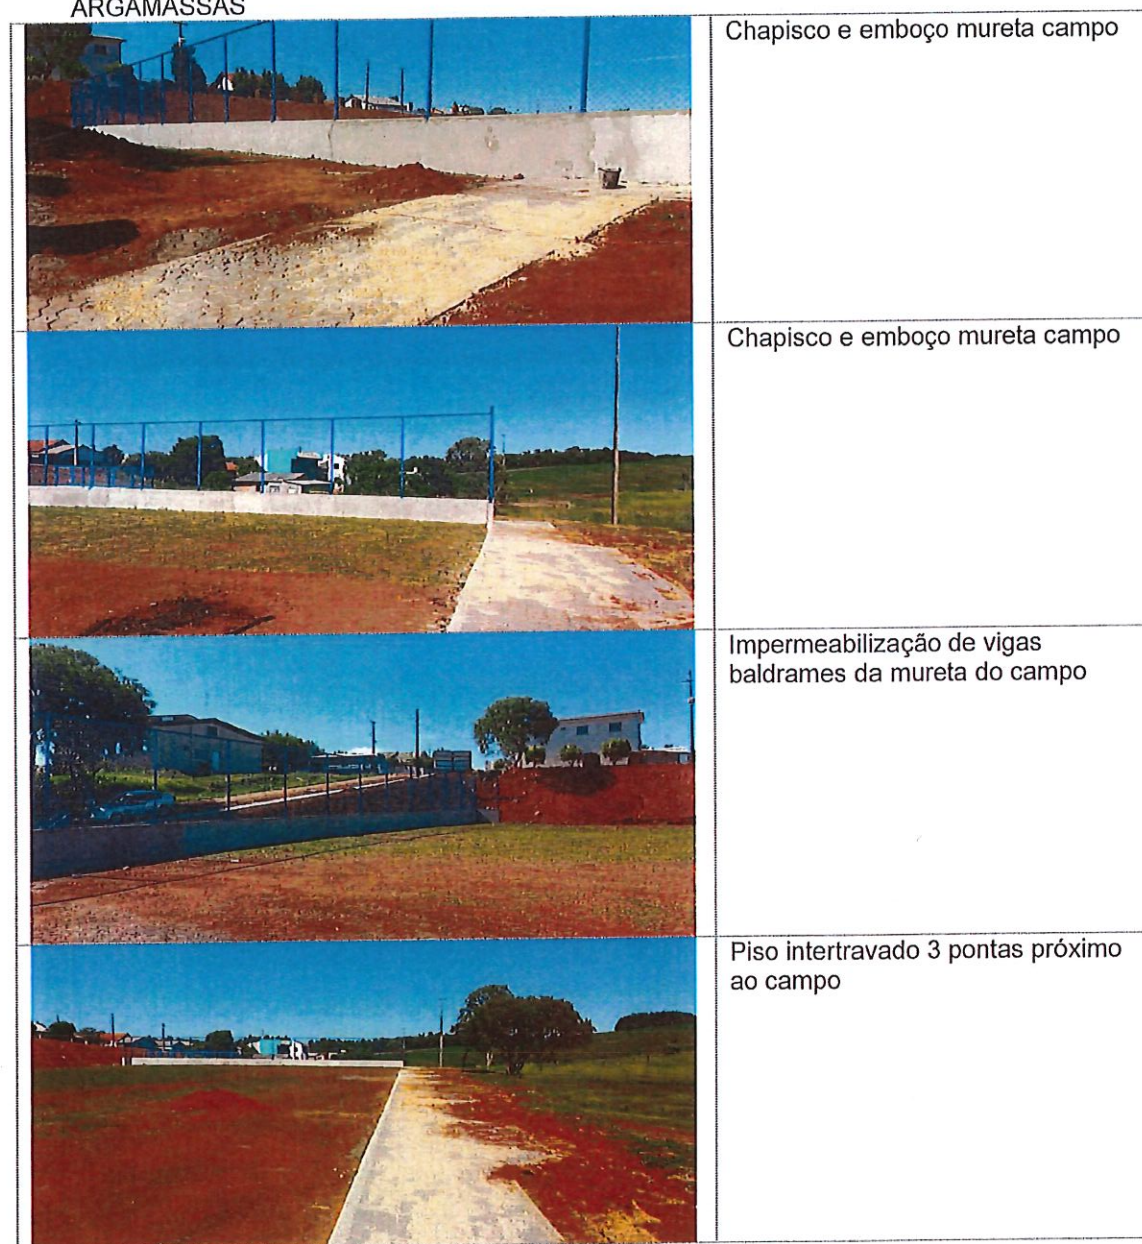

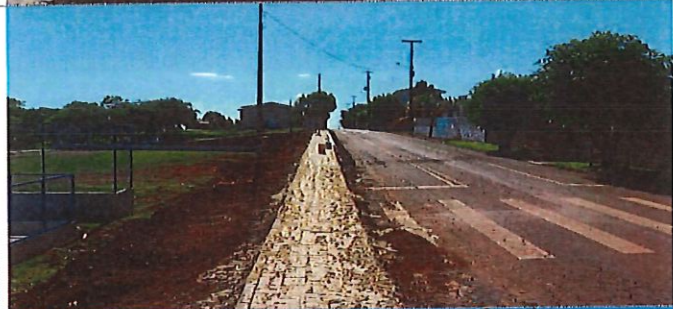	Piso intertravado 3 pontas próximo a quadra
	Piso intertravado passeios
	Piso intertravado passeio

8. PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

	Meio-fio passeio
	Grama talude e passeio

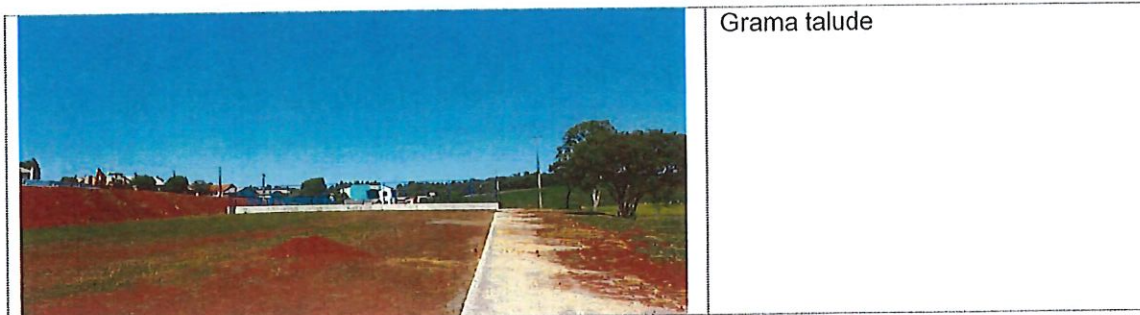

Pato Branco, 01 de dezembro de 2021

Alana Paula Mulhmann
Alana Paula Mulhmann
CREA-PR 124.497/D
ART de fiscalização Nº 1720214910320
