



EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0				O REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		#PÚBLICO	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
352		MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		24/03/2023 a 31/07/2023		02/12/22	
		CNPJ						Nº MEDIÇÃO	
		16.700.335/0001-52						3	

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA											
TOTAL:				133.072,15	57,62	23,42	81,04	105.490,27	42.872,39	148.362,66	
1.	REFORMA POSTO CACHOEIRINHA			133.072,15	57,62	23,42	81,04	105.490,27	42.872,39	148.362,66	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			9.486,00	40,00	60,00	100,00	3.794,40	5.691,60	9.486,00	
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			4.106,40	40,00	60,00	100,00	1.642,56	2.463,84	4.106,40	
1.1.2.	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			5.379,60	40,00	60,00	100,00	2.151,84	3.227,76	5.379,60	
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			4.150,64	96,71	3,29	100,00	4.014,23	136,41	4.150,64	
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			426,93	100,00	-	100,00	426,93	-	426,93	
1.2.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			388,83	100,00	-	100,00	388,83	-	388,83	
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			1.610,77	100,00	-	100,00	1.610,77	-	1.610,77	
1.2.4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			412,52	100,00	-	100,00	412,52	-	412,52	
1.2.5.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			887,91	100,00	-	100,00	887,91	-	887,91	
1.2.6.	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015			337,80	72,33	27,67	100,00	244,33	93,47	337,80	
1.2.7.	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015			85,88	50,00	50,00	100,00	42,94	42,94	85,88	
1.3.	COBERTURA			42.707,30	67,34	32,66	100,00	28.759,36	13.947,94	42.707,30	
1.3.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019			10.347,40	100,00	-	100,00	10.347,40	-	10.347,40	
1.3.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019			2.830,92	100,00	-	100,00	2.830,92	-	2.830,92	
1.3.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019			4.774,32	-	100,00	100,00	-	4.774,32	4.774,32	
1.3.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019			3.548,16	100,00	-	100,00	3.548,16	-	3.548,16	
1.3.5.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019			7.745,28	100,00	-	100,00	7.745,28	-	7.745,28	
1.3.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022			1.592,75	-	100,00	100,00	-	1.592,75	1.592,75	



EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0		0 REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		#PÚBLICO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
352	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		24/03/2023 a 31/07/2023		02/12/22	
		CNPJ				Nº MEDIÇÃO	
		16.700.335/0001-52				3	

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA									
TOTAL:		103.072,15	57,82	23,42	81,04	102.400,27	62.872,39	143.323,66	
1.3.7.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	5.045,43	-	100,00	100,00	-	5.045,43	5.045,43	
1.3.8.	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1" CM (SEM COLOCACAO)	6.823,04	62,84	37,16	100,00	4.287,60	2.535,44	6.823,04	
1.4.	ESTRUTURAS	14.740,80	73,59	26,41	100,00	10.847,05	3.893,75	14.740,80	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	3.390,20	100,00	-	100,00	3.390,20	-	3.390,20	
1.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF 08/2017	157,51	100,00	-	100,00	157,51	-	157,51	
1.4.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF 07/2021	1.666,72	100,00	-	100,00	1.666,72	-	1.666,72	
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	3.893,75	-	100,00	100,00	-	3.893,75	3.893,75	
1.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	2.227,84	100,00	-	100,00	2.227,84	-	2.227,84	
1.4.6.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	725,21	100,00	-	100,00	725,21	-	725,21	
1.4.7.	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	537,21	100,00	-	100,00	537,21	-	537,21	
1.4.8.	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	1.105,93	100,00	-	100,00	1.105,93	-	1.105,93	
1.4.9.	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	151,48	100,00	-	100,00	151,48	-	151,48	
1.4.10.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	480,07	100,00	-	100,00	480,07	-	480,07	
1.4.11.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	159,54	100,00	-	100,00	159,54	-	159,54	
1.4.12.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	245,34	100,00	-	100,00	245,34	-	245,34	
1.5.	REVESTIMENTO INTERNO PAREDES	5.591,03	0,55	99,45	100,00	30,76	5.560,27	5.591,03	
1.5.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	938,68	-	100,00	100,00	-	938,68	938,68	
1.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	4.621,59	-	100,00	100,00	-	4.621,59	4.621,59	
1.5.3.	SELANTE ACRÍLICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	30,76	100,00	-	100,00	30,76	-	30,76	
1.6.	REVESTIMENTO DE PISO	9.215,77	-	100,00	100,00	-	9.215,77	9.215,77	



EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0			0 REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
		16.700.335/0001-52		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL			
352	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE					24/03/2023 a 31/07/2023	3

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído e Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA					TOTAL:			105.400,27		143.352,96
1.6.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 06/2014			4.821,44	-	100,00	100,00	-	4.821,44	4.821,44
1.6.2.	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_ 09/2020			4.343,95	-	100,00	100,00	-	4.343,95	4.343,95
1.6.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 06/2014			50,38	-	100,00	100,00	-	50,38	50,38
1.7.	DIVISÓRIAS INTERNAS			8.176,84	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	DIVISÓRIA NAVAL COM PORTAS INCLUSO FECHADURA			8.176,84	-	-	-	-	-	-
1.8.	BANCADAS E EQUIPAMENTOS			7.150,26	91,91	8,09	100,00	6.572,03	578,23	7.150,26
1.8.1.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020			2.221,61	100,00	-	100,00	2.221,61	-	2.221,61
1.8.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020			1.766,08	100,00	-	100,00	1.766,08	-	1.766,08
1.8.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022			119,60	100,00	-	100,00	119,60	-	119,60
1.8.4.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022			44,90	100,00	-	100,00	44,90	-	44,90
1.8.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015			2.334,80	100,00	-	100,00	2.334,80	-	2.334,80
1.8.6.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020			578,23	-	100,00	100,00	-	578,23	578,23
1.8.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014			55,56	100,00	-	100,00	55,56	-	55,56
1.8.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014			29,48	100,00	-	100,00	29,48	-	29,48
1.9.	ESQUADRIAS			27.577,87	77,71	13,04	90,75	21.429,72	3.596,30	25.026,02
1.9.1.	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)			12.176,88	100,00	-	100,00	12.176,88	-	12.176,88



EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador		Nº Operação		Nº Siconv		Apelido do Empreendimento		Grau de Sigilo	
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0		0		REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		02/12/22	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
352		MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		24/03/2023 a 31/07/2023		3	
		CNPJ							
		16.700.335/0001-52							

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA					133.072,15	57,62	23,42	81,04	105.490,27	42.872,39
TOTAL:										143.332,58
1.9.2.	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA			2.551,85	-	-	-	-	-	-
-	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019			-	-	100,00	100,00	-	-	-
1.9.3.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 P			6.358,04	100,00	-	100,00	6.358,04	-	6.358,04
1.9.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019			763,15	100,00	-	100,00	763,15	-	763,15
1.9.5.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)			2.175,26	-	100,00	100,00	-	2.175,26	2.175,26
1.9.6.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)			1.421,04	-	100,00	100,00	-	1.421,04	1.421,04
1.9.7.	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA			2.131,65	100,00	-	100,00	2.131,65	-	2.131,65
1.10.	CERCAMENTO			27.424,76	100,00	(87,44)	12,56	27.424,76	(23.980,80)	3.443,96
1.10.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017			396,83	100,00	-	100,00	396,83	-	396,83
1.10.2.	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF. 05/2018			23.980,80	100,00	(100,00)	-	23.980,80	(23.980,80)	-
1.10.3.	PORTÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURADO COM TUBO E AÇO GALVANIZADO			3.047,13	100,00	-	100,00	3.047,13	-	3.047,13
1.11.	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA			26.850,88	9,75	90,25	100,00	2.617,95	24.232,92	26.850,88
1.11.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014			586,13	-	100,00	100,00	-	586,13	586,13
1.11.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016			3.043,37	-	100,00	100,00	-	3.043,37	3.043,37
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015			11.096,45	22,56	77,44	100,00	2.503,36	8.593,09	11.096,45
1.11.4.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018			2.100,80	-	100,00	100,00	-	2.100,80	2.100,80
1.11.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015			856,50	-	100,00	100,00	-	856,50	856,50
1.11.6.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM			702,80	-	100,00	100,00	-	702,80	702,80



EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador		Nº Operação		Nº Siconv		Apelido do Empreendimento		Grau de Sigilo	
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0				0 REFORMA E AMPLIÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		#PUBLICO	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
352		MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		24/03/2023 a 31/07/2023		02/12/22	
		CNPJ				Nº MEDIÇÃO			
		16.700.335/0001-52				3			

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		TOTAL:		183.072,15	57,62	23,42	105.490,27	42.872,39	143.332,66
1.11.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015			114,60	100,00	-	114,60	-	114,60
1.11.8.	ASSENTAMENTO DE CALHA/CANALETE DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA ÁGUA PLUVIAL BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS			3.776,10	-	100,00	-	3.776,10	3.776,10
1.11.9.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA L=30CM, PARA ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			3.536,70	-	100,00	-	3.536,70	3.536,70
1.11.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022			390,95	-	100,00	-	390,95	390,95
1.11.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022			646,48	-	100,00	-	646,48	646,48

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total. Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR

Local

segunda-feira, 31 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO BELLEI

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 164.074/D

ART/RR: 0



**REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE
SÃO MIGUEL CACHOEIRINHA
CONTRATO Nº 352/2022/GP**

Relatório de Medição nº 3

DATA: 31/07/2023

Empresa Contratada: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI - CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: RODRIGO PIRES FRANCO
– CAU/BR Nº 000A910392

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 3ª medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Calha/ piso em concreto/ pintura externa



Foto 2: Passeio (calçada) em concreto / Pintura externa.



Foto 3: Tubulação de água pluvial.



Foto 4: Portas internas / pintura interna / Revestimento cerâmico.



Foto 5: Revestimento cerâmico nos banheiros.

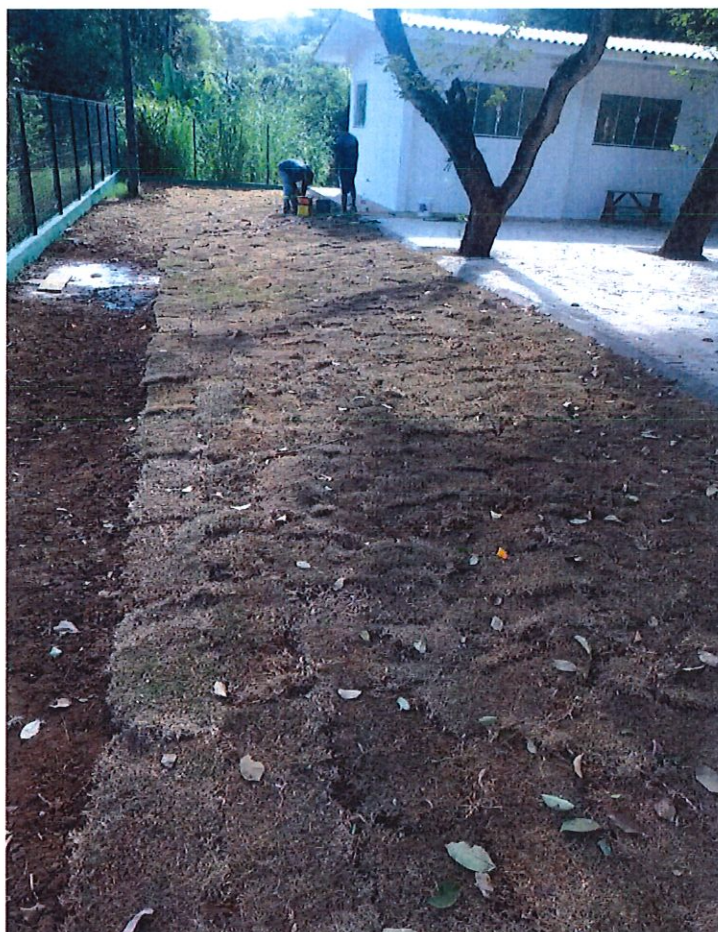


Foto 6: Execução de dreno / Plantio de Grama



Foto 7: Pintura externa / Paver / Grama / Porta de correr.

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 42.871,14.

Pato Branco, 31 de Julho de 2023.



EDUARDO BELLEI
Engenheiro Civil
CREA-PR 174.064/D
