



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS	INÍCIO DE OBRA 06/09/23
Nº CTEF 117/2023	EMPRESA EXECUTORA ARTEPI ENGENHARIA LTDA	CNPJ 02.667.088/0001-25	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 06/09/2023 a 12/08/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 72,31%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE										
TOTAL:				283.816,31	-	72,31	72,31	-	205.239,23	205.239,23
1.	CENTRO DE EVENTOS - ADITIVO RETIFICADO			283.816,31	-	72,31	72,31	-	205.239,23	205.239,23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			17.228,80	-	68,18	68,18	-	11.746,60	11.746,60
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (INCLUINDO ENGENHEIRO 30H/SEMANAIS, MESTRE DE OBRA 30H/SEMANAIS E APONTADOR 30H/SEMANAIS)			17.228,80	-	68,18	68,18	-	11.746,60	11.746,60
1.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE BOMBA DE INCÊNDIO			72.466,99	-	100,00	100,00	-	72.466,99	72.466,99
1.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			634,88	-	100,00	100,00	-	634,88	634,88
1.2.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			1.850,88	-	100,00	100,00	-	1.850,88	1.850,88
1.2.0.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020			2.087,52	-	100,00	100,00	-	2.087,52	2.087,52
1.2.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			50.212,80	-	100,00	100,00	-	50.212,80	50.212,80
1.2.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			9.376,00	-	100,00	100,00	-	9.376,00	9.376,00
1.2.0.6.	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			61,26	-	100,00	100,00	-	61,26	61,26
1.2.0.7.	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			14,88	-	100,00	100,00	-	14,88	14,88
1.2.0.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			2.105,00	-	100,00	100,00	-	2.105,00	2.105,00
1.2.0.9.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			763,71	-	100,00	100,00	-	763,71	763,71
1.2.0.10.	QUADRO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO - MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			5.360,06	-	100,00	100,00	-	5.360,06	5.360,06
1.3.	FECHAMENTO EM GESSO PARTE SUPERIOR DAS PORTAS CORTA-FOGO			6.678,11	-	100,00	100,00	-	6.678,11	6.678,11
1.3.0.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO TRRF 60 MIN, COR ROSA, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.			4.406,69	-	100,00	100,00	-	4.406,69	4.406,69
1.3.0.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			201,92	-	100,00	100,00	-	201,92	201,92
1.3.0.3.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016			945,52	-	100,00	100,00	-	945,52	945,52
1.3.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			1.123,98	-	100,00	100,00	-	1.123,98	1.123,98
1.4.	RECOMPOSIÇÃO DO FORRO EM GESSO DAS DUAS SALAS MULTIUSO			8.708,29	-	59,31	59,31	-	5.164,99	5.164,99
1.4.0.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			119,14	-	100,00	100,00	-	119,14	119,14
1.4.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			239,38	-	100,00	100,00	-	239,38	239,38
1.4.0.3.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS			4.806,47	-	100,00	100,00	-	4.806,47	4.806,47
1.4.0.4.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			224,07	-	-	-	-	-	-



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	Apelido do Empreendimento INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS	Início de Obra 06/09/23
Nº CTEF 117/2023	Empresa Executora ARTEPI ENGENHARIA LTDA	CNPJ 02.667.088/0001-25	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	Período da Medição 06/09/2023 a 12/08/2024	Nº Medição 1

Realizado Acumulado: 72,31%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE										
TOTAL:					-	72,31	72,31	-	205.239,23	205.239,23
1.4.0.5.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			1.588,68	-	-	-	-	-	-
1.4.0.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			1.135,08	-	-	-	-	-	-
1.4.0.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			595,47	-	-	-	-	-	-
1.5.	RAMPA DE CONCRETO REVESTIDA DE GRANITO			2.038,22	-	100,00	100,00	-	2.038,22	2.038,22
1.5.0.1.	RAMPA DE CONCRETO REVESTIDA DE GRANITO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO			2.038,22	-	100,00	100,00	-	2.038,22	2.038,22
1.6.	LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO			11.085,20	-	100,00	100,00	-	11.085,20	11.085,20
1.6.0.1.	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SLIM FU 50X25 CM VERDE C/ SELETOR E ADESIVO			11.085,20	-	100,00	100,00	-	11.085,20	11.085,20
1.7.	READEQUAÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA			133.960,26	-	50,44	50,44	-	67.572,65	67.572,65
1.7.1.	Paredes Divisórias			20.614,02	-	52,64	52,64	-	10.850,94	10.850,94
1.7.1.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS			12.056,60	-	90,00	90,00	-	10.850,94	10.850,94
1.7.1.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			470,20	-	-	-	-	-	-
1.7.1.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			2.208,46	-	-	-	-	-	-
1.7.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			2.418,91	-	-	-	-	-	-
1.7.1.5.	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020			3.459,85	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	Recomposição do forro em gesso para readequação das luminárias			4.039,40	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS			879,50	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			41,00	-	-	-	-	-	-
1.7.2.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			290,70	-	-	-	-	-	-
1.7.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			2.440,48	-	-	-	-	-	-
1.7.2.5.	REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS PLAFON LED			387,72	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	Portas			9.051,24	-	-	-	-	-	-
1.7.3.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			8.782,32	-	-	-	-	-	-
1.7.3.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021			150,44	-	-	-	-	-	-
1.7.3.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021			118,48	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	Ar Condicionado			53.957,68	-	27,40	27,40	-	14.785,94	14.785,94
1.7.4.1.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.185,00	-	100,00	100,00	-	1.185,00	1.185,00
1.7.4.2.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.571,85	-	100,00	100,00	-	1.571,85	1.571,85
1.7.4.3.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.057,50	-	100,00	100,00	-	1.057,50	1.057,50
1.7.4.4.	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 5/8", E= 10 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.553,75	-	100,00	100,00	-	2.553,75	2.553,75



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS	06/09/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
117/2023	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	02.667.088/0001-25	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		1
PERÍODO DA MEDIÇÃO					
06/09/2023 a 12/08/2024					

Realizado Acumulado: 72,31%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE					-	72,31	72,31	-	205.239,23	205.239,23
TOTAL:					-	72,31	72,31	-	205.239,23	205.239,23
1.7.4.5.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021			4.607,84	-	100,00	100,00	-	4.607,84	4.607,84
1.7.4.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			1.428,00	-	100,00	100,00	-	1.428,00	1.428,00
1.7.4.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			2.382,00	-	100,00	100,00	-	2.382,00	2.382,00
1.7.4.8.	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			36.626,20	-	-	-	-	-	-
1.7.4.9.	SUPORTE EM AÇO PARA EVAPORADORA			2.042,56	-	-	-	-	-	-
1.7.4.10.	SUPORTE EM AÇO PARA APOIO DAS CONDENSADORAS			502,98	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	Instalações Elétricas			46.297,92	-	90,58	90,58	-	41.935,77	41.935,77
1.7.5.1.	LUMINÁRIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO BRANCO 40X40 - 36W - TEMPERATURA 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.676,42	-	100,00	100,00	-	2.676,42	2.676,42
1.7.5.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			10.234,00	-	90,00	90,00	-	9.210,60	9.210,60
1.7.5.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			23.859,00	-	90,00	90,00	-	21.473,10	21.473,10
1.7.5.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			9.528,50	-	90,00	90,00	-	8.575,65	8.575,65
1.8.	MÓCHETA PARA TUBULAÇÃO PLUVIAL			654,81	-	100,00	100,00	-	654,81	654,81
1.8.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			66,52	-	100,00	100,00	-	66,52	66,52
1.8.0.2.	REQUADRO E ACABAMENTO PARA PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO			524,00	-	100,00	100,00	-	524,00	524,00
1.8.0.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			5,93	-	100,00	100,00	-	5,93	5,93
1.8.0.4.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			27,85	-	100,00	100,00	-	27,85	27,85
1.8.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			30,51	-	100,00	100,00	-	30,51	30,51
1.9.	SISTEMA DE ELETROIMÃS PARA PORTA CORTA-FOGO			30.995,63	-	89,79	89,79	-	27.831,66	27.831,66
1.9.0.1.	QUADRO DE ACIONAMENTO DOS ELETROIMÃS - MONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			7.121,07	-	100,00	100,00	-	7.121,07	7.121,07
1.9.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			13.328,00	-	100,00	100,00	-	13.328,00	13.328,00
1.9.0.3.	BRÇOS DE FIXAÇÃO PARA ELETROIMÃS EM FERRO GALVANIZADO			10.546,56	-	70,00	70,00	-	7.382,59	7.382,59

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE EVENTOS	06/09/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
117/2023	ARTEPI ENGENHARIA LTDA	02.667.088/0001-25	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		06/09/2023 a 12/08/2024
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 72,31%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CENTRO DE					-	72,31	72,31	-	205.239,23	205.239,23

Local

segunda-feira, 12 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 107.389/D
ART/RRT: 0



Documento assinado digitalmente
FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 12/08/2024 14:39:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Execução do sistema de prevenção de incêndio e a desastres, execução das salas de apoio, execução do sistema SPDA do reservatório e execução do sistema elétrico do mezanino, salas de apoio e pontos necessários para o sistema de prevenção de incêndio, no Centro de Eventos de Pato Branco com área total de 8.086,00m², atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

CONTRATO Nº117/2023/GP


Relatório de Medição nº 01 – Aditivo


Empresa Contratada: Artepi Engenharia Ltda.



Responsável: João da Silva Duarte – CREA-SC 1733432/D


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição referente ao aditivo 01, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:




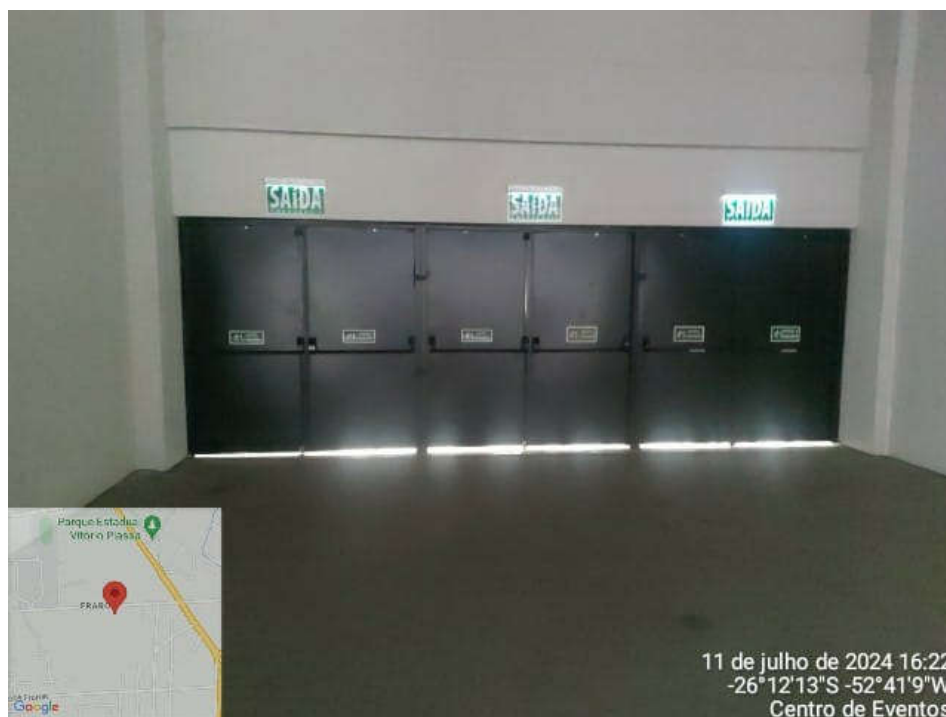



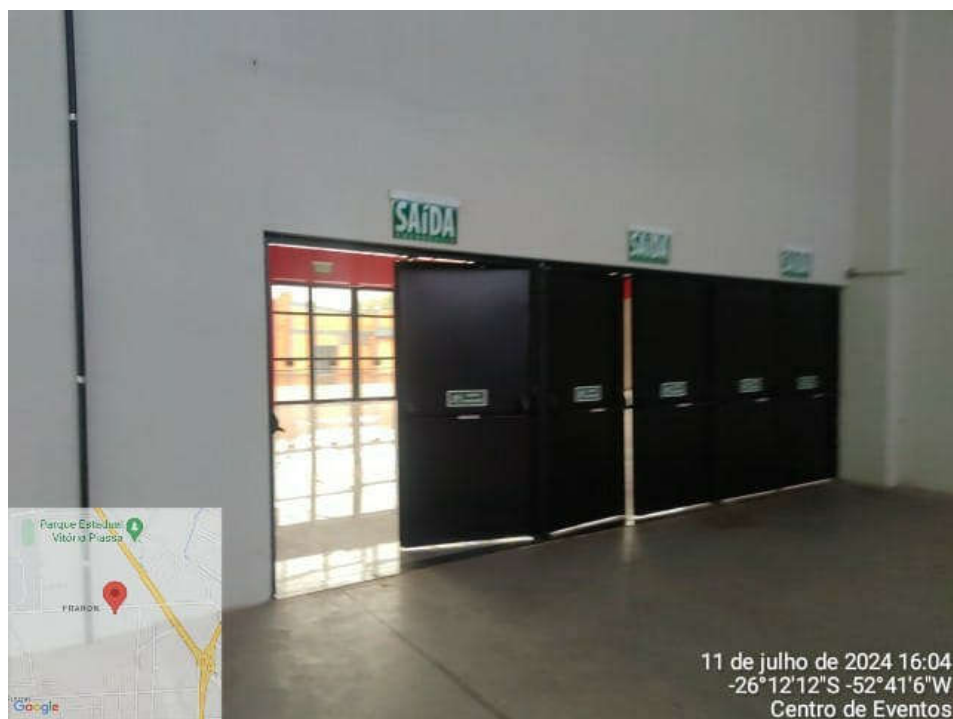


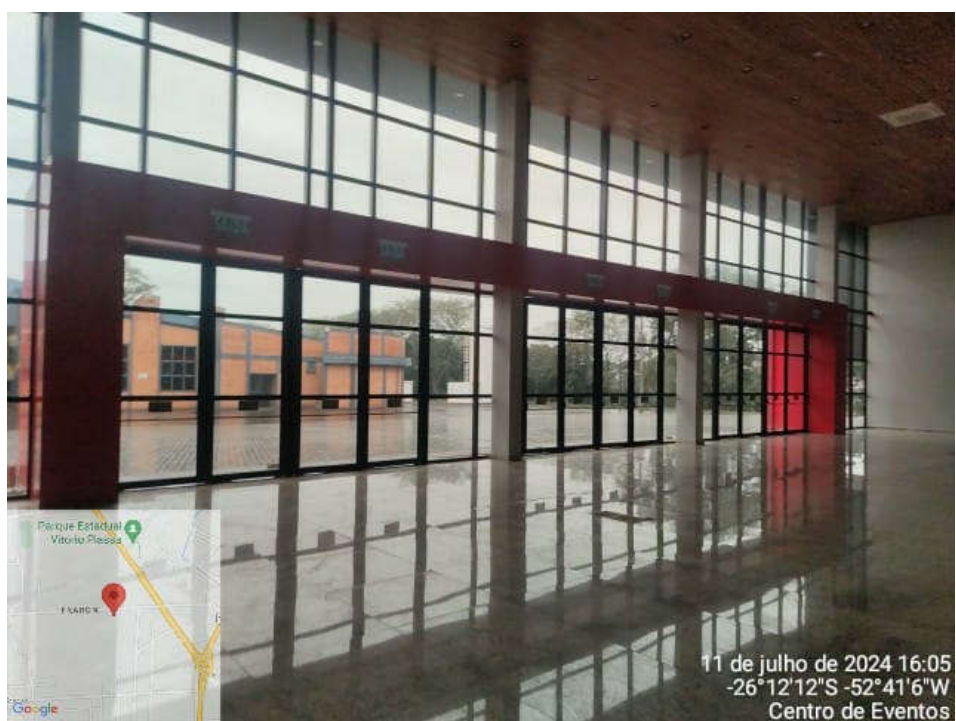
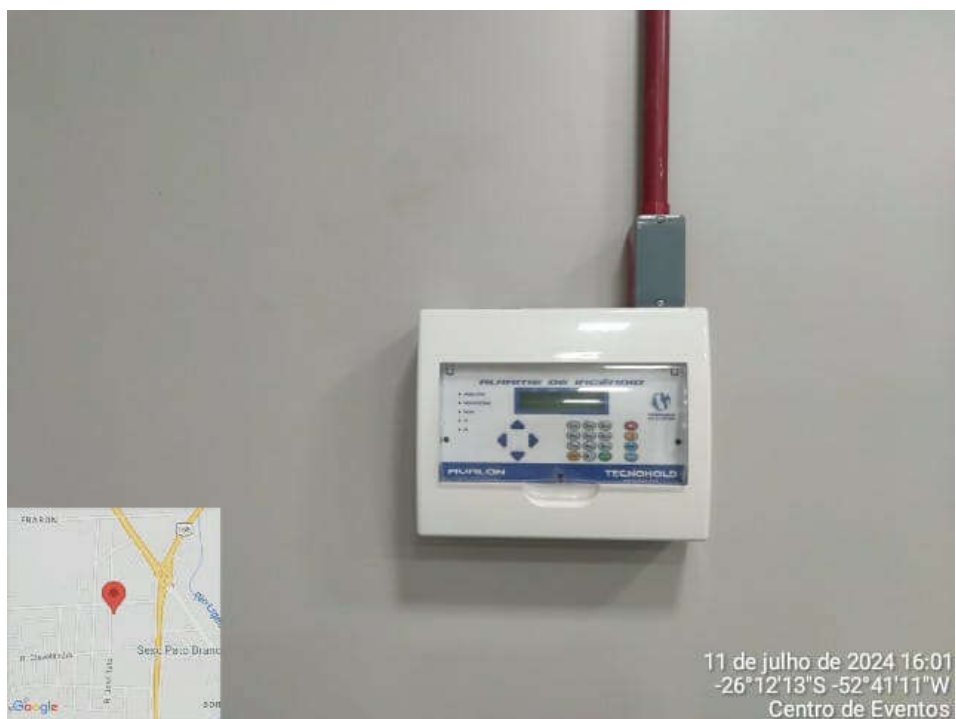



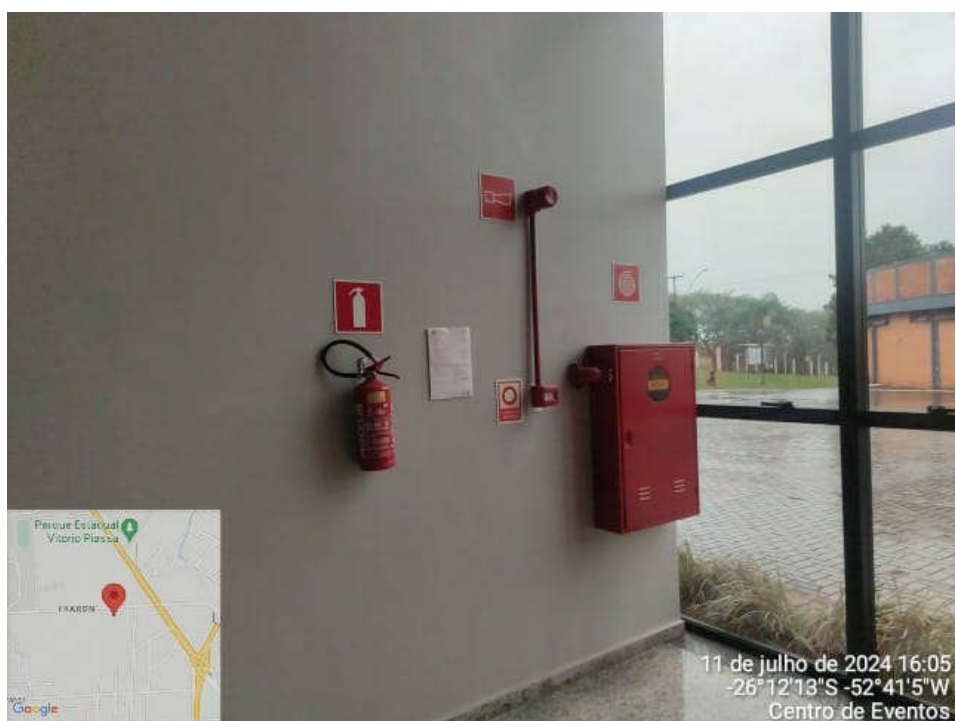


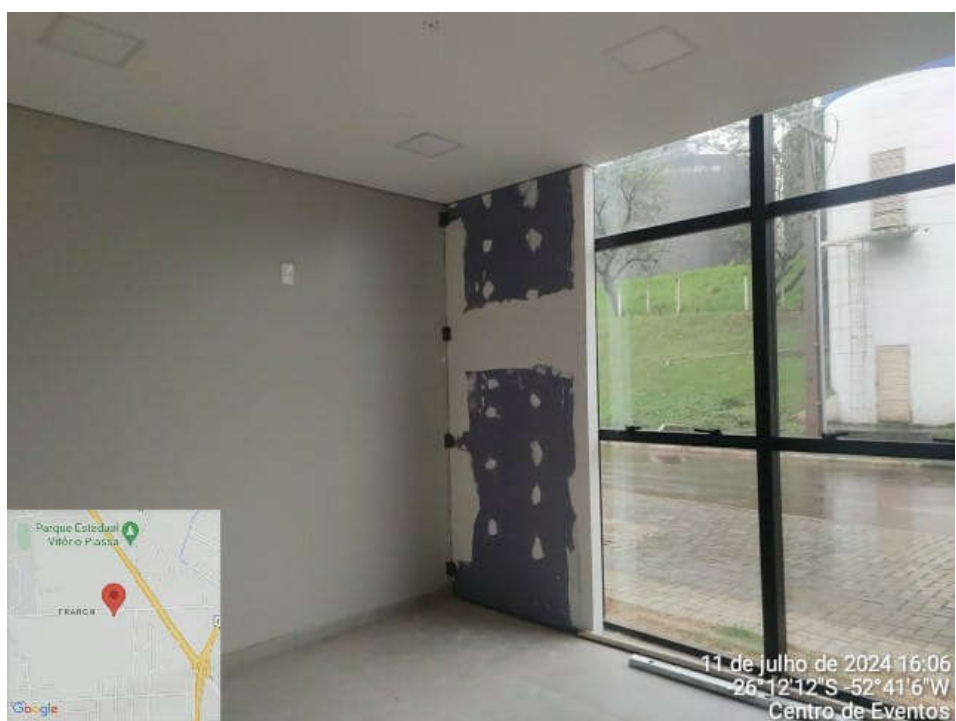


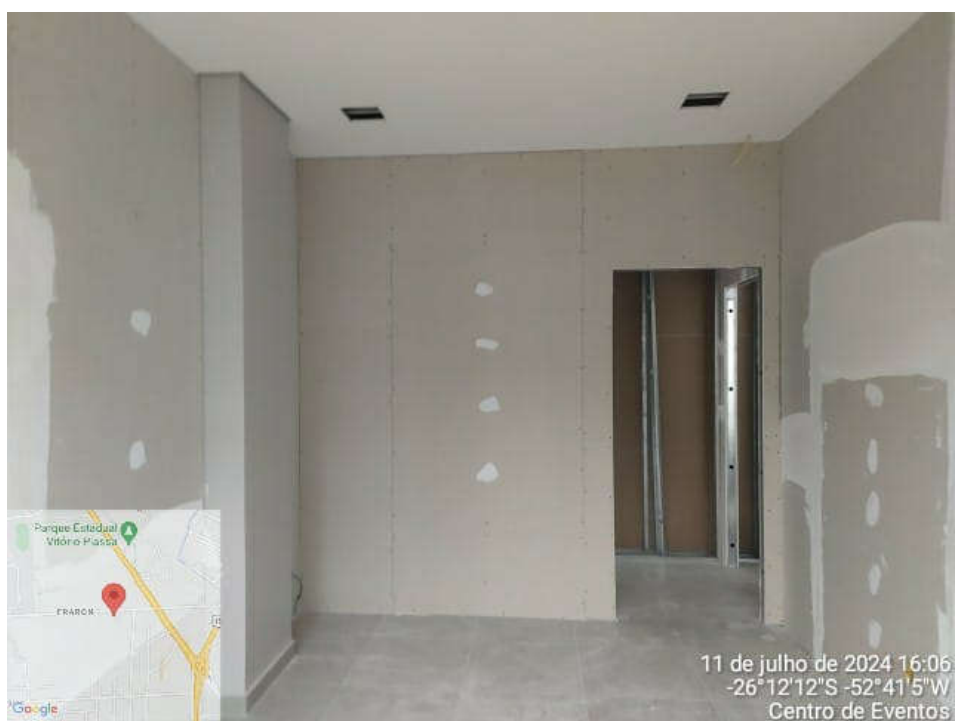


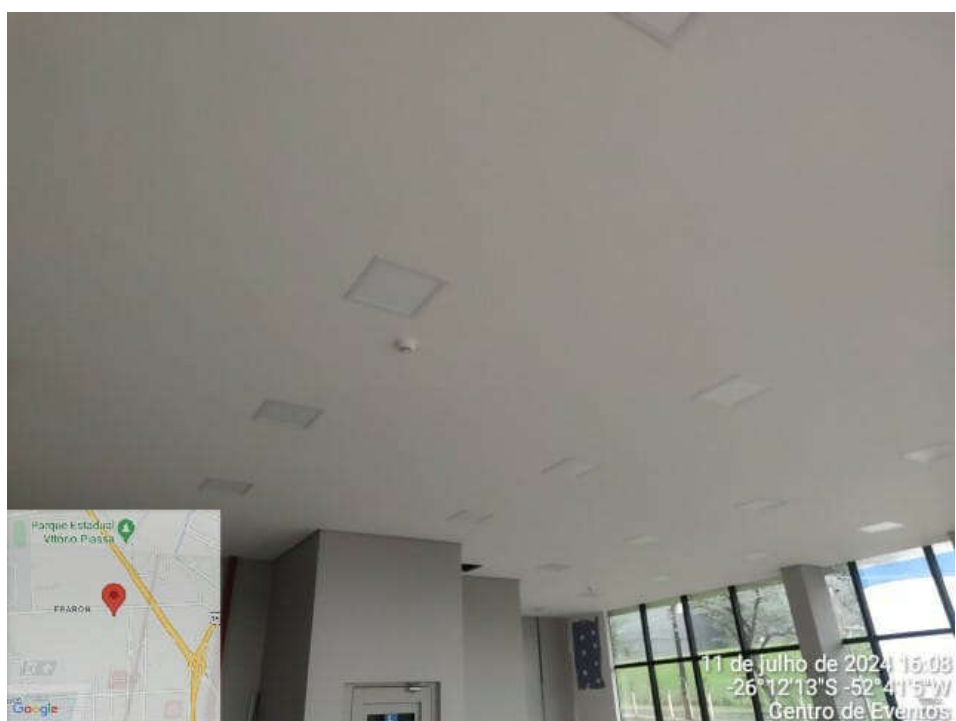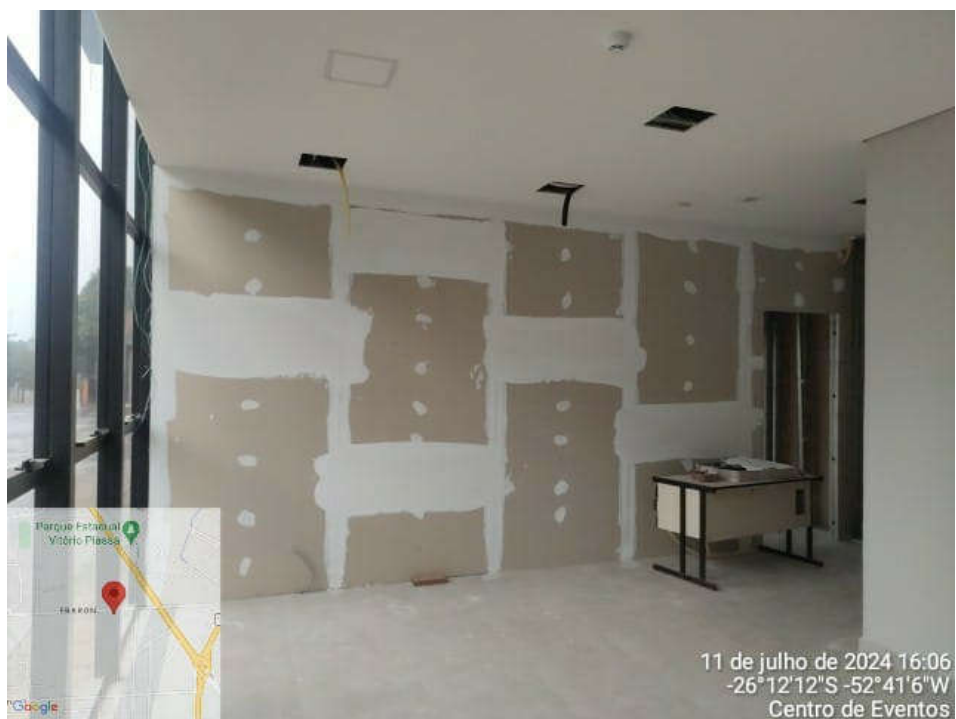

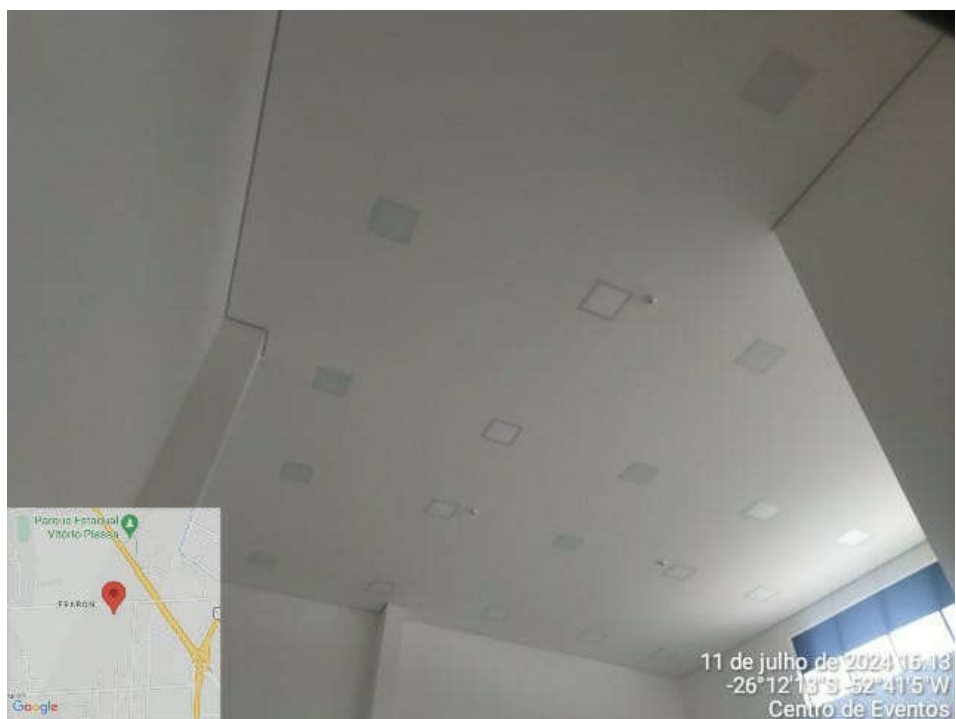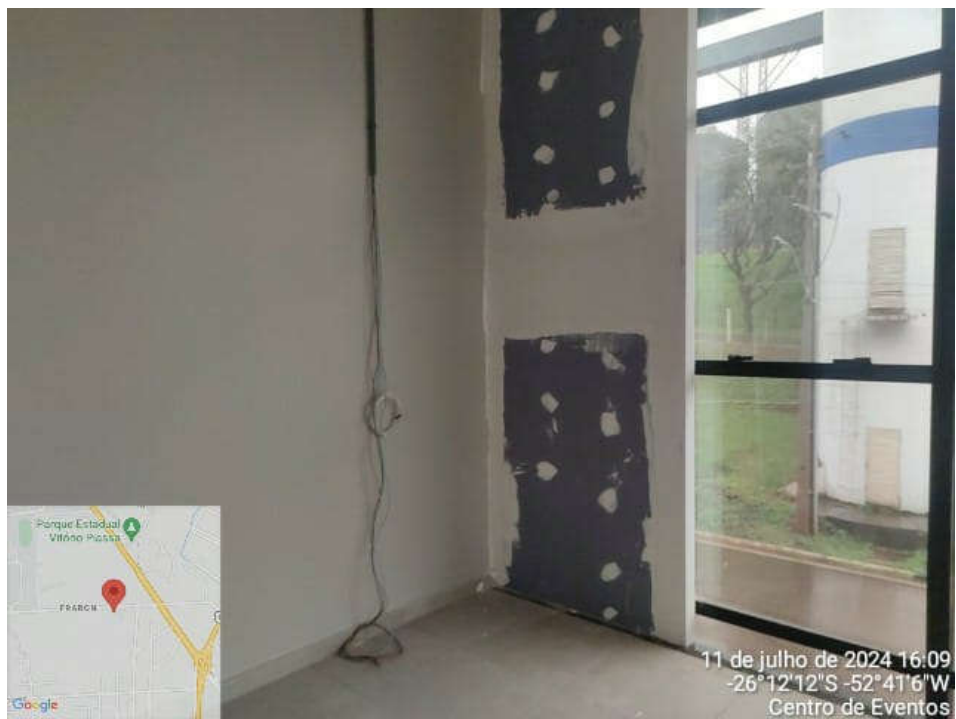

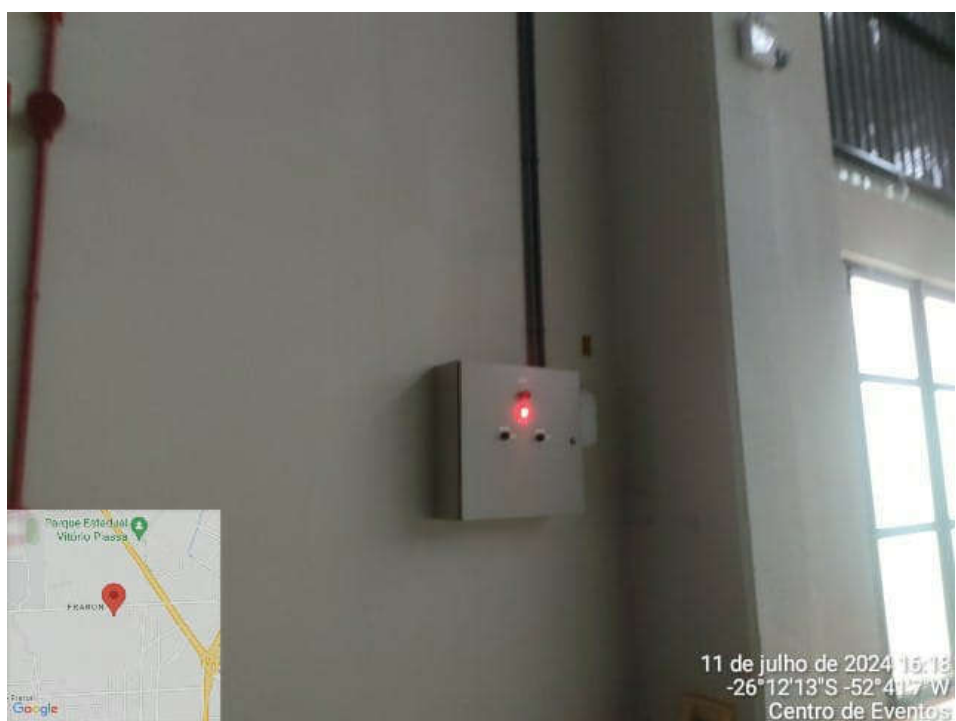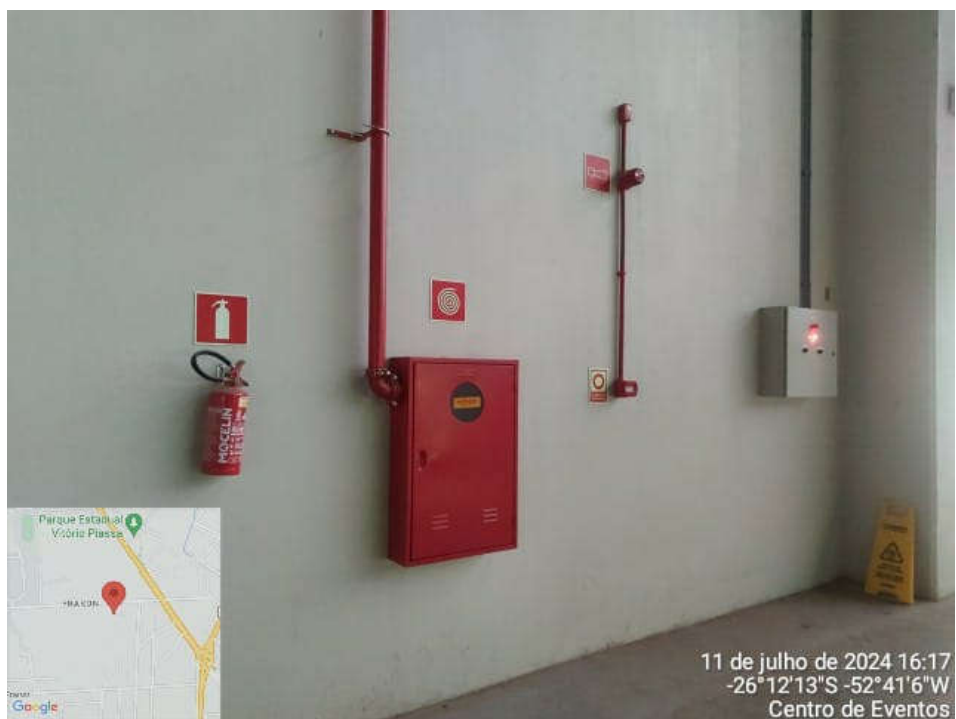

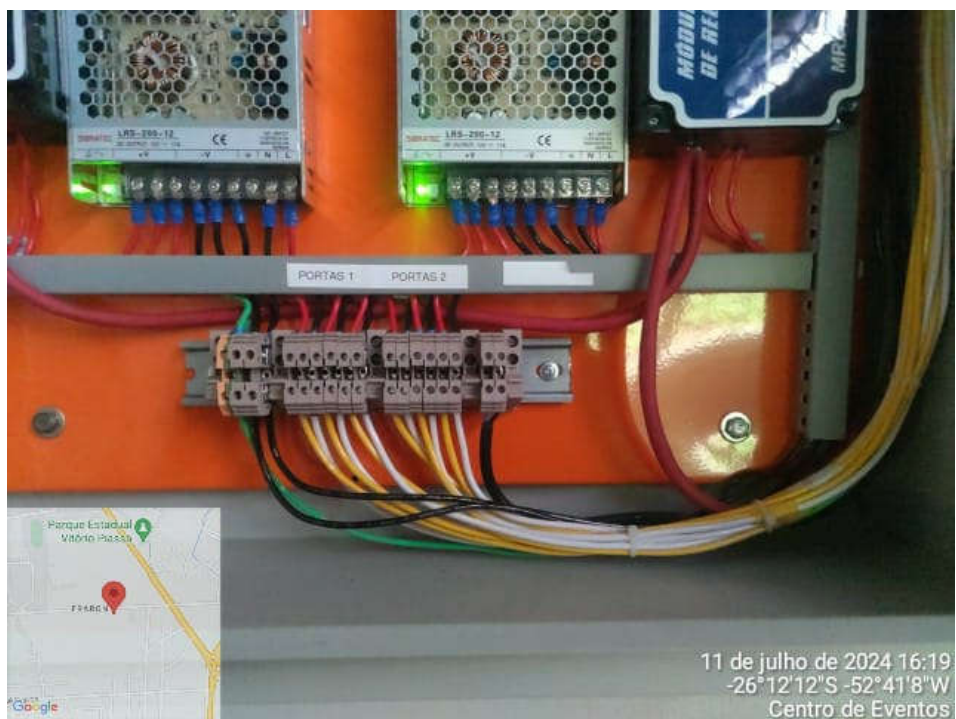

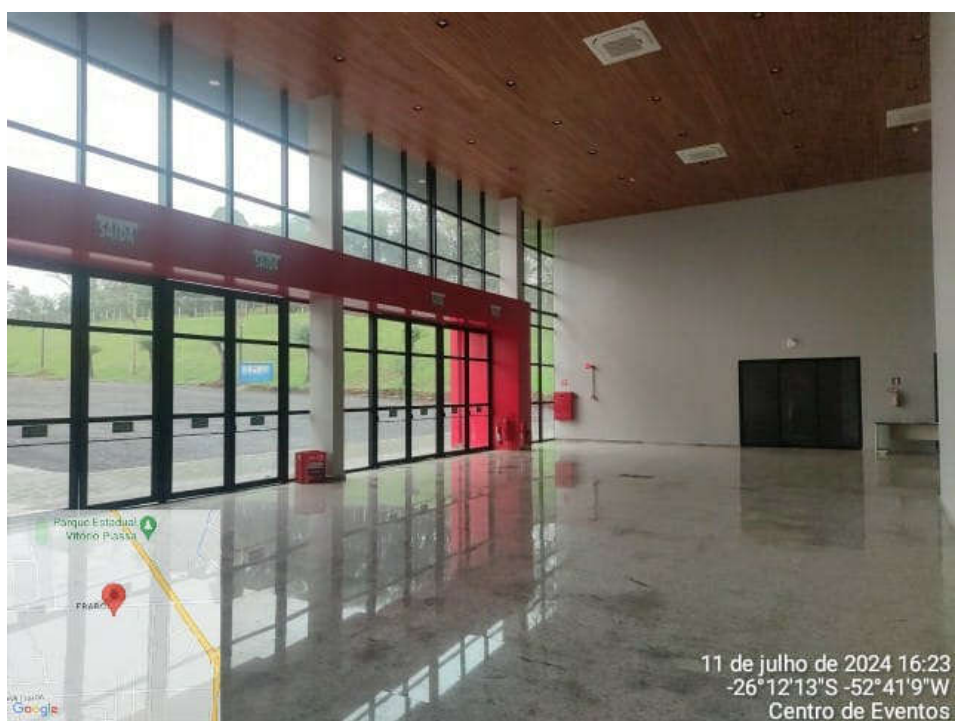



Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 205.239,23**.

Pato Branco, 12 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA ZIANNI MANARIM**
Data: 12/08/2024 14:39:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
