



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1ª	DATA	28/05/2024 - ter
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	13/2024	Nº	
DATA:	01/02/2024	DATA	

Mês	Mai
SAM	67
Lote	1
Ano	2024

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA
FIRMA EMPREITEIRA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	1.1.2		LOCACAO							-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	179,82	100,00%	0,0208	2,08%	65,72	11.817,77	11.817,77	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA							-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	8,00	25,00%	0,0195	0,49%	1.389,82	2.779,64	11.118,56	8.338,92
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.739,36	2.739,36	2.739,36	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA							-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.741,71	100,00%	0,0020	0,20%	0,41	1.124,10	1.124,10	-
	01	COMPOSIÇÃO	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	100,00%	0,0035	0,35%	2.005,84	2.005,84	2.005,84	-
	02	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO - PARA 5 CONTRIBUINTES	UN	1,00	100,00%	0,0067	0,67%	3.790,06	3.790,06	3.790,06	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA							-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA							-	-	-
	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	4.363,32	100,00%	0,0167	1,67%	2,18	9.512,04	9.512,04	-
	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	98,86	100,00%	0,0026	0,26%	15,18	1.500,69	1.500,69	-
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO							-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.556,18	100,00%	0,0319	3,19%	11,68	18.176,18	18.176,18	-
	2.1.9		COMPACTACAO MECANICA							-	-	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	988,70	100,00%	0,0013	0,13%	0,77	761,30	761,30	-
	2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS							-	-	-
	2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHAO							-	-	-
	2.2.1.5		BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS							-	-	-
	100996	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	4.210,71	100,00%	0,0299	2,99%	4,04	17.011,27	17.011,27	-
3	3		FUNDACOES							-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A) ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Mai PARCELA 1ª DATA 28/05/2024 - ter

MUNICÍPIO: PATO BRANCO SAM 67

SUBPROJETO: PRAÇA Lote 1

FIRMA EMPREITEIRA: ERGE CONSTRUTORA EIRELI Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA: Nº 13/2024

ORDEM DE SERVIÇO: Nº

DATA: 01/02/2024 DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-				-	-	-	-
	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	59,00	100,00%	0,0063	0,63%	61,14	3.607,26	3.607,26	-
4	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
x			SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
	COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	215,85	92,66%	0,0560	5,19%	147,62	29.524,00	31.863,78	2.339,78
	COMPOSIÇÃO	15	ALAMBRADO - QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME PROJETO - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	640,68	100,00%	0,1645	16,45%	146,15	93.635,38	93.635,38	-
5	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	100,00%	0,0012	0,12%	15,49	697,05	697,05	-
	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	465,00	50,00%	0,0145	0,73%	17,70	4.115,25	8.230,50	4.115,25
	8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		-				-	-	-	-
	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	12,00		0,0005		23,19	-	278,28	278,28
	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00		0,0018		28,84	-	1.038,24	1.038,24
	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	4,00		0,0001		7,73	-	30,92	30,92
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.300,00		0,0109		4,76	-	6.188,00	6.188,00
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	495,00		0,0060		6,93	-	3.430,35	3.430,35
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00		0,0004		24,07	-	240,70	240,70
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	100,00%	0,0026	0,26%	163,36	1.470,24	1.470,24	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A) ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Mai PARCELA 1ª DATA 28/05/2024 - ter

MUNICÍPIO: PATO BRANCO SAM 67

SUBPROJETO: PRAÇA Lote 1

FIRMA EMPREITEIRA: ERGE CONSTRUTORA EIRELI Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA: Nº 13/2024

ORDEM DE SERVIÇO: Nº

DATA: 01/02/2024 DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00				13,87	-	13,87	13,87
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		0,0003		61,03	-	183,09	183,09
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0001		61,03	-	61,03	61,03
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,0003		75,71	-	151,42	151,42
	8.2.13		TOMADAS		-				-	-	-	-
	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00		0,0002		46,70	-	93,40	93,40
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0001		42,00	-	42,00	42,00
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-				-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00		0,0009		89,23	-	535,38	535,38
	8.3.4		CORDOALHA		-				-	-	-	-
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4,00		0,0006		84,02	-	336,08	336,08
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00		0,0003		149,37	-	149,37	149,37
	COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	6,00		0,0010		92,94	-	557,64	557,64
	COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETO COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	4,00		0,0032		457,52	-	1.830,08	1.830,08
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	4,50		0,0007		90,49	-	407,21	407,21
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	4,50		0,0004		54,87	-	246,92	246,92
	03	COMPOSIÇÃO	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T	UN	1,00	100,00%	0,0044	0,44%	2.532,01	2.532,01	2.532,01	-
	04	COMPOSIÇÃO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=4.0M COM 01 LUMINÁRIA DE LED 100W	UN	20,00		0,0477		1.357,24	-	27.144,80	27.144,80
	05	COMPOSIÇÃO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=4.5M COM 02 LUMINÁRIA DE LED 60W	UN	9,00		0,0267		1.689,67	-	15.207,03	15.207,03
	06	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM 200x200x100	UN	29,00		0,0050		99,04	-	2.872,16	2.872,16
	07	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR I NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		0,0009		174,05	-	522,15	522,15
	17	COMPOSIÇÃO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=6M COM 03 REFLETORES DE LED 200W	UN	3,00		0,0163		3.086,99	-	9.260,97	9.260,97
	18	COMPOSIÇÃO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=6M COM 04 REFLETORES DE LED 200W	UN	3,00		0,0186		3.523,37	-	10.570,11	10.570,11
6	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A) ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Mai

PARCELA 1ª DATA 28/05/2024 - ter

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SAM 67

CONTRATO EMPREITADA: ORDEM DE SERVIÇO:

SUBPROJETO: PRAÇA

Lote 1

Nº 13/2024 Nº

FIRMA EMPREITEIRA: ERGE CONSTRUTORA EIRELI

Ano 2024

DATA: 01/02/2024 DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	266,08	266,08	266,08	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	100,00%	0,0014	0,14%	51,39	822,24	822,24	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	13	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UN	1,00		0,0042		2.369,09	-	2.369,09	2.369,09
	14	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO PARA BEBEDOURO, COM ANEIS DE CONCRETO PERFURADOS E BRITA N.4, CONSIDERANDO ESCAVAÇÃO	UN	1,00		0,0021		1.193,16	-	1.193,16	1.193,16
7	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	206,46	100,00%	0,0219	2,19%	60,24	12.437,15	12.437,15	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	245,88	100,00%	0,0284	2,84%	65,76	16.169,07	16.169,07	-
	10.4		PINTURAS		-				-	-	-	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-				-	-	-	-
	10.4.16		PINTURA EM PISO		-				-	-	-	-
	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	683,04		0,0319		26,55	-	18.134,71	18.134,71
8	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZACAO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.714,71	100,00%	0,0120	1,20%	2,52	6.841,07	6.841,07	-
	11.1.10		SINALIZACAO		-				-	-	-	-
	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	431,00		0,0083		10,93	-	4.710,83	4.710,83
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	2.052,59	100,00%	0,0471	4,71%	13,05	26.786,30	26.786,30	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	rancisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1ª	DATA	28/05/2024 - ter
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	13/2024	Nº	
DATA:	01/02/2024	DATA	

Mês	Mai
SAM	67
Lote	1
Ano	2024

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA
FIRMA EMPREITEIRA:	ERGE CONSTRUTORA EIRELI

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	48,68	100,00%	0,0087	0,87%	101,58	4.944,91	4.944,91	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	77,88	100,00%	0,0139	1,39%	101,75	7.924,29	7.924,29	-
	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	11,62	100,00%	0,0026	0,26%	127,90	1.486,20	1.486,20	-
	orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	332,54	100,00%	0,0107	1,07%	18,36	6.105,43	6.105,43	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	228,25	100,00%	0,0227	2,27%	56,51	12.898,41	12.898,41	-
	COMPOSIÇÃO	fevereiro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	62,30	100,00%	0,0073	0,73%	66,68	4.154,16	4.154,16	-
	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	683,04	100,00%	0,1438	14,38%	119,82	81.841,85	81.841,85	-
	22.150.0000	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	631,30	100,00%	0,0167	1,67%	15,03	9.488,44	9.488,44	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	1,19	100,00%	0,0002	0,02%	90,49	107,68	107,68	-
	94964	SINAPI	ERGE	M3	1,19		0,0008		381,65	-	454,16	454,16
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00		0,0045		2.552,21	-	2.552,21	2.552,21
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	3,00		0,0155		2.940,00	-	8.820,00	8.820,00
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	1,00		0,0019		1.101,91	-	1.101,91	1.101,91
	9	COMPOSIÇÃO	GUIA DE CONCRETO 10X25CM EXECUTADO IN LOCO PARA TRAVAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M	485,50	100,00%	0,0130	1,30%	15,25	7.403,88	7.403,88	-
	10	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UN	3,00		0,0109		2.059,15	-	6.177,45	6.177,45
	11	COMPOSIÇÃO	BANCO VAZADO EM CONCRETO, COMPRIMENTO DE 2,0M, ALTURA DE 0,55M, LARGURA DE 0,50M, ESPESSURA DE 10CM, REVESTIDO EM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - CONFORME PROJETO - INCLUSO PINTURA	UN	7,00		0,0194		1.580,46	-	11.063,22	11.063,22
	12	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UN	1,00		0,0067		3.818,99	-	3.818,99	3.818,99
	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4,00		0,0082		1.165,22	-	4.660,88	4.660,88
	9		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	-
	99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.294,50		0,0024		0,60	-	1.376,70	1.376,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A) ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Mai

PARCELA 1ª DATA 28/05/2024 - ter

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SAM 67

CONTRATO EMPREITADA: N° 13/2024

SUBPROJETO: PRAÇA

Lote 1

ORDEM DE SERVIÇO: N°

FIRMA EMPREITERA: ERGE CONSTRUTORA EIRELI

Ano 2024

DATA: 01/02/2024 DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-

GLOBAL - LOTE 1	% PREVISTO :	9,98%	% EXECUTADO :	71,43%	SOMAS	406.476,60	569.095,06	162.618,46
------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	-------	-------------------	-------------------	-------------------

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$569.095,06
	Medição Acumulada:	406.476,60
	Total Anterior:	-
	Valor Desta Medição:	R\$406.476,60

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

MARCOS VINICIUS GOMES
07976998994

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES:
07976998994
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=346829000144, OU=videoconferencia, CN=MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994
* Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.06.18 15:35:44-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

ERGE CONSTRUTORA EIRELI
MARCOS VINICIUS GOMES
ARQTO. URB. - CAU 129307-9

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO BELLEI
Data: 21/06/2024 08:46:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL EDUARDO BELLEI
ENGº CIVIL - CREA PR- 185508/D

ROBSON CANTU:44143664968
64968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.06.21 09:04:11 -03'00'

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
 PROJETO : PRAÇA
 CONVÊNIO Nº. 353/2023 PAM
 EMPRESA VENCEDORA : ERGE CONSTRUTORA EIRELI
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 13/2024
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 569.095,06
 SAM : Nº. 67
 LOTE : Nº. 1
 DATA : 01/02/2024
 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
 Nº DA LICITAÇÃO: 010/2023
 MEDIÇÃO Nº: 1ª
 DATA DA MEDIÇÃO : 28/05/2024
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 28/09/2024
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/05/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR		PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS				(R\$)	(%)		
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	32.595,69	74,42%	32.595,69	24.256,77		24.256,77	74,42%	
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	50,00%	23.480,74	100,00%	46.961,48	46.961,48		46.961,48	100,00%	
3	3	FUNDAÇÕES	20,00%	721,45	100,00%	3.607,26	3.607,26		3.607,26	100,00%	
4	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	98,14%	125.499,16	123.159,38		123.159,38	98,14%	
5	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	9,35%	94.321,00	8.814,55		8.814,55	9,35%	
6		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	23,40%	4.650,57	1.088,32		1.088,32	23,40%	
7		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	61,20%	46.740,93	28.606,22		28.606,22	61,20%	
8	11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	-	-	79,68%	213.342,27	169.982,62		169.982,62	79,68%	
9	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	1.376,70	-		-	-	
10			-	-	-	-	-		-	-	
11			-	-	-	-	-		-	-	
12			-	-	-	-	-		-	-	
TOTAL CRONOGRAMA				56.797,88			406.476,60				
TOTAL MEDIÇÃO											
OK								Parcial			
Acumulado								Dest			
Med. Anterior								Medição			
									406.476,60		

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$406.476,60

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 010/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCOS VINICIUS GOMES: 07976998994
 Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=34692300000144, OU=videoconferencia, CN=MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.06.18 15:35:59 -03'00'
 Fossil PhantomPDF, Versão: 10.1.0

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 EDUARDO BELLEI
 Data: 21/06/2024 08:46:27 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968
 Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
 Dados: 2024.06.21 09:04:38 -03'00'

ERGE CONSTRUTORA EIRELI
 MARCOS VINICIUS GOMES
 ARQTO. URB. - CAU 129307-9

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
 FISCAL EDUARDO BELLEI
 ENG° CIVIL - CREA PR- 185508/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
 ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO Pato Branco - PR

PROJETO/LOTE Nº 67 | Lote Nº 1 | PRAÇA / MEU CAMPINHO |

Convênio: 353/2023

PROGRAMA PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

CONTRATADA ERGE CONSTRUTORA EIRELI

CONTRATO Nº 13/2024

OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de Praça/Meu Campinho Na Rua Benjamin Borges dos Santos, Lote 04, Quadra 1638 no bairro Fraron, contendo: quadra poliesportiva, meia quadra de basquete, acessos em paver, passeio, grama, lixeiras, mesas e bancos e instalações elétricas. Serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; diversos (limpeza, ensaios tecnológicos, equipamentos) e demais e especificações constantes em projeto. Área Construída: 3123,47 m². Colocação de placas de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n.º 10/2023, fornecida pelo CONTRATANTE.

MEDIÇÃO Nº 01

DATA DA VISTORIA: 28/05/2024

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01 / 02 / 2024 até 28 / 05 / 2024.


SERVIÇOS EXECUTADOS



01.PLACA DA OBRA ATUALIZADA .



01.DETALHE DA PLACA DA OBRA (QRCODE).

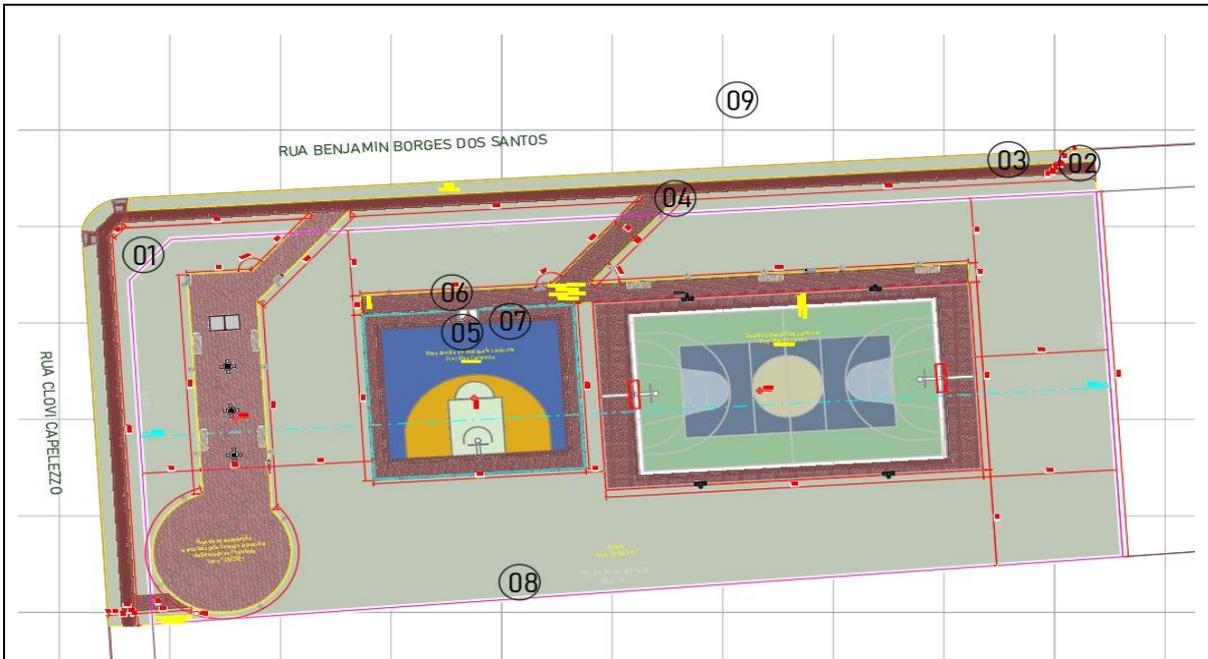

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS.




02. QUADRA POLIESPORTIVA.



03. CALÇADA FRENTE DA OBRA.



04. GRAMA, ENTRADA DE ÁGUA E QUADRA POLIESPORTIVA.

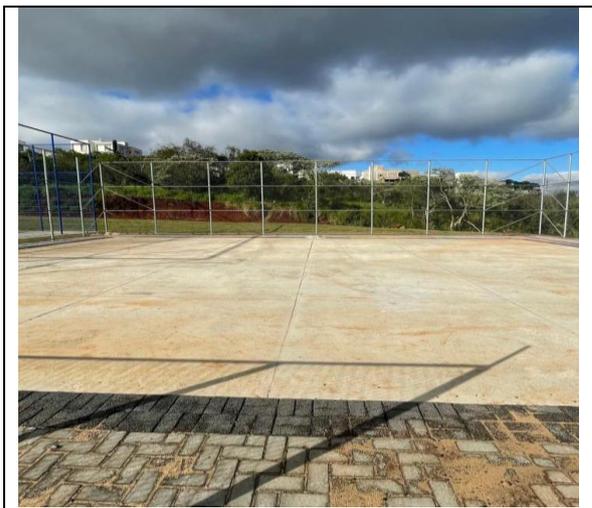

05. MEIA QUADRA DE BASQUETE E CERCAMENTO.



06. CERCA E CALÇADA.



07. PISO INTERTRAVADO DRENANTE



08. QUADRA POLIESPORTIVA E GRAMA



09. FOTO PANORÂMICA DA OBRA

Pato Branco , 28 de Maio de 2024.



Documento assinado digitalmente
EDUARDO BELLEI
Data: 11/06/2024 15:13:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Bellei
164.074/D CREA-PR
ART - 1720243277869
