



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº Operação 0	Nº Siconv 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS	INÍCIO DE OBRA 16/01/24
Nº CTEF 194/2023	EMPRESA EXECUTORA VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ 12.244.460/0001-44	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 55,49%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS					TOTAL:	3.430.684,51	-	55,49	55,49	-	1.903.602,08	1.903.602,08
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				3.430.684,51	-	55,49	55,49	-	1.903.602,08	1.903.602,08	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				16.256,64	-	60,00	60,00	-	9.753,98	9.753,98	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				16.256,64	-	60,00	60,00	-	9.753,98	9.753,98	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				235.547,42	-	17,57	17,57	-	41.394,60	41.394,60	
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)				4.508,52	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019				151.727,40	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				4.511,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				74.800,50	-	55,34	55,34	-	41.394,60	41.394,60	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				3.112.327,69	-	59,52	59,52	-	1.852.453,50	1.852.453,50	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30				74.944,59	-	27,36	27,36	-	20.504,84	20.504,84	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C				131.205,22	-	64,32	64,32	-	84.391,20	84.391,20	
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				2.742.879,26	-	59,65	59,65	-	1.636.127,48	1.636.127,48	
1.3.4.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020				16.927,43	-	59,65	59,65	-	10.097,21	10.097,21	
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				146.371,19	-	69,23	69,23	-	101.332,77	101.332,77	
1.4.	SINALIZAÇÃO				66.552,76	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO				28.983,58	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA				6.349,64	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO				31.219,54	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR
Local
segunda-feira, 18 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ANDERSON ROSSATTO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-124.502/D

ANDERSON
CACERES FARIAS
ROSSATTO:0661
8906946

Assinado de forma digital
por ANDERSON CACERES
FARIAS
ROSSATTO:06618906946
Dados: 2024.03.19
10:04:40 -03'00'



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS	INÍCIO DE OBRA 16/01/24
Nº CTEF 194/2023	EMPRESA EXECUTORA VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ 12.244.460/0001-44	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/01/2024 a 18/03/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 55,49%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PARQUES INDUSTRIAIS					TOTAL:	3.430.684,51	-	55,49	55,49	-	1.903.602,08	1.903.602,08

ART/RRT: 1720240384990

Recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico e pavimento asfáltico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Maria Daminelli Marini Travessa Ademar Cantu no Parque Industrial Eduardo Daggios, com área de 11.078,00m², nas Ruas A, B e C do Parque Industrial CETIS, com área de 3.603,00m² e nas Ruas Getúlio Dal Pasqualle, Ulisses Viganó, Pedro Detoni e Avenida Piacentini no Parque Industrial Theófilo Petrycoski, com área de 13.524,00m², totalizando uma área de 28.205,00m².

CONTRATO Nº 194/2023/GP

Relatório de Medição nº 1

DATA: 18/03/2024

Empresa Contratada: **VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Responsável: Guilherme Elias Piassa CREA-PR 86.745/D
ART Nº 1720240461936

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1ª medição, constatando o percentual relativo às quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 01: Pintura de Ligação Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 02: Pintura de Ligação e Reperfilagem Travessa Ademar Cantu.



Foto 03: Reperfilagem Rua Maria Daminelli Marini.



Foto 04: Imprimação Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 05: Pintura de Ligação Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 06: Reperfilagem Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 07: Execução de CBUQ Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 08: Execução de CBUQ Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 09: Imprimação Rua C.



Foto 10: Imprimação Rua A.



Foto 11: Pavimento Rua Pioneiro Avelino A. Chioquetta.



Foto 12: Reperfilagem Rua C.

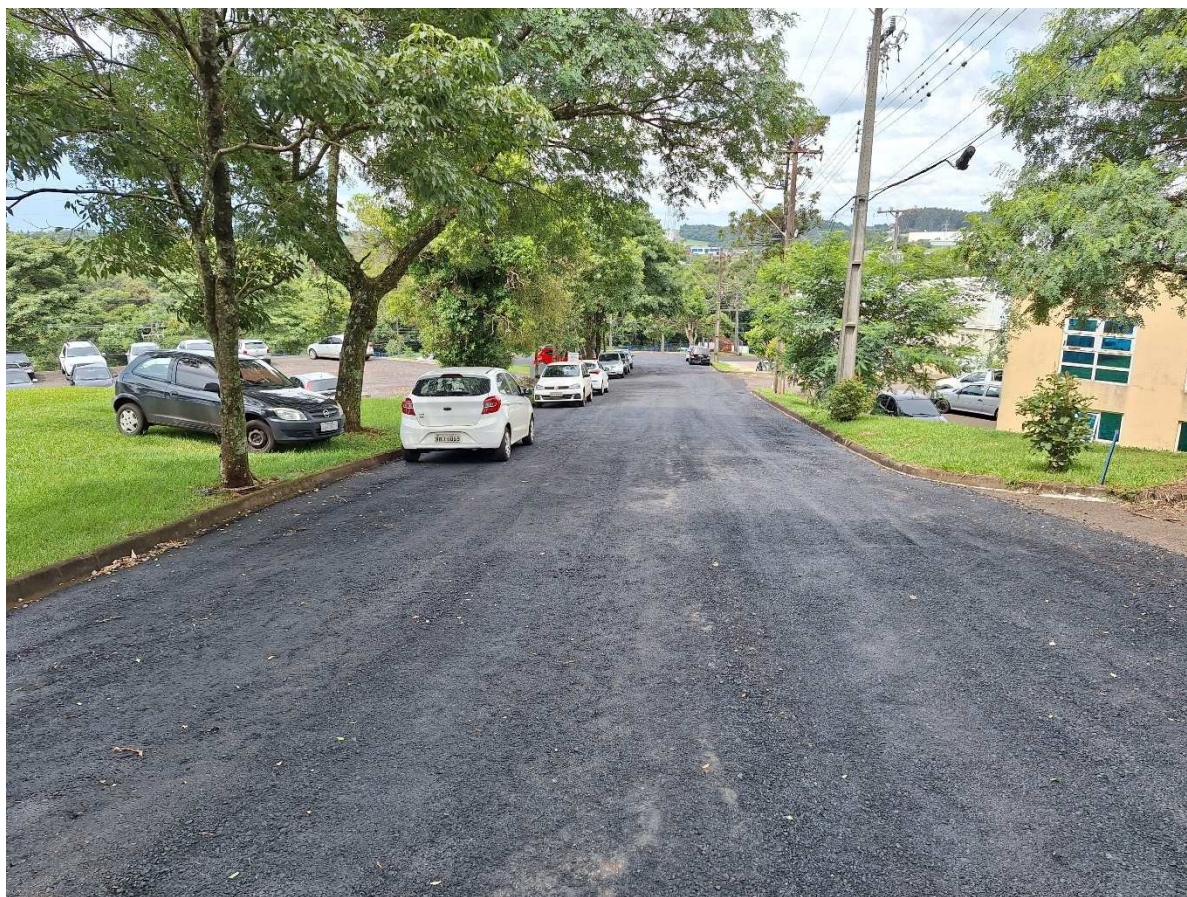


Foto 13: Reperfilagem Rua B.

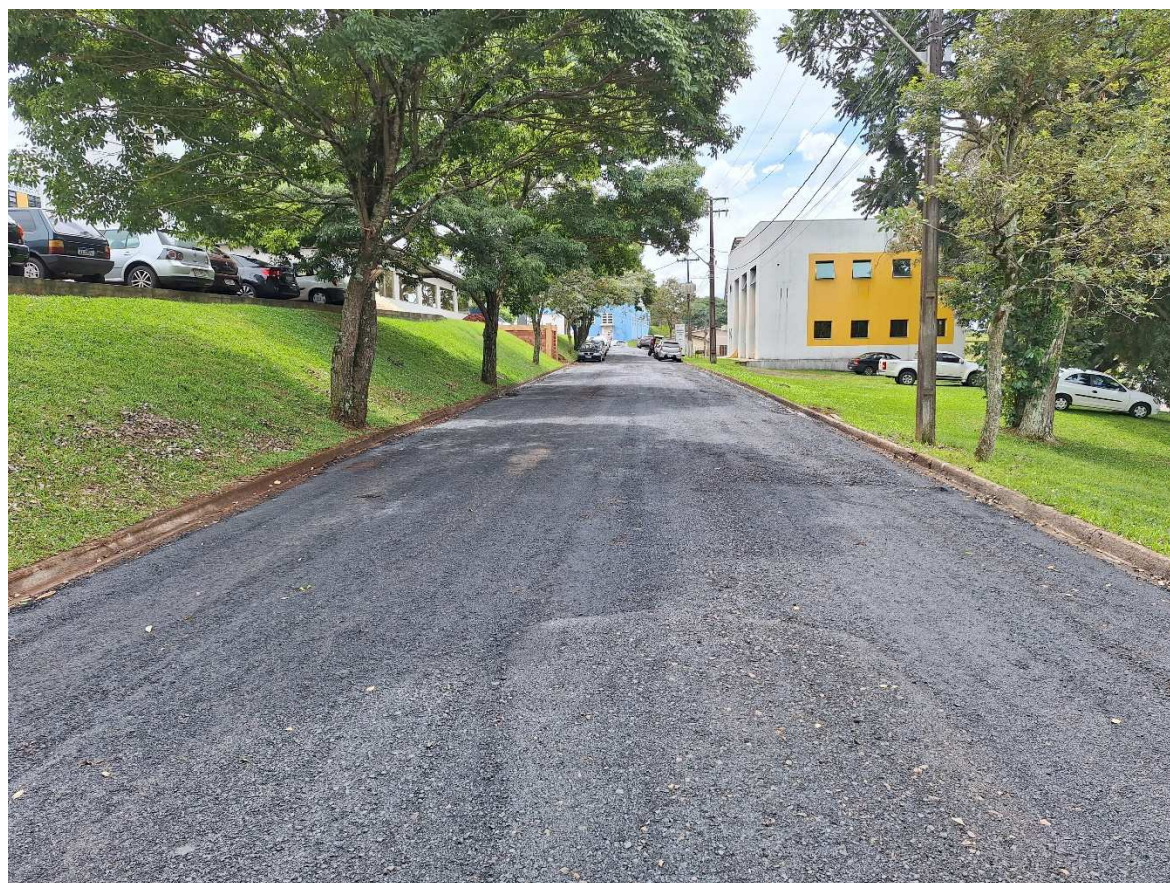


Foto 14: Reperfilagem Rua A.



Foto 15: Execução CBUQ Rua C.



Foto 16: Pavimentação Rua A.



Foto 17: Pavimentação Rua B.



Foto 18: Extração de Corpo de Prova Rua Pioneiro A. A. Chioquetta.



Foto 19: Extração de Corpo de Prova Rua Pioneiro A. A. Chioquetta.



Foto 20: Extração de Corpo de Prova Rua C.



Foto 21: Extração de Corpo de Prova Rua C.

Conforme a Cláusula Décima Primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II- Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

III- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT.

O laudo de controle tecnológico da massa asfáltica empregada e sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART 1720241276350) estão arquivados em formato digital na pasta da obra no diretório “Z:” na Secretaria de Engenharia e Obras.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 1.903.602,08.

Pato Branco, 18 de março de 2024.

ANDERSON
CACERES FARIAS
ROSSATTO:0661
8906946

Assinado de forma digital
por ANDERSON CACERES
FARIAS
ROSSATTO:06618906946
Dados: 2024.03.19
10:05:15 -03'00'

ANDERSON ROSSATTO
CREA-PR 124.502/D
ART DE FISCALIZAÇÃO 1720240384990
