

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:									Nº	19/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:									DATA:	09/02/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,25	100,00%	0,0273	2,73%	73,50	7.882,88	7.882,88	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-				-	-	-	-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	100,00%	0,0536	5,36%	154,65	15.465,00	15.465,00	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	83,33%	0,0323	2,69%	1.554,47	7.772,35	9.326,82	1.554,47
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0113	1,13%	3.247,38	3.247,38	3.247,38	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	774,12	100,00%	0,0012	0,12%	0,46	356,10	356,10	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA	M	37,00	100,00%	0,0025	excesso	19,66	727,41	727,41	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	104,00	100,00%	0,0025	0,25%	6,82	709,28	709,28	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						-	-	-	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	275,46	100,00%	0,0094	0,94%	9,89	2.724,30	2.724,30	-
3	4		ESTRUTURAS						-	-	-	-
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9,64	100,00%	0,0039	0,39%	116,76	1.125,57	1.125,57	-
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00	100,00%	0,0201	2,01%	17,33	5.805,55	5.805,55	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ					
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
									Mês	Jul	PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO							SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:		PRAÇA - Parque do Som							Lote	3	Nº	19/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.							Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0026	0,26%	15,22	761,00	761,00	-		
	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00%	0,0069	0,69%	19,81	1.981,00	1.981,00	-		
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-	-	-		
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	18,74	56,22	56,22	-		
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	100,00%	0,0004	0,04%	24,62	123,10	123,10	-		
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-		
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-		
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00		0,0083		4,80	-	2.400,00	2.400,00		
	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00		0,0028		17,82	-	801,90	801,90		
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-		
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	117,36	117,36	117,36	-		
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-		
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0029	0,29%	830,06	830,06	830,06	-		
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-		
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-		
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0001		15,52	-	15,52	15,52		
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-		
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		68,26	-	68,26	68,26		
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,0006		84,67	-	169,34	169,34		
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-		
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0002		46,98	-	46,98	46,98		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-		
	16.105.0000	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	100,00%	0,0094	0,94%	2.720,52	2.720,52	2.720,52	-		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ					
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
									PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg		
									Mês	Jul				
MUNICÍPIO:									SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:									Lote	3	Nº	19/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:									Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6,00	100,00%	0,0022	0,22%	107,89	647,34	647,34	-		
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	4,50	100,00%	0,0010	0,10%	65,42	294,39	294,39	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0007		207,93	-	207,93	207,93		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00	100,00%	0,0063	0,63%	130,54	1.827,56	1.827,56	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=4,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00		0,0966		2.145,38	-	27.889,94	27.889,94		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRACA PARQUE DO SOM	UNID	1,00	20,00%	0,0049	0,10%	1.403,23	280,65	1.403,23	1.122,58		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00		0,0022		52,56	-	630,72	630,72		
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-	-	-		
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-		
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-		
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0010	0,10%	297,61	297,61	297,61	-		
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	166,29	166,29	166,29	-		
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00		0,0004		102,65	-	102,65	102,65		
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-		
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-		
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,65	100,00%	0,0005	0,05%	15,52	149,77	149,77	-		
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	-		
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	100,00%	0,0001	0,01%	11,84	35,52	35,52	-		
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	100,00%	0,0001	0,01%	16,29	32,58	32,58	-		
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-		
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,65	100,00%	0,0003	0,03%	45,33	74,79	74,79	-		
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-		
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	100,00%	0,0009	0,09%	31,62	252,96	252,96	-		
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,70	30,70	30,70	-		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO		SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:				
SUBPROJETO:		PRAÇA - Parque do Som		Lote	3	Nº	19/2024	Nº				
FIRMA EMPREITERA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.		Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA				
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0032	0,32%	912,16	912,16	912,16	-
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	150,54		0,0351		67,37	-	10.141,88	10.141,88
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,02		0,0186		73,55	-	5.370,62	5.370,62
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	275,46	19,97%	0,1039	2,07%	108,85	5.986,75	29.983,82	23.997,07
7	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZACAO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	483,46	56,98%	0,0047	0,27%	2,82	776,80	1.363,36	586,56
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	94,00		0,0159		48,87	-	4.593,78	4.593,78
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018	UN	16,00		0,0062		111,62	-	1.785,92	1.785,92
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	296,97		0,0150		14,60	-	4.335,76	4.335,76
	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	95,78	95,78	95,78	-
	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	84,53	84,53	84,53	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 08/2017	M3	13,77	100,00%	0,0058	0,58%	121,31	1.670,44	1.670,44	-
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	179,05		0,0136		21,89	-	3.919,40	3.919,40
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1,00		0,0018		522,79	-	522,79	522,79



ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
		Mês	Jul	PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	Lote	3	Nº	19/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

[illegible]

GLOBAL - LOTE 1	% PREVISTO	38,37%	% EXECUTADO :	66,28%	SOMAS	191.325,42	288.652,40	97.326,98
------------------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------------------	-------------------	------------------

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R\$288.652,40
Medição Acumulada:	191.325,42
Total Anterior:	73.836,49
Valor Desta Medição:	R\$117.488,93

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 06/08/2024 13:48:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JORGE EDUARDO CHIOQUETA
Data: 02/08/2024 12:06:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ROBSON
CANTU:44143
664968

**Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de
Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2**

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
Fiscal: Jorge Eduardo Chioqueta
ENGº CIVIL - CREA PR-125.425/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
PROJETO : PRAÇA - Parque do Som
CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

MEDIÇÃO Nº: 2
DATA DA MEDIÇÃO : 29/07/2024

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
CONTRATO EMPREITADA Nº : 19/2024 DATA : 09/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO : 288.652,40
SAM : Nº. 74
LOTE : Nº. 3

PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/08/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/02/2025

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	37.714,87	95,88%	37.714,87	36.160,40
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	2.724,30	100,00%	2.724,30	2.724,30
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	1.125,57	100,00%	1.125,57	1.125,57
4	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	20,00%	9.759,58	31,65%	48.797,92	15.444,75
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10,00%	205,50	95,00%	2.055,03	1.952,38
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	15,00%	6.824,44	13,16%	45.496,32	5.986,75
7	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	35,00%	52.413,48	85,43%	149.752,81	127.931,27
8	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		985,58	-
9				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				110.767,74		TOTAL MEDIÇÃO	191.325,42

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$117.488,93

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 06/08/2024 13:48:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JORGE EDUARDO CHIOQUETA
Data: 02/08/2024 12:06:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ROBSON
CANTU:441436
64968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.08.07 08:42:51 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
Fiscal: Jorge Eduardo Chioqueta
ENGº CIVIL - CREA PR-125.425/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medicação:	74 / 3 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato N°:	19/2024
Data da Vistoria:	30/07/2024

Objeto:

Revitalização da Praça Parque do Som, contendo: Área de conviência, Pergolado e área de jogos e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **12/04/2024** até **29/07/2024**.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | Placa de obra



2 | Detalhe da placa de obra

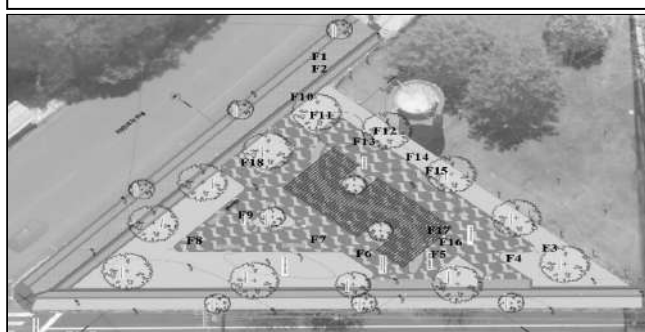

Mapa de localização das fotos



3 | bancos e mesa de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas



4 | base para piso permeável, instalações elétricas



5 | banco de concreto, pergolado, instalações elétricas



6 | piso permeável



7 | piso permeável, bancos de concreto, instalações elétricas



8 | base para piso permeável, instalações elétricas



9 | mureta do lavatório




10 | mureta da entrada de energia, quadro de entrada de energia



11 | bancos de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas



12 | base para piso permeável, banco de concreto

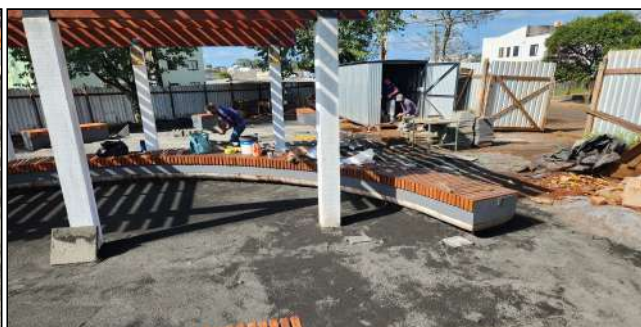

13 | bancos de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas



14 | base para piso permeável, mesa de concreto



15 | bancos e mesa de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas




16 | banco de concreto



17 | instalações elétricas



18 | container, mureta do bebedouro, sumidouro

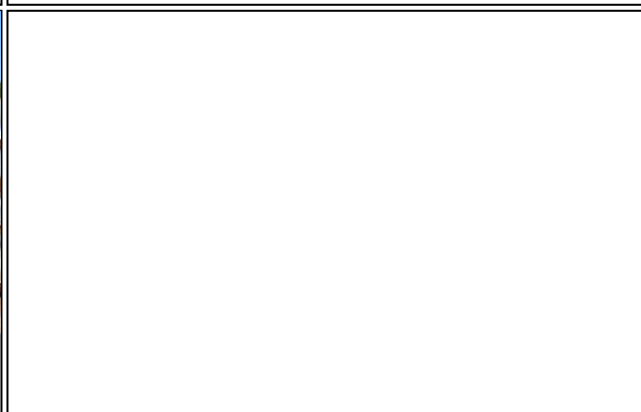

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19327/medicao/10834/relatorio-fotografico/293>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 31 de julho de 2024.

Jorge Eduardo Chioqueta
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: CREA PR 125.426/D

 Documento assinado digitalmente
JORGE EDUARDO CHIOQUETA
Data: 31/07/2024 15:38:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>
