



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 01 de setembro 2022.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº 07.831.067/0001-17
Contrato nº 153/2021-GP

Execução dos serviços de cercamento de 6 (seis) Escolas Municipais e 5 (cinco) CMEI'S do município de Pato Branco com muro palito de concreto armado em forma de lápis, com metragem total de 1.472,80 metros lineares, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 1.281.455,77	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 07/04/2022	0,90	11.522,71	99,10	R\$ 1.269.933,06
A liberar 2.ª Parcela em 17/05/2022	1,19	15.283,50	97,91	R\$ 1.254.649,56
A liberar 3.ª Parcela em 30/06/2022	4,93	63.228,81	95,06	R\$ 1.218.226,96
A liberar 4.ª Parcela em 03/08/2022	12,96	76.041,72	87,04	R\$ 1.142.185,24
A liberar 4.ª Parcela em 01/09/2022	14,86	24.326,18	72,18	R\$ 1.117.859,06

Valor a ser liberado em 01/09/2022 R\$ 24.326,18

Gestora e fiscal do contrato.

Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato

Adernanda Paula dos Santos
Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato

PROPOSITOR / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0 CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE	13/12/21
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/08/2022 a 01/09/2022
				Nº MEDIÇÃO
				5

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM									
	TOTAL:		1.281.455,77	12,96	1,00	14,38	186.976,74	24.326,15	199.402,92
1.	CMEI TRÊS MARIAS		112.015,08	-	-	-	-	-	-
1.1.	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		3.747,56	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		974,92	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE		2.772,64	-	-	-	-	-	-
1.2.	ESTACAS		12.482,87	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020		7.029,33	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA		1.758,76	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF. 11/2016		2.332,09	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016		1.255,40	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF. 08/2017		67,29	-	-	-	-	-	-
1.3.	VIGA BALDRAME		16.472,62	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF. 08/2017		126,89	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017		574,38	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017		4.617,05	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017		4.150,04	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017		4.307,81	-	-	-	-	-	-
1.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017		2.896,45	-	-	-	-	-	-
1.4.	MURO PALITO		71.515,41	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 8CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO		71.515,41	-	-	-	-	-	-
1.5.	PORTÃO		7.797,52	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		7.797,52	-	-	-	-	-	-
2.	CMEI FREI SÉRGIO		177.829,31	-	-	-	-	-	-
2.1.	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		8.114,41	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017		2.112,81	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE		6.001,60	-	-	-	-	-	-

PROPONENTE / TOMADOR

 Nº CTEF
 EMPRESA EXECUTORA
 SOMAS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Nº OPERAÇÃO

 CNPJ
 07.831.067/0001-17

Nº SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01 CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE

REGIME DE EXECUÇÃO

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PERÍODO DA MEDIÇÃO

04/09/2022 a 31/09/2022

 INÍCIO DE OBRA
 13/12/21

 Nº MEDIÇÃO
 5


Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado				Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
			TOTAL	1.281.455,77	12,96	1,90	14,86	156.079,74	24.328,19	190.402,93
02.00	CERCA MTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM			20.427,11	-	-	-	-	-	-
2.2	ESTACAS			11.502,54	-	-	-	-	-	-
2.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO			2.943,42	-	-	-	-	-	-
2.2.2	MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE			3.816,28	-	-	-	-	-	-
2.2.3	AF_05/2020			2.054,32	-	-	-	-	-	-
2.2.4	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCK 25MPA			110,55	-	-	-	-	-	-
2.2.5	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL TRANSVERSAL DE ESTACAS			27.237,51	-	-	-	-	-	-
2.2.6	DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM, AF_11/2016			209,56	-	-	-	-	-	-
2.2.7	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO			947,72	-	-	-	-	-	-
2.2.8	CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM, AF_11/2016			7.634,62	-	-	-	-	-	-
2.2.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO			6.863,17	-	-	-	-	-	-
2.3	EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_08/2017			7.121,50	-	-	-	-	-	-
2.3.1	VIGA BALDRAME			4.460,94	-	-	-	-	-	-
2.3.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO			122.050,28	-	-	-	-	-	-
2.3.3	EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_08/2017				-	-	-	-	-	-
2.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO				-	-	-	-	-	-
2.3.5	DE FORMA, AF_06/2017				-	-	-	-	-	-
2.3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA				-	-	-	-	-	-
2.3.7	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES,				-	-	-	-	-	-
2.3.8	AF_06/2017				-	-	-	-	-	-
2.3.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES,				-	-	-	-	-	-
2.4	FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E				-	-	-	-	-	-
2.4.1	ACABAMENTO, AF_06/2017				-	-	-	-	-	-
2.4.2	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-				-	-	-	-	-	-
2.4.3	80 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017				-	-	-	-	-	-
2.4.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-				-	-	-	-	-	-
2.4.5	80 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017				-	-	-	-	-	-
2.4.6	MURO PALITO				-	-	-	-	-	-
2.4.7	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE				-	-	-	-	-	-
2.4.8	LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO,				-	-	-	-	-	-
2.4.9	ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM -				-	-	-	-	-	-
2.5	INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE				-	-	-	-	-	-
2.6	PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE				-	-	-	-	-	-
2.7	OBRA PARA EXECUÇÃO				-	-	-	-	-	-
3	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CADORIN			56.209,04	28,71	9,92	37,72	16.135,81	5.844,82	21.244,23
3.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			2.246,55	100,00	-	100,00	2.246,55	-	2.246,55
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA			584,95	100,00	-	100,00	584,95	-	584,95
3.1.2	MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017			1.661,60	100,00	-	100,00	1.661,60	-	1.661,60
3.2	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE			6.349,34	100,00	-	100,00	6.349,34	-	6.349,34
3.2.1	ESTACAS			3.560,31	100,00	-	100,00	3.560,31	-	3.560,31
3.2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO			911,06	100,00	-	100,00	911,06	-	911,06
3.2.3	MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE,			1.192,80	100,00	-	100,00	1.192,80	-	1.192,80
3.2.4	AF_05/2020			651,52	100,00	-	100,00	651,52	-	651,52
3.2.5	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCK 25MPA				-	-	-	-	-	-
3.2.6	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL TRANSVERSAL DE ESTACAS				-	-	-	-	-	-
3.2.7	DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM, AF_11/2016				-	-	-	-	-	-
3.2.8	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO				-	-	-	-	-	-
3.2.9	CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM, AF_11/2016				-	-	-	-	-	-

PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0 CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE	13/12/21
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/08/2022 a 01/09/2022
				Nº MEDIÇÃO
				5

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF- CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM		TOTAL:	1.281.458,77	12,36	1,80	14,56	166.076,74	24.326,18	190.402,92
3.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017		33,65	100,00	-	100,00	33,65	-	33,65
3.3.	VIGA BALDRAME		7.539,72	100,00	-	100,00	7.539,72	-	7.539,72
3.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017		57,68	100,00	-	100,00	57,68	-	57,68
3.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017		262,39	100,00	-	100,00	262,39	-	262,39
3.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		2.113,72	100,00	-	100,00	2.113,72	-	2.113,72
3.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		1.900,13	100,00	-	100,00	1.900,13	-	1.900,13
3.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_05/2017		1.972,17	100,00	-	100,00	1.972,17	-	1.972,17
3.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_05/2017		1.233,63	100,00	-	100,00	1.233,63	-	1.233,63
3.4.	MURO PALITO		33.790,78	-	15,00	15,00	-	5.068,62	5.068,62
3.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LAPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPACAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LAPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO		33.790,78	-	15,00	15,00	-	5.068,62	5.068,62
3.5.	PORTÃO		6.282,65	-	-	-	-	-	-
3.5.1.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPANICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		6.282,65	-	-	-	-	-	-
4.	CMEI ENEDINA COLLA		59.568,29	-	-	-	-	-	-
4.1.	ESTACAS		7.133,05	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020		4.016,76	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA		1.027,86	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016		1.332,70	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016		717,28	-	-	-	-	-	-
4.1.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017		36,45	-	-	-	-	-	-
4.2.	VIGA BALDRAME		9.566,34	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_08/2017		74,02	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017		332,86	-	-	-	-	-	-



Grau de Sigilo
#PUBLICO

INÍCIO DE OBRA
13/12/21

Nº MEDICÃO
5

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		REFORMAÇÃO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE	13/12/21
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	04/08/2022 a 01/09/2022	5

Realizado Acumulado: 14,86%

Realizado Acumulado: 14.86%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
TOTAL:		1.281.459,77	12,95	1,90	14,85	166.876,74	24.326,19	190.492,92	
Objeto do CREF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CRECHES COM MURO PALITO EM									
4.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	2.681,58	-	-	-	-	-	-	
4.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	2.410,62	-	-	-	-	-	-	
4.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	2.502,01	-	-	-	-	-	-	
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	1.585,23	-	-	-	-	-	-	
4.3	MURO PALITO	42.868,90	-	-	-	-	-	-	
4.3.1	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSIVE PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO	42.868,90	-	-	-	-	-	-	
5.	ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO	147.599,80	-	-	-	-	-	-	
5.1.	RETRÁDAS E DEMOLIÇÕES	6.706,12	-	-	-	-	-	-	
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE PLARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	1.746,12	-	-	-	-	-	-	
5.1.2	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE	4.960,00	-	-	-	-	-	-	
5.2.	ESTACAS	17.508,36	-	-	-	-	-	-	
5.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF: 05/2020	9.859,32	-	-	-	-	-	-	
5.2.2	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPa	2.522,93	-	-	-	-	-	-	
5.2.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,9 MM. AF: 11/2016	3.271,17	-	-	-	-	-	-	
5.2.4	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,9 MM. AF: 11/2016	1.760,73	-	-	-	-	-	-	
5.2.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF: 08/2017	94,21	-	-	-	-	-	-	
5.3.	VIGA BALDRAME	22.517,32	-	-	-	-	-	-	
5.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF: 08/2017	173,03	-	-	-	-	-	-	
5.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF: 05/2017	783,24	-	-	-	-	-	-	
5.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	6.309,60	-	-	-	-	-	-	
5.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	5.672,04	-	-	-	-	-	-	
5.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	5.887,08	-	-	-	-	-	-	



Grau de Sigilo
#PUBLICO

INÍCIO DE OBRA
13/12/21

BROBONTE / TOMADOR

Nº OPERAÇÃO

| N° SICONV

LABELADO DO EMPREENDIMENTO

0 APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE

N° MEDIC

10. **COMPETENZA ESECUTIVA**

CNPJ

REGIME DE EXECUÇÃO

REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PERÍODO DA MEDICAÇÃO

PERÍODO DA MEDICAÇÃO
04/08/2022 a 01/09/2022

Nº MEDICAO

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo o Período
	TOTAL:				1.207.425,77	12,96	1,98	14,88	166.076,74	24.328,18	190.404,92
	OBRAS DE CERCAMENTO DE ESCOLAS E CRECHES COM MURO PALITO EM										
5.5.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017				3.692,33	-	-	-	-	-	-
5.4.	MURO PALITO				100.868,00	-	-	-	-	-	-
5.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO				100.868,00	-	-	-	-	-	-
5.	ESCOLA MUNICIPAL LIONS GLOBE				108.260,75	-	-	-	-	-	-
5.1.	RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES				4.090,73	-	-	-	-	-	-
5.1.1.	REMOCÃO DE PLACARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017				1.065,13	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	REMOCÃO DE TELA DE CERCA EXISTENTE				3.025,60	-	-	-	-	-	-
5.2.	ESTACAS				11.713,40	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 06/2022				6.572,88	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FDP 25MPA				1.681,96	-	-	-	-	-	-
5.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF. 11/2016				2.215,20	-	-	-	-	-	-
5.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016				1.180,88	-	-	-	-	-	-
5.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE +10 CM". AF. 08/2017				62,48	-	-	-	-	-	-
5.3.	VIGA BALDRAME				13.734,75	-	-	-	-	-	-
5.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE +10 CM". AF. 08/2017				105,74	-	-	-	-	-	-
5.3.2.	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017				477,78	-	-	-	-	-	-
5.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017				3.848,86	-	-	-	-	-	-
5.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCk 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017				3.459,94	-	-	-	-	-	-
5.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017				3.591,12	-	-	-	-	-	-
5.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017				2.251,31	-	-	-	-	-	-
5.4.	MURO PALITO				61.529,48	-	-	-	-	-	-
5.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO				61.529,48	-	-	-	-	-	-

PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0 CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE	13/12/21
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/08/2022 a 01/09/2022
				Nº MEDIÇÃO
				5

Realizado Acumulado: 14,85%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM											
6.5.	PORTÃO		TOTAL	1.281.455,77	12,36	1,34	14,86	156.976,74	24.326,18	190.402,92	
				17.192,40	-	-	-	-	-	-	
6.5.1.	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			4.627,10	-	-	-	-	-	-	
6.5.2.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPANICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			12.565,30	-	-	-	-	-	-	
7.	ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE										
7.1.	RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES			60.144,08	100,00	-	100,00	60.144,08	-	60.144,08	
7.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017			2.280,08	100,00	-	100,00	2.280,08	-	2.280,08	
7.1.2.	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE			593,68	100,00	-	100,00	593,68	-	593,68	
7.2.	ESTACAS			1.686,40	100,00	-	100,00	1.686,40	-	1.686,40	
				9.626,26	100,00	-	100,00	9.626,26	-	9.626,26	
7.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020			6.207,72	100,00	-	100,00	6.207,72	-	6.207,72	
7.2.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA			1.588,51	100,00	-	100,00	1.588,51	-	1.588,51	
7.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF. 11/2016			1.150,88	100,00	-	100,00	1.150,88	-	1.150,88	
7.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016			619,55	100,00	-	100,00	619,55	-	619,55	
7.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF. 08/2017			59,60	100,00	-	100,00	59,60	-	59,60	
7.3.	VIGA BALDRAME			7.659,97	100,00	-	100,00	7.659,97	-	7.659,97	
7.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF. 08/2017			62,48	100,00	-	100,00	62,48	-	62,48	
7.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017			266,30	100,00	-	100,00	266,30	-	266,30	
7.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017			2.145,26	100,00	-	100,00	2.145,26	-	2.145,26	
7.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 08/2017			1.928,49	100,00	-	100,00	1.928,49	-	1.928,49	
7.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017			2.001,79	100,00	-	100,00	2.001,79	-	2.001,79	
7.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017			1.255,65	100,00	-	100,00	1.255,65	-	1.255,65	
7.4.	MURO PALITO			34.295,12	100,00	-	100,00	34.295,12	-	34.295,12	
7.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LAPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSIVE PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LAPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO			34.295,12	100,00	-	100,00	34.295,12	-	34.295,12	
7.5.	PORTÃO			6.282,65	100,00	-	100,00	6.282,65	-	6.282,65	
PMV3.0.4											

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
0		0		0		CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE		#PUBLICO	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
0		SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA		07.831.067/0001-17		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		13/12/21	
						PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
						04/08/2022 a 01/09/2022		5	

Orçamento Contratado					Realizado Acumulado: 14,86%							
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM					TOTAL:	1.281.245,77	12,98	1,99	14,86	169.076,74	24.326,18	190.402,92
7.5.1.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				6.282,65	100,00	-	100,00	6.282,65	-	6.282,65	
8.	ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL CARDOSO											
8.1.	RETRADAS E DEMOLIÇÕES				227.776,16	-	-	-	-	-	-	
8.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017				9.384,77	-	-	-	-	-	-	
8.1.2.	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE				3.928,77	-	-	-	-	-	-	
8.2.	ESTACAS				5.456,00	-	-	-	-	-	-	
8.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF. 05/2020				19.939,97	-	-	-	-	-	-	
8.2.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA				11.228,67	-	-	-	-	-	-	
8.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM, AF. 11/2016				2.873,34	-	-	-	-	-	-	
8.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF. 11/2016				3.725,80	-	-	-	-	-	-	
8.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM", AF. 08/2017				2.005,46	-	-	-	-	-	-	
8.3.	VIGA BALDRAME				106,70	-	-	-	-	-	-	
8.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM", AF. 08/2017				24.817,61	-	-	-	-	-	-	
8.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, AF. 06/2017				190,34	-	-	-	-	-	-	
8.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017				861,56	-	-	-	-	-	-	
8.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 06/2017				6.940,56	-	-	-	-	-	-	
8.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017				6.239,24	-	-	-	-	-	-	
8.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017				6.520,50	-	-	-	-	-	-	
8.4.	NIVELAMENTO VIGA BALDRAME				4.065,41	-	-	-	-	-	-	
8.4.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017				46.257,79	-	-	-	-	-	-	
8.4.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 06/2017				3.154,80	-	-	-	-	-	-	
8.4.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017				2.836,02	-	-	-	-	-	-	
8.4.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017				2.943,54	-	-	-	-	-	-	
8.4.5.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARETE 15X15, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM				1.844,67	-	-	-	-	-	-	
PMV3.0.4					6.950,40	-	-	-	-	-	-	

PROPOSITOR / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo #PUBLICO	
0		0		0		0		13/12/21	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
0		SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA		07.831.067/0001-17		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		04/08/2022 a 01/09/2022	
								Nº MEDIÇÃO	
								5	

Orçamento Contratado					Realizado Acumulado: 14,86%						
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM											
8.4.6.	ARMAÇÃO DE PILARETE 15X15 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.			TOTAL	1.291.455,77	12,96	1,90	14,86	168.076,74	24.328,18	190.402,92
8.4.7.	ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA PILARETE 15X15 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.				3.537,80	-	-	-	-	-	-
8.4.8.	CONCRETAGEM DE PILARETES 15X15, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.				1.022,07	-	-	-	-	-	-
8.4.9.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014				1.376,69	-	-	-	-	-	-
8.4.10.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014				887,00	-	-	-	-	-	-
8.4.11.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014				5.928,00	-	-	-	-	-	-
8.4.12.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014				265,00	-	-	-	-	-	-
8.4.13.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014				1.628,00	-	-	-	-	-	-
8.4.14.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 06/2014				2.425,00	-	-	-	-	-	-
8.5.	MURO PALITO				110.954,80	-	-	-	-	-	-
8.5.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO				110.954,80	-	-	-	-	-	-
8.6.	PORTÃO				16.421,22	-	-	-	-	-	-
8.6.1.	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, PINTURA E ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.855,92	-	-	-	-	-	-
8.6.2.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				12.565,30	-	-	-	-	-	-
9.	CMEI PEQUENO PRINCÍPE										
9.1.	RETRÁDAS E DEMOLIÇÕES				100.294,12	64,96	19,20	84,16	65.148,17	19.297,56	84.445,73
9.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017				3.554,24	100,00	-	100,00	3.554,24	-	3.554,24
9.1.2.	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE				925,44	100,00	-	100,00	925,44	-	925,44
9.2.	ESTACAS				2.628,80	100,00	-	100,00	2.628,80	-	2.628,80
9.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF. 05/2020				9.564,84	96,40	3,07	99,47	9.220,44	283,75	9.514,19
9.2.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA				5.386,11	100,00	-	100,00	5.386,11	-	5.386,11
					1.378,27	100,00	-	100,00	1.378,27	-	1.378,27

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA
0		0		0 CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE		13/12/21
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.047/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		04/09/2022 a 01/09/2022	5

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM					TOTAL:	1.281.466,77	12,96	1,90	14,86	166.016,74	24.326,18	190.402,92
9.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF. 11/2016				1.787,50	100,00	-	100,00	1.787,50	-	1.787,50	
9.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016				982,01	66,00	29,00	95,00	634,93	278,98	913,91	
9.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 08/2017				50,95	66,00	29,00	95,00	33,63	14,77	48,40	
9.3.	VIGA BALDRAME				11.932,44	66,00	29,00	95,00	7.875,41	3.460,40	11.335,81	
9.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 08/2017				91,32	66,00	29,00	95,00	60,27	26,48	86,75	
9.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017				415,12	66,00	29,00	95,00	273,98	120,38	394,36	
9.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017				3.344,09	66,00	29,00	95,00	2.207,10	969,79	3.176,89	
9.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017				3.006,18	66,00	29,00	95,00	1.984,08	871,79	2.855,87	
9.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017				3.120,53	66,00	29,00	95,00	2.059,55	904,95	2.964,50	
9.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017				1.955,20	66,00	29,00	95,00	1.290,43	567,01	1.857,44	
9.4.	MURO PALITO				53.460,04	66,00	29,00	95,00	35.283,63	15.503,41	50.787,04	
9.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO				53.460,04	66,00	29,00	95,00	35.283,63	15.503,41	50.787,04	
9.5.	PORTÃO				12.565,30	-	-	-	-	-	-	
9.5.1.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPANICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				12.565,30	-	-	-	-	-	-	
9.6.	ESTACAS - MURO DE CONTENÇÃO				812,86	99,41	-	99,41	808,05	-	808,05	
9.6.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020				456,45	100,00	-	100,00	456,45	-	456,45	
9.6.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPa				116,80	100,00	-	100,00	116,80	-	116,80	
9.6.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF. 11/2016				153,36	100,00	-	100,00	153,36	-	153,36	
9.6.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016				81,44	100,00	-	100,00	81,44	-	81,44	
9.6.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 08/2017				4,81	-	-	-	-	-	-	
9.7.	VB - MURO DE CONTENÇÃO				1.051,88	100,00	-	100,00	1.051,88	-	1.051,88	

S. Almeida

PROponente / Tomador		Nº Operação	Nº Siconv	Apelido do Empreendimento	Início de Obra
0		0	0	0	13/12/21
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Regime de Execução	Período da Medição	Nº Medição
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/09/2022 a 01/09/2022	5

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM					TOTAL:	1.281.455,77	12,95	1,90	14,86	106.076,74	24.128,18	130.407,92
9.2.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF. 11/2016				1.787,50	100,00	-	100,00	1.787,50	-	1.787,50	
9.2.4	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016				962,01	66,00	29,00	95,00	634,93	278,98	913,91	
9.2.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF. 08/2017				50,95	66,00	29,00	95,00	33,63	14,77	48,40	
9.3.	VIGA BALDRAME				11.932,44	66,00	29,00	95,00	7.875,41	3.460,40	11.335,81	
9.3.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF. 08/2017				91,32	66,00	29,00	95,00	60,27	26,48	86,75	
9.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017				415,12	66,00	29,00	95,00	273,98	120,38	394,36	
9.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017				3.344,09	66,00	29,00	95,00	2.207,10	969,79	3.176,89	
9.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017				3.006,18	66,00	29,00	95,00	1.984,08	871,79	2.855,87	
9.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017				3.120,53	66,00	29,00	95,00	2.059,55	904,95	2.964,50	
9.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017				1.955,20	66,00	29,00	95,00	1.290,43	567,01	1.857,44	
9.4.	MURO PALITO				53.460,04	66,00	29,00	95,00	35.283,63	15.503,41	50.787,04	
9.4.1	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO				53.460,04	66,00	29,00	95,00	35.283,63	15.503,41	50.787,04	
9.5.	PORTÃO				12.565,30	-	-	-	-	-	-	
9.5.1	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPANICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				12.565,30	-	-	-	-	-	-	
9.6.	ESTACAS - MURO DE CONTENÇÃO				812,86	99,41	-	98,41	808,05	-	808,05	
9.6.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF. 05/2020				456,45	100,00	-	100,00	456,45	-	456,45	
9.6.2	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPa				116,80	100,00	-	100,00	116,80	-	116,80	
9.6.3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF. 11/2016				153,36	100,00	-	100,00	153,36	-	153,36	
9.6.4	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016				81,44	100,00	-	100,00	81,44	-	81,44	
9.6.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF. 08/2017				4,81	-	-	-	-	-	-	
9.7.	VB - MURO DE CONTENÇÃO				1.051,88	100,00	-	100,00	1.051,88	-	1.051,88	

S. Admundo

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA	
0		0		01/09/2022 a 01/09/2022	13/12/21	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO	
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/09/2022 a 01/09/2022	5	

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM				TOTAL:	1.281.455,77	12,86	1,90	14,86	105.076,74	24.326,18	139.402,92
9.7.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE '10 CM'. AF_08/2017			9,61	100,00	-	100,00	9,61	-	9,61	
9.7.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017			70,49	100,00	-	100,00	70,49	-	70,49	
9.7.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			283,93	100,00	-	100,00	283,93	-	283,93	
9.7.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			255,24	100,00	-	100,00	255,24	-	255,24	
9.7.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			265,85	100,00	-	100,00	265,85	-	265,85	
9.7.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			166,76	100,00	-	100,00	166,76	-	166,76	
9.8.	PILARES - MURO DE CONTENÇÃO			972,05	100,00	-	100,00	972,05	-	972,05	
9.8.1.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020			556,03	100,00	-	100,00	556,03	-	556,03	
9.8.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			176,89	100,00	-	100,00	176,89	-	176,89	
9.8.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			86,16	100,00	-	100,00	86,16	-	86,16	
9.8.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			152,97	100,00	-	100,00	152,97	-	152,97	
9.9.	VIGA CINTA - MURO DE CONTENÇÃO			1.061,08	100,00	-	100,00	1.061,08	-	1.061,08	
9.9.1.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020			384,75	100,00	-	100,00	384,75	-	384,75	
9.9.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			265,71	100,00	-	100,00	265,71	-	265,71	
9.9.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			168,01	100,00	-	100,00	168,01	-	168,01	
9.9.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015			242,61	100,00	-	100,00	242,61	-	242,61	
9.10.	ALVENARIA, REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO - MURO DE CONTENÇÃO			4.925,19	100,00	-	100,00	4.925,19	-	4.925,19	
9.10.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014			2.016,75	100,00	-	100,00	2.016,75	-	2.016,75	

PROPOSTANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Grau de Sigilo
0	0	0	0	#PUBLICO
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	INÍCIO DE OBRA
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	13/12/21
			PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
			04/08/2022 a 01/09/2022	9

Orçamento Contratado

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado			Evolução Física (%)				Realizado Acumulado: 14,86%		
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Evolução Financeira (R\$)		
							Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM									
TOTAL:			1.281.455,77	12,95	1,90	14,85	166.076,74	24.326,18	190.402,92
9.10.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		95,80	100,00	-	100,00	95,80	-	95,80
9.10.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		640,22	100,00	-	100,00	640,22	-	640,22
9.10.4.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		28,62	100,00	-	100,00	28,62	-	28,62
9.10.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014		175,82	100,00	-	100,00	175,82	-	175,82
9.10.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018		261,90	100,00	-	100,00	261,90	-	261,90
9.11.	ATERRO - MURO DE CONTENÇÃO		1.706,08	100,00	-	100,00	1.706,08	-	1.706,08
9.11.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016		394,20	100,00	-	100,00	394,20	-	394,20
10.	CMEI ESTACÃO CRIANÇA		394,20	100,00	-	100,00	394,20	-	394,20
10.1.	RETRADAS E DEMOLIÇÕES		24.650,68	100,00	-	100,00	24.650,68	-	24.650,68
10.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		670,61	100,00	-	100,00	670,61	-	670,61
10.1.2.	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE		174,61	100,00	-	100,00	174,61	-	174,61
10.2.	ESTACAS		496,00	100,00	-	100,00	496,00	-	496,00
10.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020		2.272,66	100,00	-	100,00	2.272,66	-	2.272,66
10.2.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA		1.278,06	100,00	-	100,00	1.278,06	-	1.278,06
10.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016		327,05	100,00	-	100,00	327,05	-	327,05
10.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016		426,00	100,00	-	100,00	426,00	-	426,00
10.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_08/2017		229,05	100,00	-	100,00	229,05	-	229,05
10.3.	VIGA BALDRAME		12,50	100,00	-	100,00	12,50	-	12,50
10.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_08/2017		2.253,43	100,00	-	100,00	2.253,43	-	2.253,43
10.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017		17,30	100,00	-	100,00	17,30	-	17,30
10.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		78,32	100,00	-	100,00	78,32	-	78,32
10.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		630,96	100,00	-	100,00	630,96	-	630,96
			567,20	100,00	-	100,00	567,20	-	567,20

PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0 CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE	13/12/21
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/08/2022 a 01/09/2022
				Nº MEDIÇÃO
				5

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM					TOTAL:	1.281.455,77	12,96	1,98	14,86	166.076,74	24.326,18	190.402,92
10.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				588,71	100,00	-	100,00	588,71	-	588,71	
10.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				370,94	100,00	-	100,00	370,94	-	370,94	
10.4.	MURO PALITO				10.086,80	100,00	-	100,00	10.086,80	-	10.086,80	
10.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTO DE 2,20M. ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO				10.086,80	100,00	-	100,00	10.086,80	-	10.086,80	
10.5.	PORTÃO				9.367,38	100,00	-	100,00	9.367,38	-	9.367,38	
10.5.1.	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.084,73	100,00	-	100,00	3.084,73	-	3.084,73	
10.5.2.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPANICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				6.282,65	100,00	-	100,00	6.282,65	-	6.282,65	
11.	ESCOLA MUNICIPAL VILA IZABEL											
11.1.	RETRADAS E DEMOLIÇÕES				6.739,65	-	-	-	-	-	-	
11.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				1.754,85	-	-	-	-	-	-	
11.1.2.	REMOÇÃO DE TELA DE CERCAMENTO EXISTENTE				4.984,80	-	-	-	-	-	-	
11.2.	ESTACAS				17.671,96	-	-	-	-	-	-	
11.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020				9.950,61	-	-	-	-	-	-	
11.2.2.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA				2.546,29	-	-	-	-	-	-	
11.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 11/2016				3.301,50	-	-	-	-	-	-	
11.2.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 11/2016				1.777,43	-	-	-	-	-	-	
11.2.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF 08/2017				96,13	-	-	-	-	-	-	
11.3.	VIGA BALDRAME				22.624,85	-	-	-	-	-	-	
11.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF 08/2017				173,03	-	-	-	-	-	-	
11.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017				787,16	-	-	-	-	-	-	
11.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017				6.341,15	-	-	-	-	-	-	
11.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017				5.700,40	-	-	-	-	-	-	
11.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017				5.916,89	-	-	-	-	-	-	

PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE	13/12/21
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA	07.831.067/0001-17	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/08/2022 a 01/09/2022
				Nº MEDIÇÃO
				6

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM										
	TOTAL:			1.281.459,77	12,96	1,50	14,86	166.076,74	24.326,18	190.402,92
11.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			3.708,22	-	-	-	-	-	-
11.4.	MURO PALITO			101.372,34	-	-	-	-	-	-
11.4.1.	EXECUÇÃO DE MURO COM PALITOS DE CONCRETO EM FORMATO DE LÁPIS, 15CM DE DIÂMETRO NA BASE E 6CM DE DIÂMETRO NO TOPO, ALTURA DE 2,20M, ESPAÇAMENTO ENTRE OS PALITOS DE 8CM - INCLUSO PALITO DE CONCRETO COM FORMATO DE LÁPIS, PINTURA DE PALITO DE CONCRETO, ESCORAMENTO PARA OS PALITOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO			101.372,34	-	-	-	-	-	-
11.5.	PORTÃO			7.853,31	-	-	-	-	-	-
11.5.1.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" NA VERTICAL, COM BARRA ANTIPANICO DUPLA, REQUADRO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			7.853,31	-	-	-	-	-	-
11.6.	NIVELAMENTO VIGA BALDRAME			18.501,57	-	-	-	-	-	-
11.6.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			1.261,92	-	-	-	-	-	-
11.6.2.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			1.134,41	-	-	-	-	-	-
11.6.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			1.177,42	-	-	-	-	-	-
11.6.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			738,68	-	-	-	-	-	-
11.6.5.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARETE 15X15, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM			2.780,16	-	-	-	-	-	-
11.6.6.	ARMAÇÃO DE PILARETE 15X15 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.			1.412,33	-	-	-	-	-	-
11.6.7.	ARMAÇÃO DE ESTRIBOS PARA PILARETE 15X15 DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.			409,26	-	-	-	-	-	-
11.6.8.	CONCRETAGEM DE PILARETES 15X15, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			550,67	-	-	-	-	-	-
11.6.9.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			4.583,52	-	-	-	-	-	-
11.6.10.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			354,80	-	-	-	-	-	-
11.6.11.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			2.371,20	-	-	-	-	-	-
11.6.12.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			106,00	-	-	-	-	-	-
11.6.13.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			651,20	-	-	-	-	-	-

Formada

PROPONENTE / TOMADOR

0

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01 CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM FORMATO DE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

0

EMPRESA EXECUTORA

SOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ

07.831.067/0001-17

REGIME DE EXECUÇÃO

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PERÍODO DA MEDIÇÃO

04/08/2022 a 01/09/2022

 INÍCIO DE OBRA
 13/12/21

Nº MEDIÇÃO

5

Realizado Acumulado: 14,86%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF: CERCAMENTO DE ESCOLAS E CMEIS COM MURO PALITO EM					TOTAL:	1.281.459,77	12,96	1,88	14,86	166.076,74	24.326,18	190.402,92
11.6.14.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014			970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.	MURO DE ARRIMO C=9,00M H=2,50M			32.343,67	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.1.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			1.309,59	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020			2.255,85	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017			15,38	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.4.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 11/2016			1.551,95	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF 10/2016			295,57	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.6.	CONCRETAGEM DE ESTACAS COM FCP 25MPA			420,49	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.7.	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO UNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF 06/2015			1.050,48	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.8.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019			646,17	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.9.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019			4.091,62	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.10.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019			4.451,12	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.11.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 16,0 MM DE DIÂMETRO			4.190,06	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.12.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 20,0 MM DE DIÂMETRO			3.348,93	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.13.	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2019			8.516,62	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7.14.	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA			199,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Observações:												

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PÁTO BRANDO - PR

Local:

quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Data:

 Adenanda Sato
 Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: ADENANDA SALLA DOS SANTOS
 Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/CAU: 112.802-0/0
 ART/RRT: 0



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO – MURO PALITO

CONTRATO Nº153/2021/GP



Relatório de Medição nº 05


Empresa Contratada: Somar Engenharia e Construtora Eireli

Responsável: Gabriela Andreola Panisson


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 24.326,18.

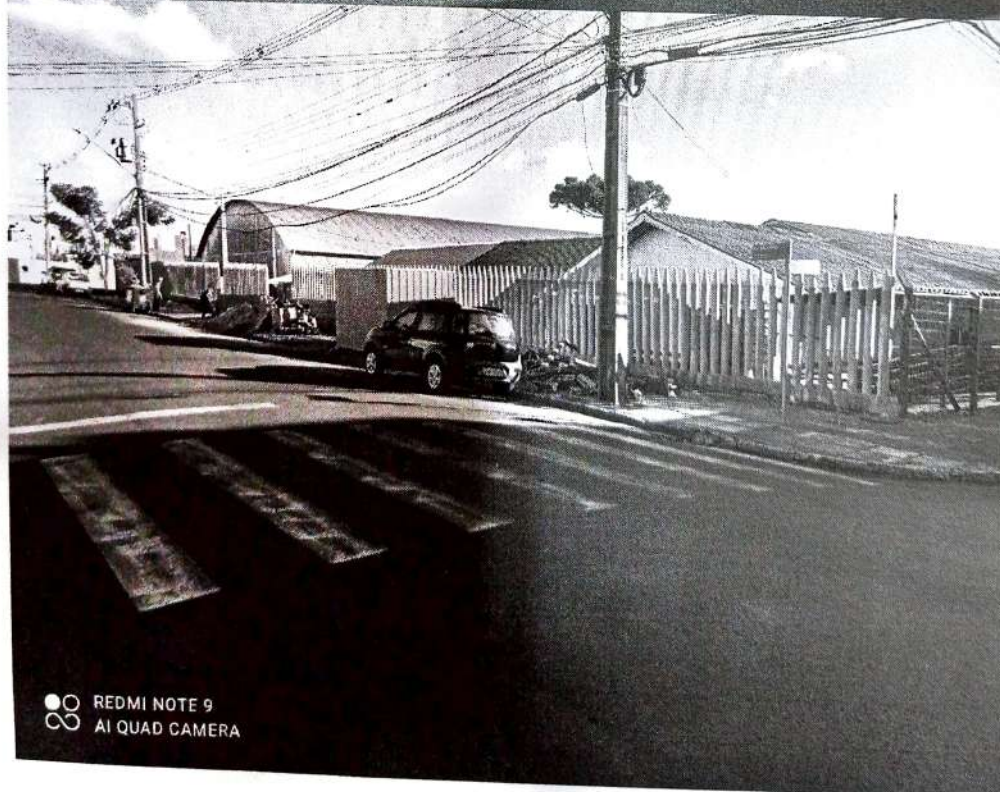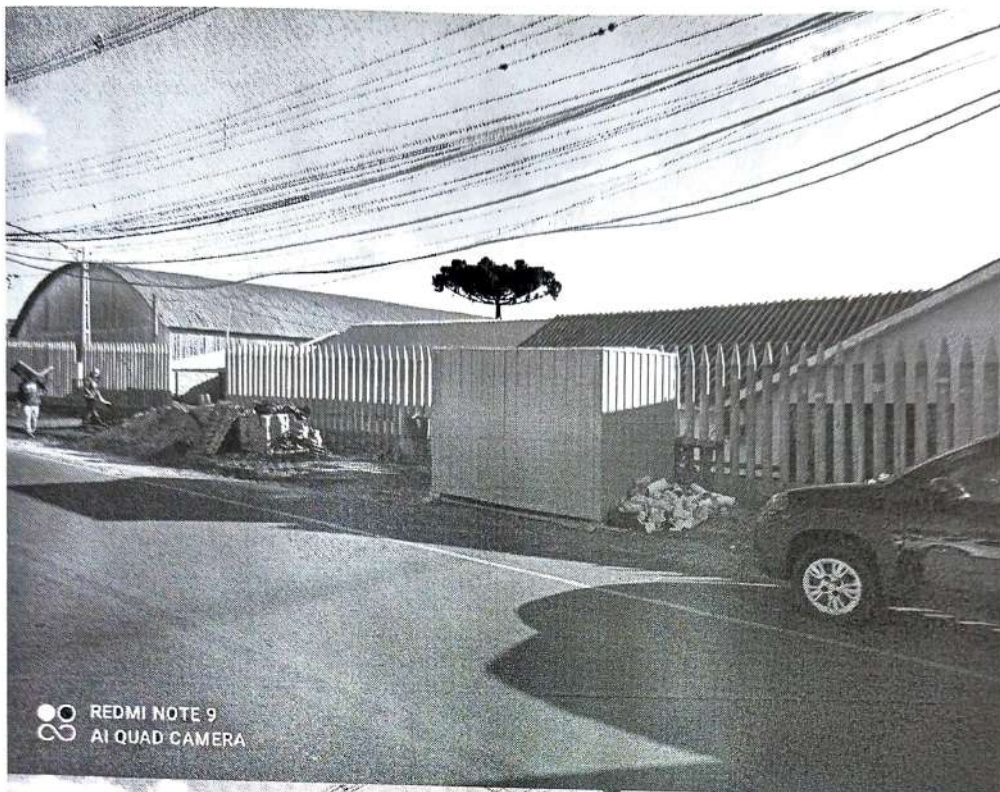

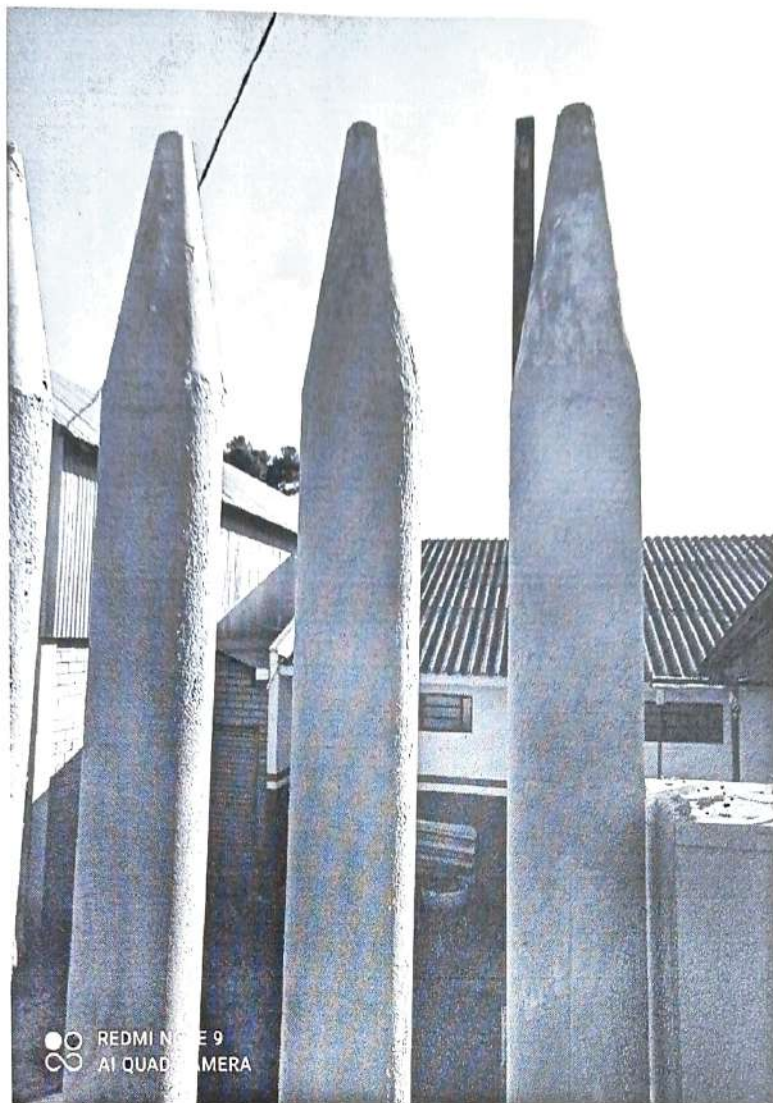




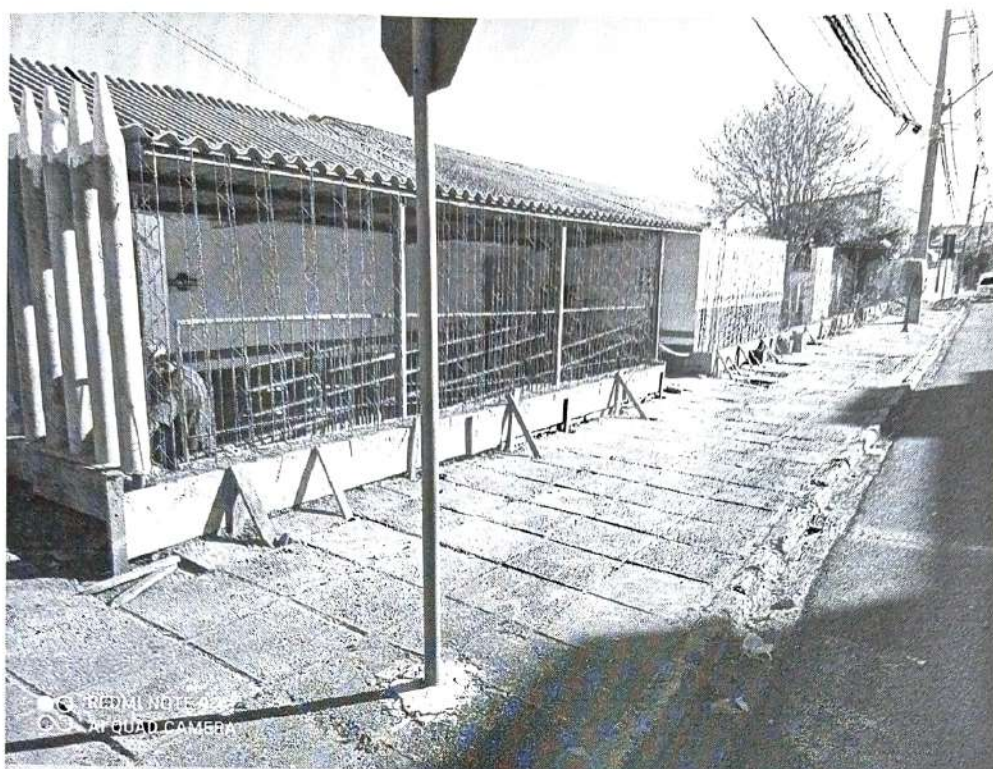







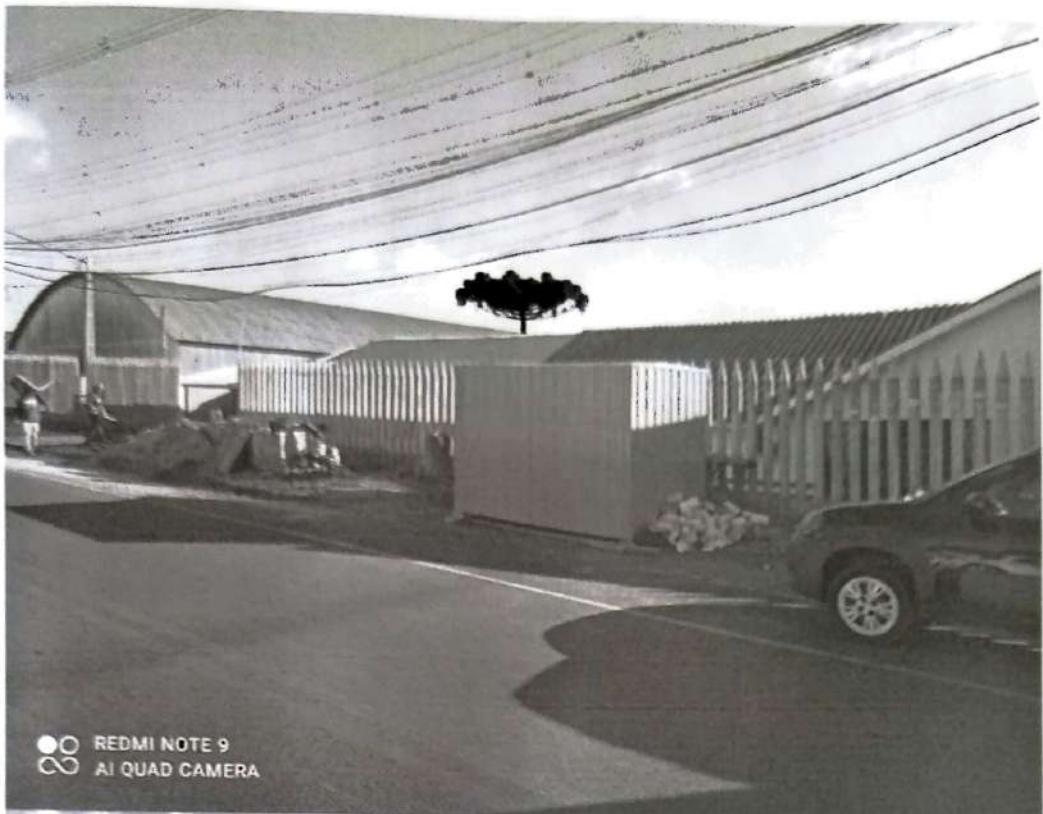



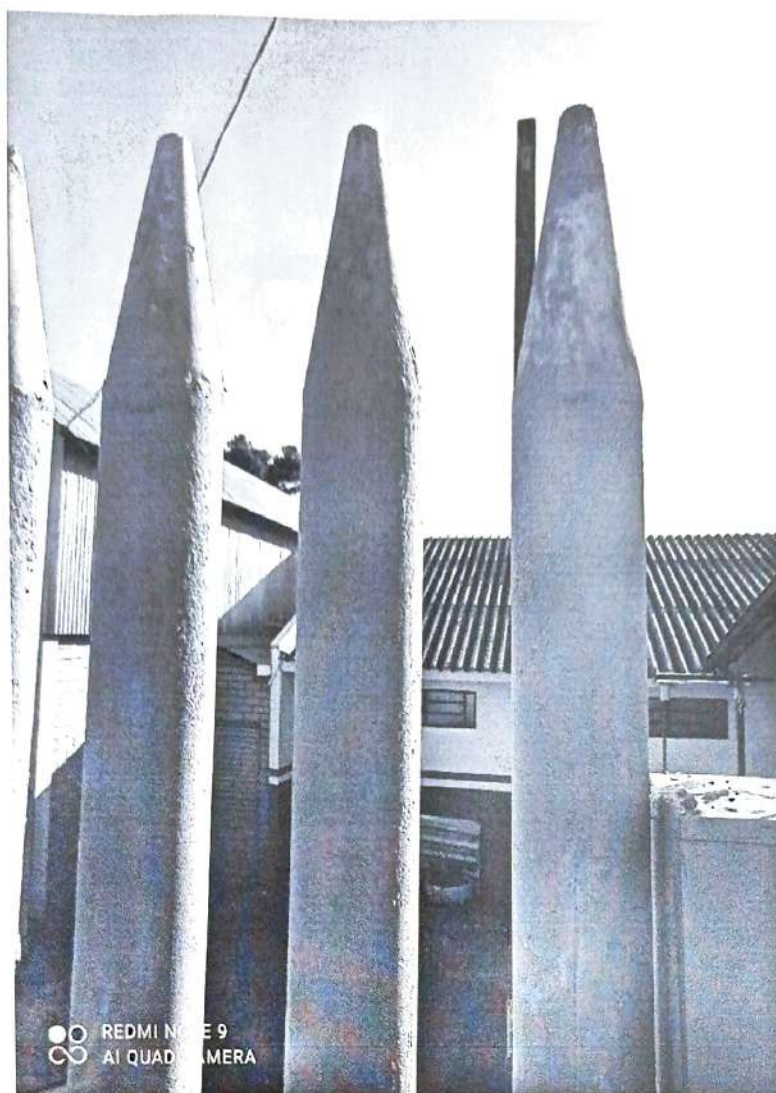



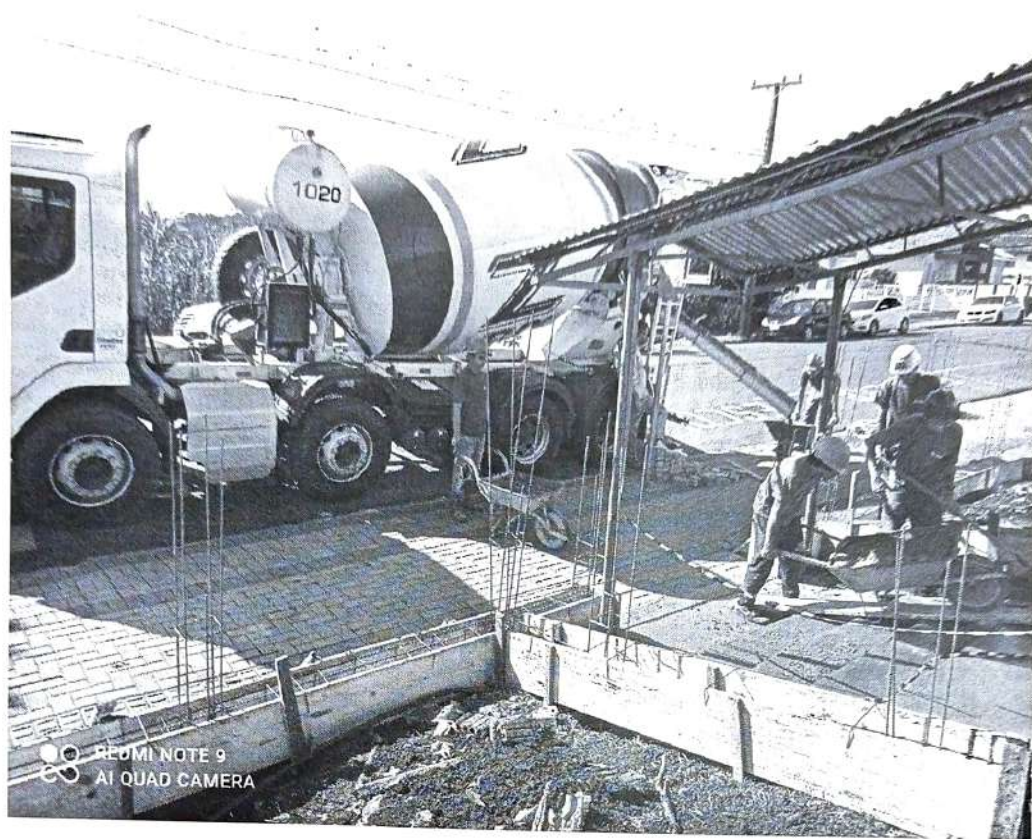

Pato Branco, 01 de setembro de 2022.

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

RUA VENEZUELA, 110 - CASA
CEP: 85502-030 - Bairro: JARDIM DAS AMERICAS
Município: Pato Branco - PR
E-mail: casapronta.gg.construtora@gmail.com
Fone: (46) 3225-2324

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
07.831.067/0001-17 **** 288/64



Número da NFS-e

202200000000138

Data do Serviço

01/09/2022

Código Verificador

11aa95577

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR

DI de Emissão

Exigibilidade
ISS

Tributado no Município

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

01/09/2022

Exigível

Pato Branco/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Pato Branco/PR

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Endereço

RUA CARAMURU, 0

Cidade

Pato Branco

UF

PR

Fone

(46) 3220-1544

CEP

85500-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

76.995.448/0001-54

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

nfse@patobranco.pr.gov.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE: CERCAMENTO DE 6 (SEIS) ESCOLAS MUNICIPAIS E 5 (CINCO) CMEIS DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO COM MURO PALITO DE CONCRETO ARMADO EM FORMA DE LÁPIS, COM ÁREA TOTAL DE 1.472,80 METROS LINEARES, PATO BRANCO, PR, EM CONSONÂNCIA COM OS ANEXOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021, PROCESSO Nº 174/2021, LOTE 2 (DOIS), COM O CONTRATO Nº 153/2021/GP E CNO (CADASTRO NACIONAL DE OBRAS DA RECEITA FEDERAL) COM A INSCRIÇÃO DA OBRA SOB O Nº 90.009.29663/74

24.326,18

2,00

145,96

Sim

TRIBUTAÇÃO EMPREGADA SOBRE OS CÁLCULOS QUE SEGUEM:

1*) MATERIAIS= 70%

2*) MÃO DE OBRA= 30%

IMPOSTOS RETIDOS:

ISS = 2,00% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA

INSS = 11,00% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA

João Francisco de Oliveira Santos

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	7.297,85	145,96	0,00	17.028,33		
Valor Total da NFS-e		24.326,18		Valor Líquido da NFS-e		23.377,46	

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: 90.009.29663/74. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: 1720220089411.
Lei 12741/2012: Mun: R\$288,99; Est: R\$0,00; Fed: R\$981,56; Total Aprox: R\$1270,55. Fonte: IBPT.
Retenção Previdência Social: R\$802,76



Consulta realizada em 01/09/2022 às 16:49:14.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal



20220000000013811aa9557707831067000117

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

RUA VENEZUELA, 110 - CASA
CEP: 85502-030 - Bairro: JARDIM DAS AMERICAS
Município: Pato Branco - PR
E-mail: casapronta.gg.construtora@gmail.com
Fone: (46) 3225-2324

CNPJ / CPF

07.831.067/0001-17

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

288764



Número da NFS-e

202200000000138

Data do Serviço

01/09/2022

Código Verificador

11aa95577

Luiz Carlos de Oliveira Mendes

Recebimos de

SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202200000000138

Número da NFS-e

Competência

01/09/2022

NFS-e

11aa95577

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/09/2022 às 16:49:14

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal
