



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Prefeitura Municipal de Pato Branco		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
75/2023 GP	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
PERÍODO DA MEDIÇÃO					
30/11/2023 a 17/01/2024					

Realizado Acumulado: 81,10%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: CMEI MENINO DEUS					TOTAL:	599.264,14	36,18	44,91	81,10	216.841,55	269.156,76	485.998,31
1.	TELHADOS				599.264,14	36,18	44,91	81,10	216.841,55	269.156,76	485.998,31	
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento				503.589,38	42,54	53,45	95,99	214.230,62	269.156,76	483.387,38	
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				144.957,24	60,00	40,00	100,00	86.974,34	57.982,90	144.957,24	
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				4.926,28	100,00	-	100,00	4.926,28	-	4.926,28	
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				8.620,99	100,00	-	100,00	8.620,99	-	8.620,99	
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				277.103,25	35,00	65,00	100,00	96.986,14	180.117,11	277.103,25	
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				11.040,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				9.162,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P				36.947,10	35,00	65,00	100,00	12.931,49	24.015,61	36.947,10	
1.1.8.	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO				5.891,52	35,00	65,00	100,00	2.062,03	3.829,49	5.891,52	
1.1.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO				4.941,00	35,00	65,00	100,00	1.729,35	3.211,65	4.941,00	
1.2.	Forro de PVC				91.997,38	2,84	-	2,84	2.610,93	-	2.610,93	
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				2.610,93	100,00	-	100,00	2.610,93	-	2.610,93	
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P				86.246,85	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M				3.139,60	-	-	-	-	-	-	
1.3.	OUTROS				3.677,38	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				475,30	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA				3.202,08	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.



PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Prefeitura Municipal de Pato Branco		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
75/2023 GP	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			30/11/2023 a 17/01/2024		

Realizado Acumulado: 81,10%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CMEI MENINO DEUS					TOTAL: 599.264,14	36,18	44,91	81,10	216.841,55	269.156,76	485.998,31

PATO BRANCO
Local

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: PR-185508/D
ART/RRT: 1720233705221

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma digital por JAKELINE LOUREIRO:09802974943
Dados: 2024.01.18 15:10:20 -03'00'




Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados no CMEI MENINO DEUS, Rua Pedro Ramires De Mello, nº 1067, Bairro Menino Deus, CEP: 85502-050 no município de Pato Branco/PR.

Contrato nº 75/2023/GP

Relatório de Medição nº 02


Empresa Contratada: *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*
Responsável: *Lincoln Fernando Machado de Souza*

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

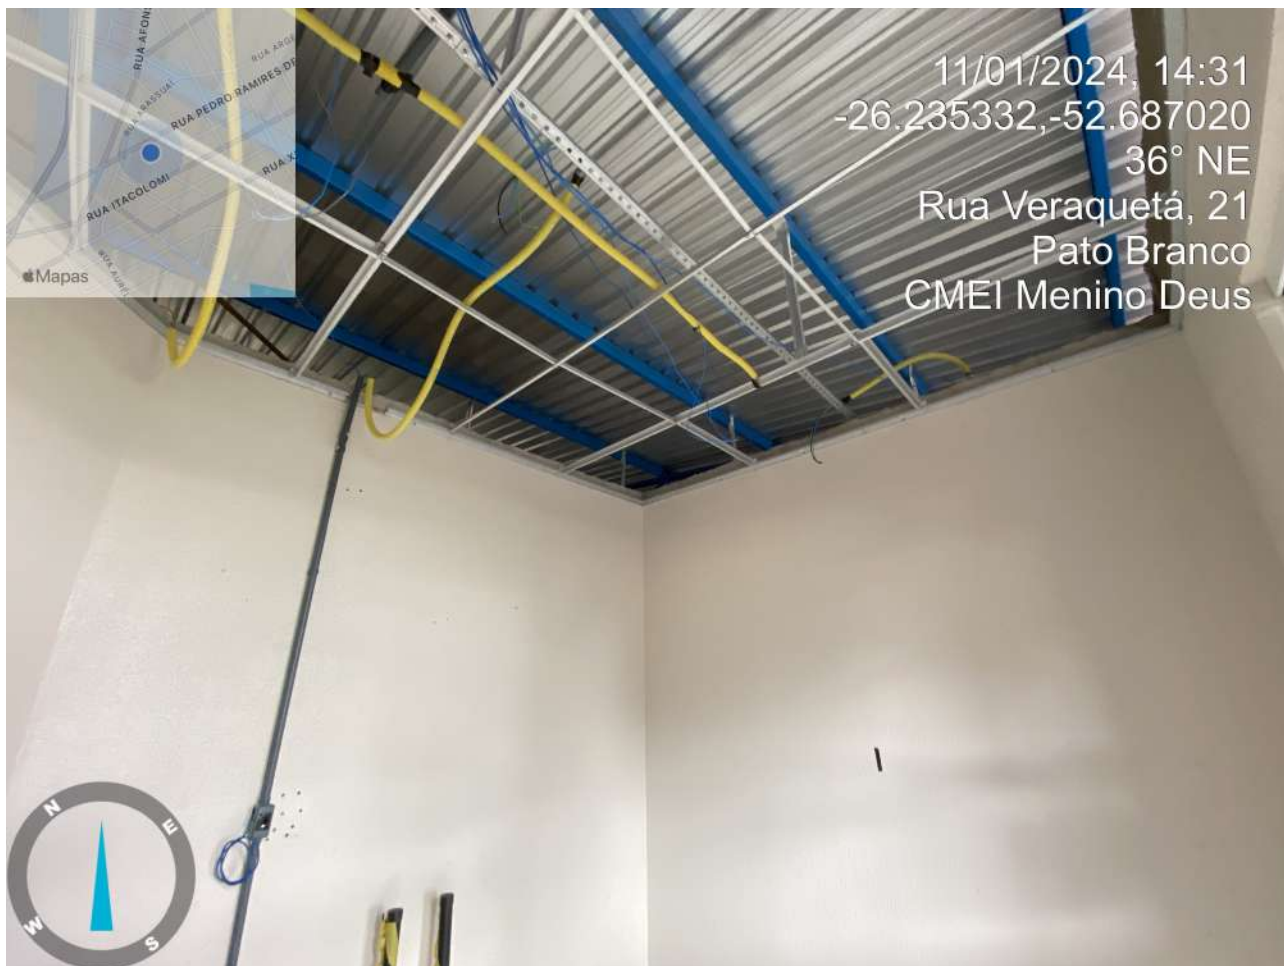




11/01/2024, 14:39
-26.235856,-52.686764
171° S
Rua Veraquetá, 91
Pato Branco
CMEI Menino Deus

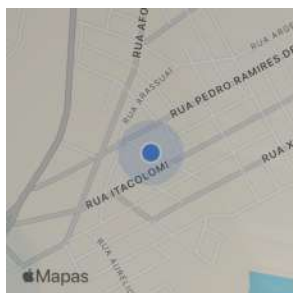

11/01/2024, 14:43
-26.235755,-52.686867
19° N
Rua Veraquetá, 91
Pato Branco
CMEI Menino Deus



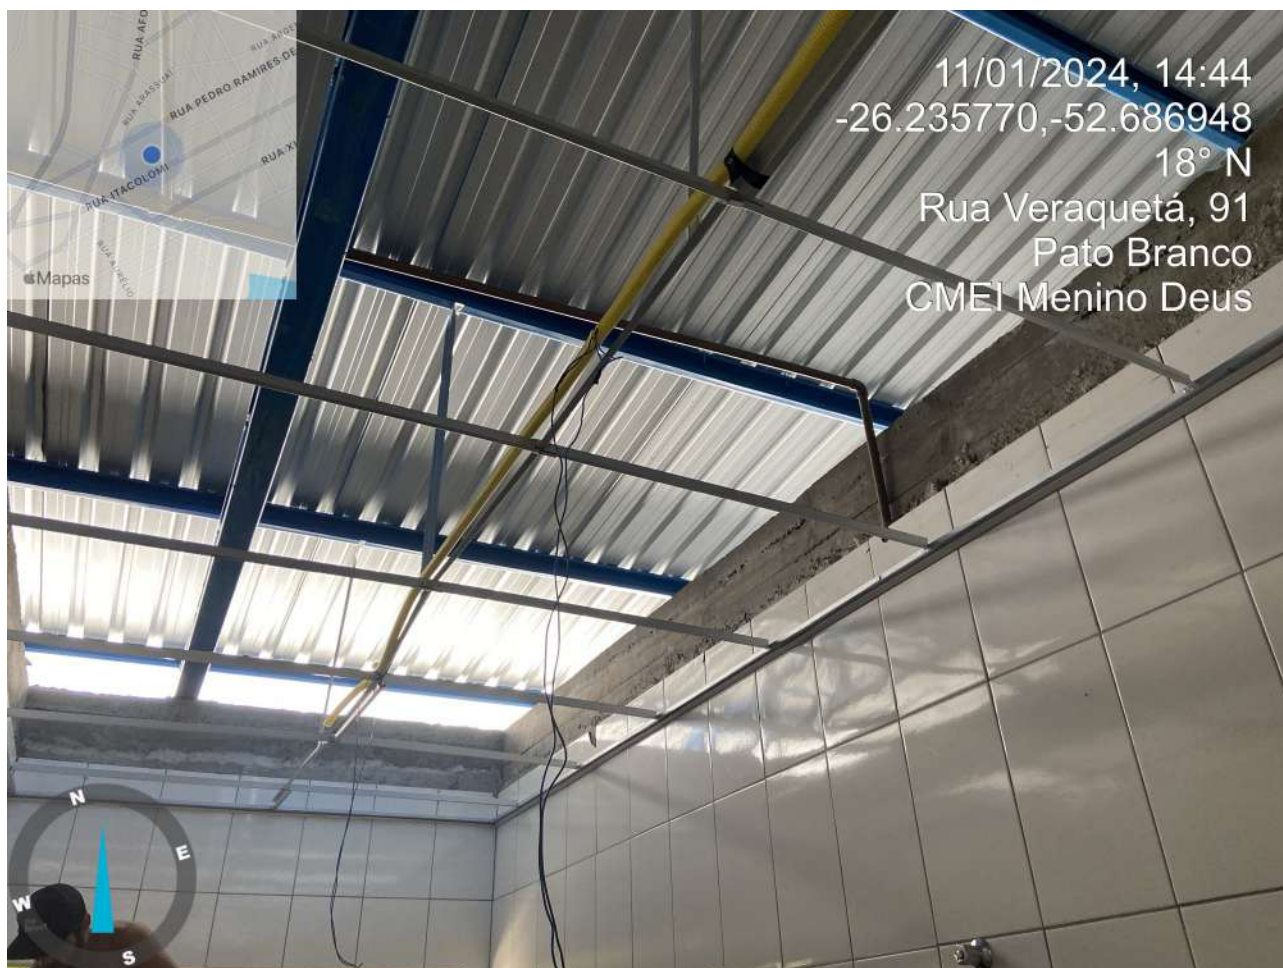










11/01/2024, 14:46
-26.235587,-52.687227

268° W


Rua Veraquetã, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus



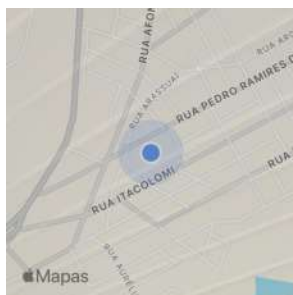

11/01/2024, 14:50
-26.235580,-52.687237
334° NW
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus




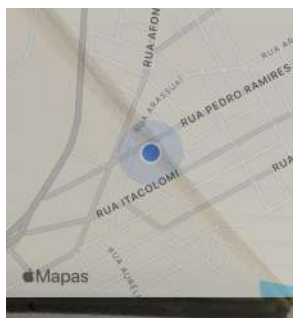

11/01/2024, 14:56
-26.235459,-52.687395
359° N
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus






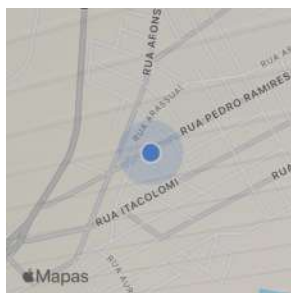


11/01/2024, 14:57
-26.235382,-52.687403
248° W
CMEI Menino Deus





11/01/2024, 14:57
-26.235382,-52.687403
242° SW
CMEI Menino Deus




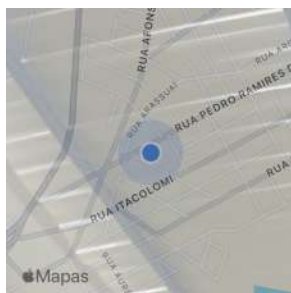

11/01/2024, 14:58
-26.235279,-52.687170
252° W
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus








11/01/2024, 15:04
-26.235750,-52.686980
208° SW
Rua Veraquetá, 91
Pato Branco
CMEI Menino Deus





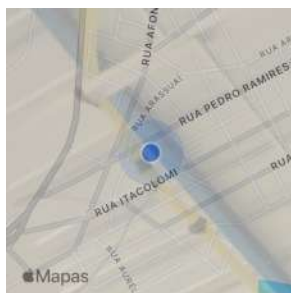

11/01/2024, 15:05
-26.235592,-52.687232
244° SW
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus





Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 269.156,76**.

Pato Branco, 17 de janeiro de 2024.

JAKELINE
LOUREIRO:
098029749
43

Assinado de forma
digital por
JAKELINE
LOUREIRO:0980297
4943
Dados: 2024.01.18
15:08:30 -03'00'

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D
