



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês: Fev

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	CÓDIGO SAM MUNIC.:	231	SAM	81
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Lote	1
FIRMA EMPREITEIRA:	HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP			CNPJ: 13.480.684/0001-18	

REGIONAL	Guarapuava	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1	DATA	17/02/2025 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	99/2024	Nº	
DATA:	26/06/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	-----------	-------------------	--------------	-------------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	2,00	-	2,00	50,00%	0,12%	0,06%	3.374,72	3.374,72	6.749,44	3.374,72
2	3	589	DRENAGEM		-		-				-	-	-	-
	600310C	DERPRC	Limpeza de bueiro	un	36,00	-	36,00	69,44%	0,13%	0,09%	198,01	4.950,25	7.128,36	2.178,11
	601200	DER	Reaterro e aploamento mecânico	m3	3.090,16	-	3.090,16	24,81%	2,38%	0,59%	42,44	32.534,08	131.146,39	98.612,31
	610400A	DERPRC	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	470,00	-	470,00	34,89%	0,88%	0,31%	102,71	16.844,44	48.273,70	31.429,26
	610600D	DERPRC	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	2.159,00	-	2.159,00	15,15%	7,45%	1,13%	189,80	62.064,60	409.778,20	347.713,60
	BLSM150	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,50 m	un	137,00	-	137,00	27,01%	4,86%	1,31%	1.953,37	72.274,69	267.611,69	195.337,00
	DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un	2,00	-	2,00	50,00%	0,07%	0,04%	1.877,57	1.877,57	3.755,14	1.877,57
	603100	DER	GRADE DE FERRO P/ BOCA DE LOBO	un	36,00	-	36,00	69,44%	0,28%	0,19%	428,76	10.719,00	15.435,36	4.716,36
	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	4.023,27	-	4.023,27	21,83%	0,58%	0,13%	7,94	6.974,50	31.944,76	24.970,26
	99257	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	un	21,00	-	21,00		0,47%		1.227,58	-	25.779,18	25.779,18
3	4	556	BASE / SUB-BASE		-		-				-	-	-	-
	531000A	DERPRC	Brita Graduada	m3	473,22	-	473,22	18,68%	2,36%	0,44%	273,93	24.209,93	129.629,15	105.419,22
4	5	551	REVESTIMENTO		-		-				-	-	-	-
	PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	27.162,00	-	27.162,00	24,07%	0,39%	0,09%	0,79	5.165,02	21.457,98	16.292,96
	560100A	DERPRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	3.154,80	-	3.154,80	18,68%	0,04%	0,01%	0,62	365,30	1.955,98	1.590,68
	589420A	DERPRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimção	ton	3,80	-	3,80	18,68%	0,33%	0,06%	4.793,69	3.259,71	18.216,02	14.956,31
	561100A	DERPRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	54.324,00	-	54.324,00	24,07%	0,42%	0,10%	0,43	5.622,68	23.359,32	17.736,64
	589420B	DERPRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	27,19	-	27,19	24,05%	2,37%	0,57%	4.793,69	31.350,73	130.340,43	98.989,70
	570200	DER	CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	1.310,95	-	1.310,95	25,54%	6,85%	1,75%	287,40	96.244,51	376.767,03	280.522,52
	589000F	DERPRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	51,38	-	51,38	25,55%	5,49%	1,40%	5.883,12	77.245,37	302.274,71	225.029,34
	570000D	DERPRC	CBUQ - Novos traços - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.832,61	-	2.832,61	23,37%	15,23%	3,56%	295,86	195.888,91	838.055,99	642.167,08
	589000K	DERPRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	147,02	-	147,02	22,72%	15,71%	3,57%	5.883,12	196.496,21	864.936,30	668.440,09
5	6	557	MEIO-FIO E SARJETA		-		-				-	-	-	-
	PAV-071	PM Curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	8.681,87	-	8.681,87	21,07%	4,27%	0,90%	27,09	49.547,61	235.191,86	185.644,25
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	8.681,87	-	8.681,87	21,07%	7,35%	1,55%	46,62	85.267,98	404.748,78	319.480,80
6	7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		-				-	-	-	-
	810250F	DERPRC	Fincadilha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	5.855,00	-	5.855,00		1,87%		17,58	-	102.930,90	102.930,90
	606700B	DERPRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	638,97	-	638,97		2,12%		182,62	-	116.688,70	116.688,70
	100576B	SINAPI/PRC	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	9.326,80	-	9.326,80		0,56%		3,30	-	30.778,44	30.778,44
	605000F	DERPRC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	9.326,00	-	9.326,00		7,25%		42,76	-	398.779,76	398.779,76
	531000B	DERPRC	Brita Graduada - Passeio	m3	466,38	-	466,38		2,32%		273,93	-	127.755,47	127.755,47
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	3.472,05	-	3.472,05		0,86%		13,71	-	47.601,81	47.601,81
	605000L	DERPRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 07 - 3,06 m2	un	112,00	-	112,00		0,55%		270,26	-	30.269,12	30.269,12

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
7	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.670,20	-	2.670,20		1,87%		38,47	-	102.722,59	102.722,59
	820000A	DERPRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	70,43	-	70,43		0,92%		719,65	-	50.684,95	50.684,95
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	304,00	-	304,00		2,82%		510,71	-	155.255,84	155.255,84
8	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	43,00	-	43,00	25,58%	0,10%	0,03%	133,04	1.463,44	5.720,72	4.257,28
	09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	43,00	-	43,00	25,58%	0,17%	0,04%	223,19	2.455,09	9.597,17	7.142,08
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	43,00	-	43,00	25,58%	0,13%	0,03%	171,06	1.881,66	7.355,58	5.473,92
	09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	43,00	-	43,00	25,58%	0,05%	0,01%	61,14	672,54	2.629,02	1.956,48
	09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	43,00	-	43,00	25,58%	0,10%	0,03%	124,30	1.367,30	5.344,90	3.977,60
	09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00	-	2,00	50,00%	0,28%	0,14%	7.641,33	7.641,33	15.282,66	7.641,33
					-	-	-				-	-	-	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	18,24%			% EXECUTADO :	18,13%		SOMAS	997.759,17	5.503.933,40	4.506.174,23

OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:	R\$5.503.933,40		
											Medição Acumulada:	997.759,17		
											Total Anterior:	-		
											Valor e % executado desta Medição :	R\$997.759,17	18,13 %	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														
Assinado de forma digital por SAMUEL PIASSA DAL ROSS:05406523937 Dados: 2025.03.21 09:53:37 -03'00'					Documento assinado digitalmente FERNANDA ZIANNI MANARIM Data: 21/03/2025 09:33:45-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br					Assinado de forma digital por GERI NATALINO DUTRA:64847136934 Dados: 2025.03.21 10:25:22 -03'00'				
SAMUEL PIASSA DAL ROSS:05406523937					gov.br					GERI NATALINO DUTRA:64847136934				

HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP
SAMUEL PIASSA DAL ROSS
ENGº CIVIL - CREA 137.412 PR-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
FERNANDA ZIANNI MANARIM
ENGº CIVIL - CREA 107.389 PR-D

PREFEITO MUNICIPAL DE PATO BRANCO
GÉRI NATALINO DUTRA

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	81 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP
Contrato Nº:	99/2024
Data da Vistoria:	17/02/2025

Objeto:

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbanas em CBUQ, 27.162,00m2, incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **27/07/2024** até **18/11/2024**.

SERVIÇOS EXECUTADOS




1 | Placa da Obra



3 | Pavimentação Rua Lauro Ferreira Albuquerque



4 | Pavimentação Rua Lauro Ferreira Albuquerque

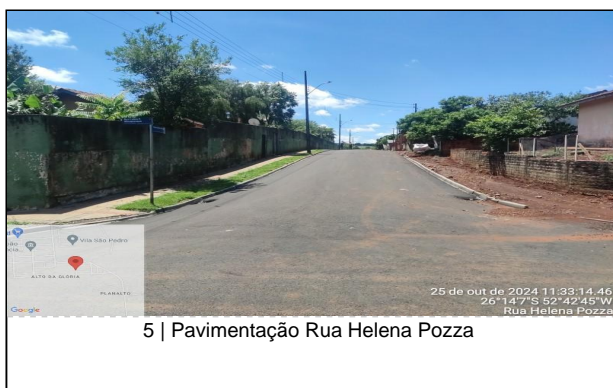



2 | QR Code - Placa de Obra

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/16361/lote/20347/medicao/11285/relatorio-fotografico/3545>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 25 de março de 2025.

Fernanda Zianni Manarim
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: CREA-PR 107.389/D

Documento assinado eletronicamente por:
Fernanda Zianni Manarim (25/03/2025 16:18:47)

Nome/controlado do arquivo:
2025032516184773.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025032516184773>
