



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 26 de abril 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 342/2022-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 618.058,17	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 10/03/2023	66,07	R\$ 408.357,68	33,93	R\$ 209.700,49
A liberar 2.ª Parcela em 26/04/2023	83,08	R\$ 105.181,20	16,92	R\$ 104.519,29
A liberar 3.ª Parcela em				

Valor a ser liberado em 26/04/2023 R\$ 105.181,20

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROFONTE / TOMADOR

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

APELIDO DO EMPREENHIMENTO
01TROCA DE TELHADOS

INÍCIO DE OBRA
22/09/22

Nº CTEF
EMPRESA EXECUTORA
LINCOLN IERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA

CNPJ
10.783.587/0001-96

REGIME DE EXECUÇÃO
(SELECIONAR)

PERÍODO DA MEDIÇÃO
11/03/2023 a 26/04/2023

Nº MEDIÇÃO
2

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
1.1.	TELHADOS	-	-	-	618.058,17	-	-	-	408.357,68	105.181,20	513.538,88
1.1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	548.617,76	-	-	-	406.018,20	74.829,20	480.847,40
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1.093,00	62,00	67.766,00	900,00	100,00	1.000,00	55.800,00	6.200,00	62.000,00
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.093,00	4,00	4.372,00	900,00	100,00	1.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.093,00	7,00	7.651,00	900,00	100,00	1.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.093,00	225,00	245.925,00	900,00	100,00	1.000,00	202.500,00	22.500,00	225.000,00
1.1.5.	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	263,00	120,00	31.560,00	150,00	50,00	200,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	326,00	75,00	24.450,00	250,00	50,00	300,00	18.750,00	3.750,00	22.500,00
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	410,00	200,00	82.000,00	300,00	50,00	350,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	264,00	129,45	34.174,80	-	164,00	164,00	-	21.229,80	21.229,80
1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.093,00	30,00	32.790,00	900,00	100,00	1.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00
1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	114,00	86,64	9.876,96	80,00	10,00	90,00	6.931,20	866,40	7.797,60
1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4.400,00	1,83	8.052,00	3.900,00	100,00	4.000,00	7.137,00	183,00	7.320,00
1.2.	Ferro de PVC	-	-	-	65.871,11	-	-	-	1.757,48	28.012,00	29.769,48
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	829,00	2,12	1.757,48	829,00	-	829,00	1.757,48	-	1.757,48
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	829,00	70,03	58.054,87	-	400,00	400,00	-	28.012,00	28.012,00
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M OUTROS	M	907,00	6,68	6.056,76	-	-	-	-	2.340,00	2.340,00
1.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	75,00	9,70	727,50	60,00	-	60,00	582,00	-	582,00
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.093,00	2,60	2.841,80	-	900,00	900,00	-	2.340,00	2.340,00

Observações:



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

CONTRATO Nº342/2022/GP


Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 105.181,20.


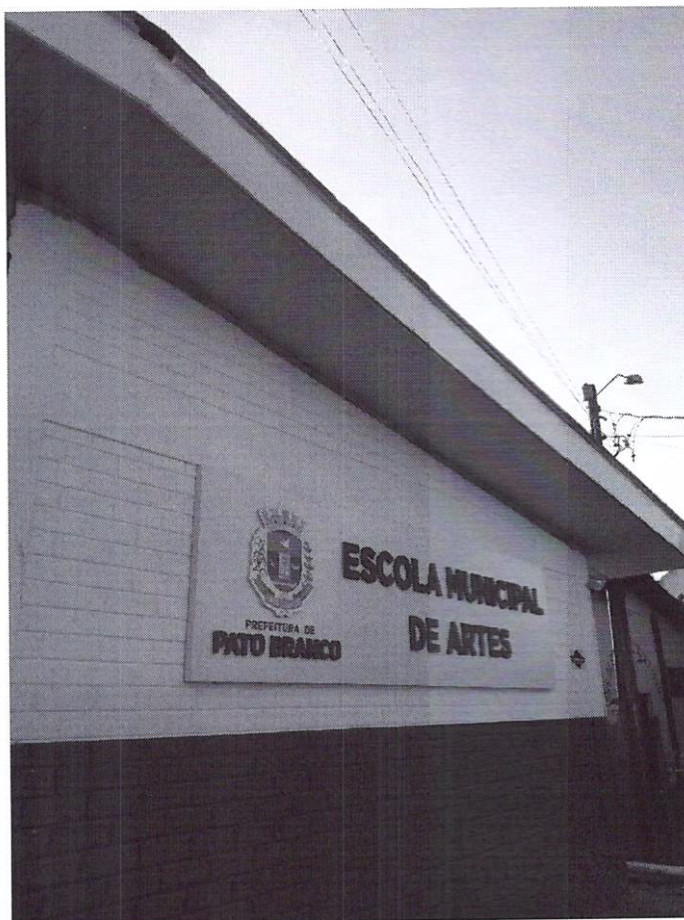









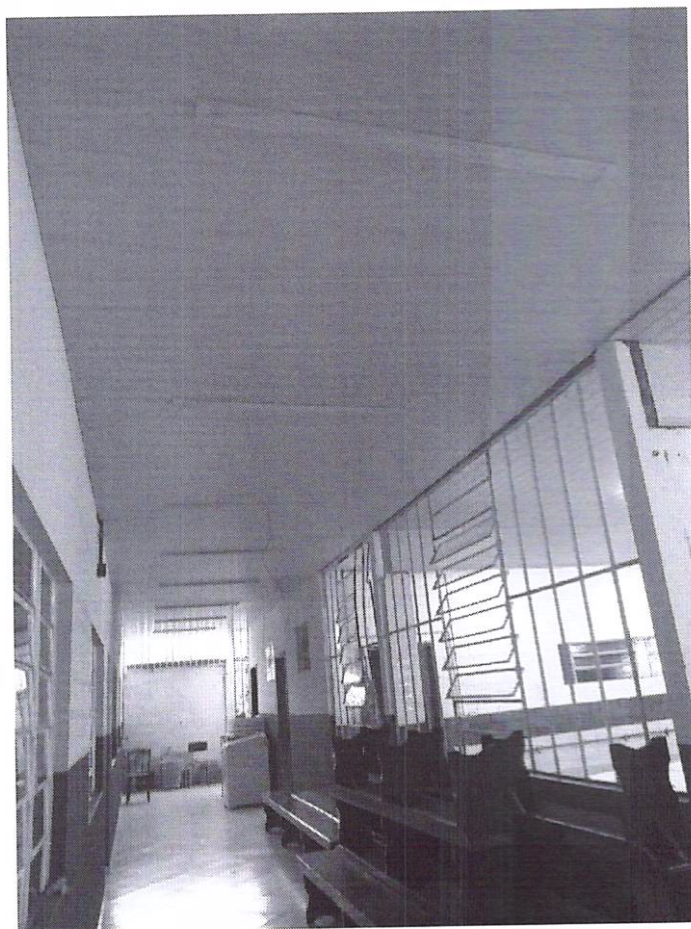

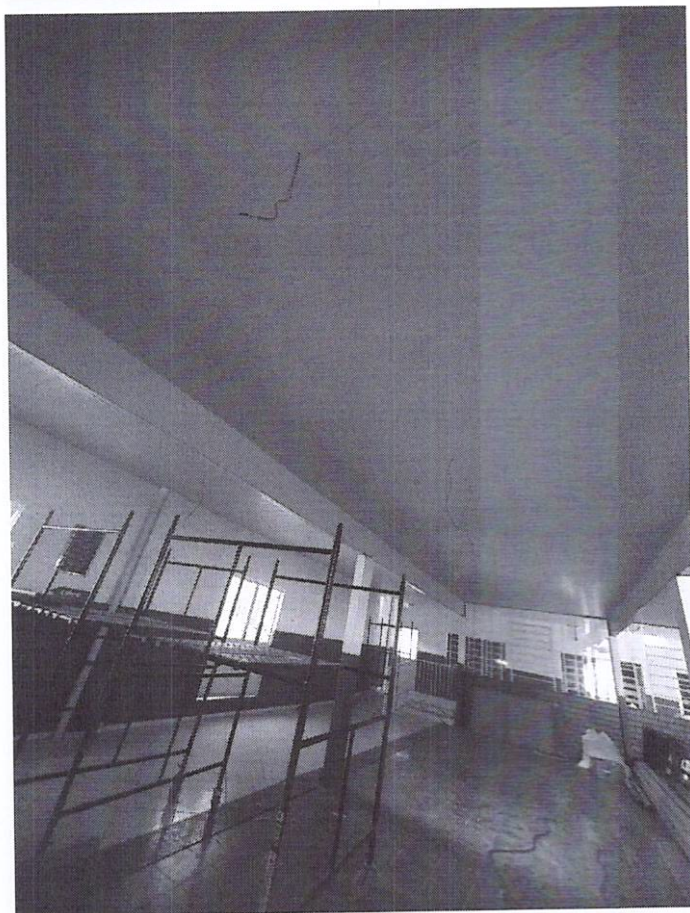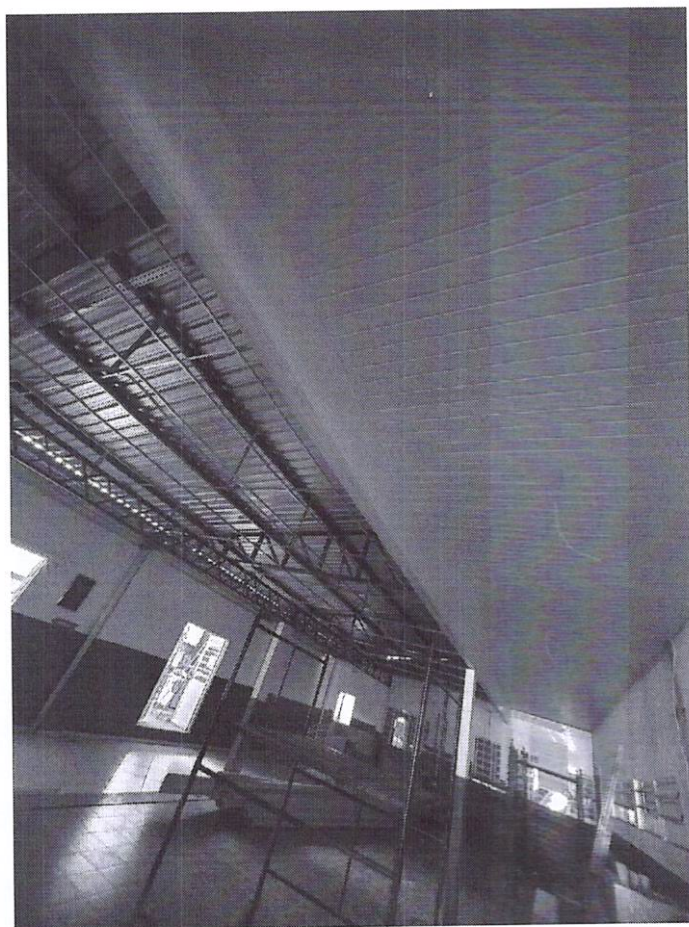

Pato Branco, 26 de abril de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
