



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Pato Branco 27/12/2022

LAUDO DE LIBERAÇÃO

Lilian Cristina Brandalise
Secretária Municipal de Saúde

MARCIO GALLINA CONTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ N° 16.700.335/0001-52
Contrato n° 352/2022/GP

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL CACHOEIRINHA

CONTRATO	100%		183.072,15	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela a partir de 27/12/2022	100,00%	30.030,62	0,00%	R\$ 153.041,53
Valor a ser liberado	R\$30.030,62			

Lilian Cristina Brandalise
Secretária Municipal de Saúde

Assinado por 2 pessoas: PATRÍCIA VICENZI e LILIAN CRISTINA BRANDALISE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4593-2081-2338-FD0F>





EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROPOSTANTE/TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Grau de Sigilo
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli	0		REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA	#PUBLICO
Nº CTEF	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	
352	MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	02/12/2022 a 00/01/1900	

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA				TOTAL:	-	16,40	16,40	-	30.030,62	30.030,62
1.	REFORMA POSTO CACHOEIRINHA			183.072,15	-	16,40	16,40	-	30.030,62	30.030,62
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			9.486,00	-	20,00	20,00	-	1.897,20	1.897,20
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			4.106,40	-	20,00	20,00	-	821,28	821,28
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			5.379,60	-	20,00	20,00	-	1.075,92	1.075,92
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			4.150,64	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017			426,93	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017			388,83	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017			1.610,77	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017			412,52	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017			887,91	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015			337,80	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015			85,88	-	-	-	-	-	-
1.3.	COBERTURA			42.707,30	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ÍÇAMENTO.AF_07/2019			10.347,40	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ÍÇAMENTO.AF_07/2019			2.830,92	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019			4.774,32	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019			3.548,16	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO.AF_07/2019			7.745,28	-	-	-	-	-	-
1.3.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AF_06/2022			1.592,75	-	-	-	-	-	-





EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente/TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
MARCIO Gallina Construção civil e Materiais de Construção Elreli		0				O REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		# PÚBLICO	
Nº CTEF		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
352		16.700.335/0001-52		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		02/12/2022 a 00/01/1900		02/12/22	
EMPRESA EXECUTORA								Nº MEDIÇÃO	
MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE								1	

Item	Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
	Descrição	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CITEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA									
TOTAL:									
193.972,19									
1.3.7.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	5.045,43	-	-	-	-	-	-	
1.3.8.	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1" CM (SEM COLOCACAO)	6.823,04	-	-	-	-	-	-	
1.4.	ESTRUTURAS	14.740,80	-	41,16	41,16	-	6.067,54	6.067,54	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_ 09/2021	3.390,20	-	100,00	100,00	-	3.390,20	3.390,20	
1.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_ 08/2017	157,51	-	100,00	100,00	-	157,51	157,51	
1.4.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_ 07/2021	1.666,72	-	-	-	-	-	-	
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_ 07/2016	3.893,75	-	-	-	-	-	-	
1.4.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	2.227,84	-	-	-	-	-	-	
1.4.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	725,21	-	100,00	100,00	-	725,21	725,21	
1.4.7.	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	537,21	-	100,00	100,00	-	537,21	537,21	
1.4.8.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	1.105,93	-	100,00	100,00	-	1.105,93	1.105,93	
1.4.9.	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	151,48	-	100,00	100,00	-	151,48	151,48	
1.4.10.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	480,07	-	-	-	-	-	-	
1.4.11.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	159,54	-	-	-	-	-	-	
1.4.12.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	245,34	-	-	-	-	-	-	
1.5.	REVESTIMENTO INTERNO PAREDES	5.591,03	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_ 06/2014	938,68	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	4.621,59	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO/ ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	30,76	-	-	-	-	-	-	
1.6.	REVESTIMENTO DE PISO	9.215,77	-	-	-	-	-	-	





EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROPOSTANTE/TOMADOR		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0		O REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		#PUBLICO	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
352		MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		02/12/2022	
		CNPJ		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
		16.700.335/0001-52		02/12/2022 a 00/01/1900		1	

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA										
		TOTAL:		183.072,15	-	16,40	16,40	-	30.030,02	30.030,02
1.6.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			4.821,44	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020			4.343,95	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014			50,38	-	-	-	-	-	-
1.7.	DIVISÓRIAS INTERNAS			8.176,84	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	DIVISÓRIA NAVAL COM PORTAS INCLUSO FECHADURA			8.176,84	-	-	-	-	-	-
1.8.	BANCADAS E EQUIPAMENTOS			7.150,26	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			2.221,61	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1.766,08	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			119,60	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			44,90	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			2.334,80	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			576,23	-	-	-	-	-	-
1.8.7.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			55,56	-	-	-	-	-	-
1.8.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			29,48	-	-	-	-	-	-
1.9.	ESQUADRIAS			27.577,87	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)			12.176,88	-	-	-	-	-	-



EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROPOSTANTE/TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
MARCIO GALLINA Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0				0 REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		# PÚBLICO	
EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
352 MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE		16.700.335/0001-52		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		02/12/2022 a 02/01/1900		02/12/22	
Nº CTEF						Nº MEDIÇÃO		1	

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição		Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
TOTAL:									
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA									
1.9.2.	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MÓVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA.		2.551,85	-	-	-	-	-	-
-	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019		-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - P		6.358,04	-	-	-	-	-	-
1.9.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS; BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		763,15	-	-	-	-	-	-
1.9.5.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADILHAS E FECHADURA EXTERNA)		2.175,26	-	-	-	-	-	-
1.9.6.	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMEIRA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADILHAS)		1.421,04	-	-	-	-	-	-
1.9.7.	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA		2.131,65	-	-	-	-	-	-
1.10.	CERCAMENTO		27.424,76	-	80,46	80,46	-	22.065,88	22.065,88
1.10.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017		396,83	-	100,00	100,00	-	396,83	396,83
1.10.2.	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018		23.980,80	-	90,36	90,36	-	21.669,05	21.669,05
1.10.3.	PORTÃO DE ALAMBRADO COM ESTRUTURADO COM TUBO E AÇO GALVANIZADO		3.047,13	-	-	-	-	-	-
1.11.	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTERNA		26.850,88	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚL TIPOS PAVIMENTOS. AF_06/2014		586,13	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016		3.043,37	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015		11.096,45	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018		2.100,80	-	-	-	-	-	-
1.11.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		856,50	-	-	-	-	-	-
1.11.6.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM		702,80	-	-	-	-	-	-



EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROPOSTANTE/TOMADOR		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli		0		O REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		#PUBLICO	
Nº CTEF		CNPJ		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
352		16.700.335/0001-52		02/12/2022 a 00/01/1900		02/12/22	
EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO			
MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		1			

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF- REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO CACHOEIRINHA		113.072,15	-	16,40	116,40	-	30.030,62	30.030,62
TOTAL:								
1.11.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).AF. 12/2015	114,60	-	-	-	-	-	-
1.11.8.	ASSENTAMENTO DE CALHA/CANALETAS DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	3.775,10	-	-	-	-	-	-
1.11.9.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA L=30CM, PARA ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.536,70	-	-	-	-	-	-
1.11.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	390,95	-	-	-	-	-	-
1.11.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	646,48	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO/PR		Responsável Técnico pela Fiscalização	
Local		Nome:	PATRICIA VINCENZI
		Profissão:	ENGENHEIRA CIVIL
		CREA/CAU:	192.266/D
		ART/RRT:	0



EDUARDO BELLEI
ENG. CIVIL
164.074/D-PR



**REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE
SÃO MIGUEL CACHOEIRINHA
CONTRATO Nº 352/2022/GP**

Relatório de Medição nº 1

DATA: 27/12/2022

Empresa Contratada: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI - CNPJ 16.700.335/0001-52

Responsável: profissional da empresa responsável pela execução: RODRIGO PIRES FRANCO
– CAU/BR Nº 000A910392

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a 1ª medição, constatando o percentual relativo as as quantidades executadas dos itens na planilha de medição.

Seguem fotos da obra:



Foto 1: Construção do cercamento



Foto 2: Construção do cercamento



Foto 3: Construção do cercamento



Foto 4: Construção do cercamento



Foto 5: Finalização do cercamento



Foto 6: Finalização do cercamento

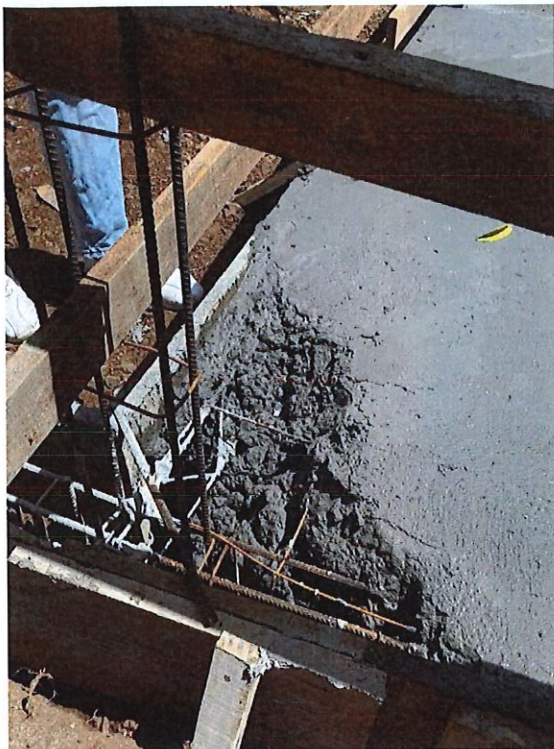


Foto 7: Concretagem do radier

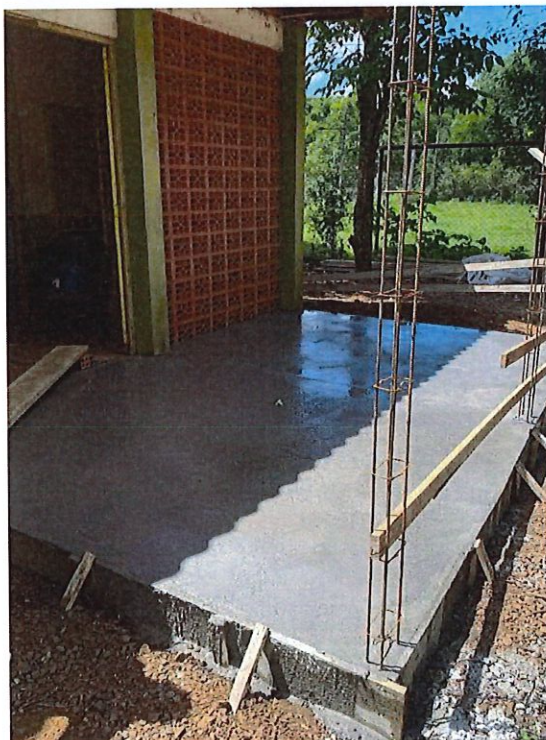


Foto 8: Radier concretado

Conforme a Cláusula décima primeira do referido contrato:

I- A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência.

II - Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O

prazo de garantia dos materiais adquiridos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido

nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusão da obra objeto desta licitação.

II- A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição parcial, demonstrando o percentual dos serviços executados, no valor de R\$ 30.030,62.

Pato Branco, 27 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA VINCENZI
Engenheira Civil
CREA-PR 192.266/D



EDUARDO BELUCI
ENG. CIVIL
164.074/D-PR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS




Código para verificação: 4593-2081-2338-FD0F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRÍCIA VICENZI (CPF 087.XXX.XXX-82) em 27/12/2022 19:57:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LILIAM CRISTINA BRANDALISE (CPF 339.XXX.XXX-68) em 27/12/2022 20:06:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4593-2081-2338-FD0F>


EDUARDO BELLEI
ENG. CIVIL
164.074/D-PR
