



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 08 de agosto 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 53/2023-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 1.276.479,17	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1.ª Parcela em 08/08/2023	46,98	599.760,00	53,02	R\$ 676.719,17
A liberar 2.ª Parcela em				

Valor a ser liberado em 08/08/2023 R\$ 599.760,00

Gestora e fiscal do contrato.

Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato

Jusara Aparecida de Oliveira Santos Ritzmar
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Prefeitura de Pato Branco - PR
Rua Tamoio, 550 - Centro, CEP 85.501-06
(46) 3220 6093
seceducao@patobranco.pr.gov.br

Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Seleção o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENHIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
0		0		0		0		22/09/22	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
0		LINCOLN TERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA		10.783.887/0001-96		(SELECIONAR)		22/09/2022 a 09/08/2023	
								Nº MEDIÇÃO	
								1	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtd.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:							
1.1.	TELHADOS	-	-	-	1.276.479,18	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1.1.1. Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	1.213.423,18	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	1.1.1.1. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	3.569,00	62,00	221.278,00	-	2.000,00	2.000,00	-	124.000,00	124.000,00
1.1.2.	1.1.2. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	3.569,00	225,00	803.025,00	-	2.000,00	2.000,00	-	450.000,00	450.000,00
1.1.3.	1.1.3. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	325,00	120,00	39.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	1.1.4. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	412,00	75,00	30.900,00	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	1.1.5. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	57,00	200,00	11.400,00	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	1.1.6. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P	M2	2.357,36	30,00	70.720,80	-	278,50	278,50	-	8.355,00	8.355,00
1.1.7.	1.1.7. CUIVEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	142,00	86,64	12.302,88	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	1.1.8. HASTE REITA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" x 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	13.550,00	1,83	24.796,50	-	6.500,00	6.500,00	-	11.895,00	11.895,00
1.2.	1.2. Forro de PVC	-	-	-	51.494,86	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1.2.1. FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	655,20	70,03	45.883,66	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	1.2.2. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	840,00	6,68	5.611,20	-	-	-	-	-	-
1.3.	1.3. OUTROS	-	-	-	11.561,14	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	1.3.1. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	560,00	9,70	5.432,00	-	300,00	300,00	-	2.910,00	2.910,00
1.3.2.	1.3.2. LIMPEZA DE OBRA	M2	2.357,36	2,60	6.129,14	-	1.000,00	1.000,00	-	2.600,00	2.600,00
Observações:											

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBICO

PROPOSICIONANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0	0	0	0	22/09/2022
Nº CTEF	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	10.783.587/0001-96	(SELECIONAR)	22/09/2022 a 08/08/2023	1
EMPRESA EXECUTORA				
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA				

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orgamento Contratado						Evolução Física (Qtd.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluido o Período
Objeto do CTEF:											
Local											
Data											
terça-feira, 8 de agosto de 2023											
TOTAL:											
Responsável Técnico pela Fiscalização						Nome: ADERNAANDA PAULA DOS SANTOS					
						Profissão: ENGENHEIRA CIVIL					
						CREA/CAU: 112602-O/D					

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERLANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 0

Adelanda Paula dos Santos



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADOS – CMEI BAIRRO PLANALTO

CONTRATO Nº 53/2023/GP


Relatório de Medição nº 01


Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA


Responsável: Leonardo de Souza Brognoli


Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 599.760,00.

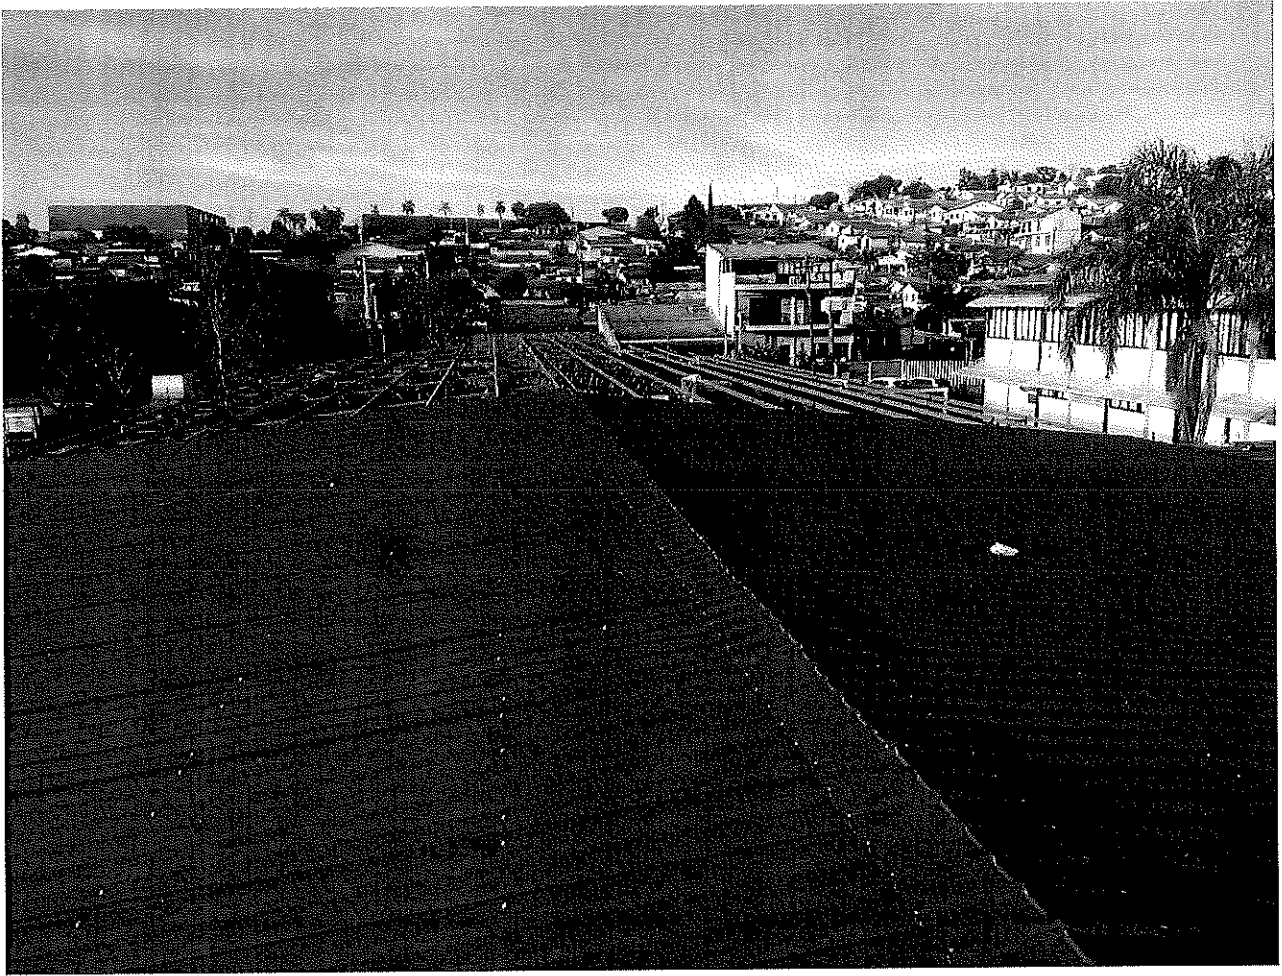


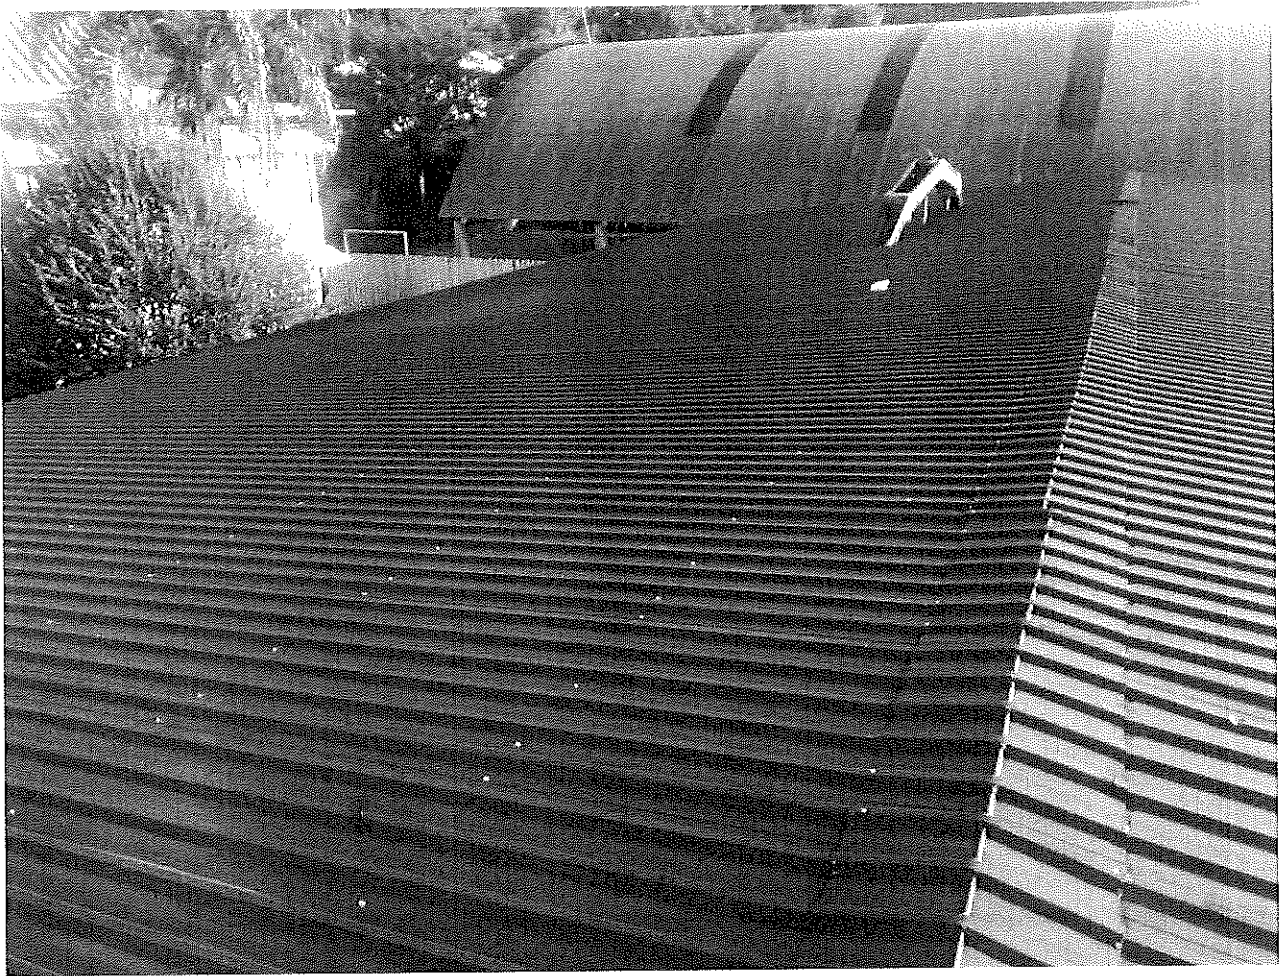

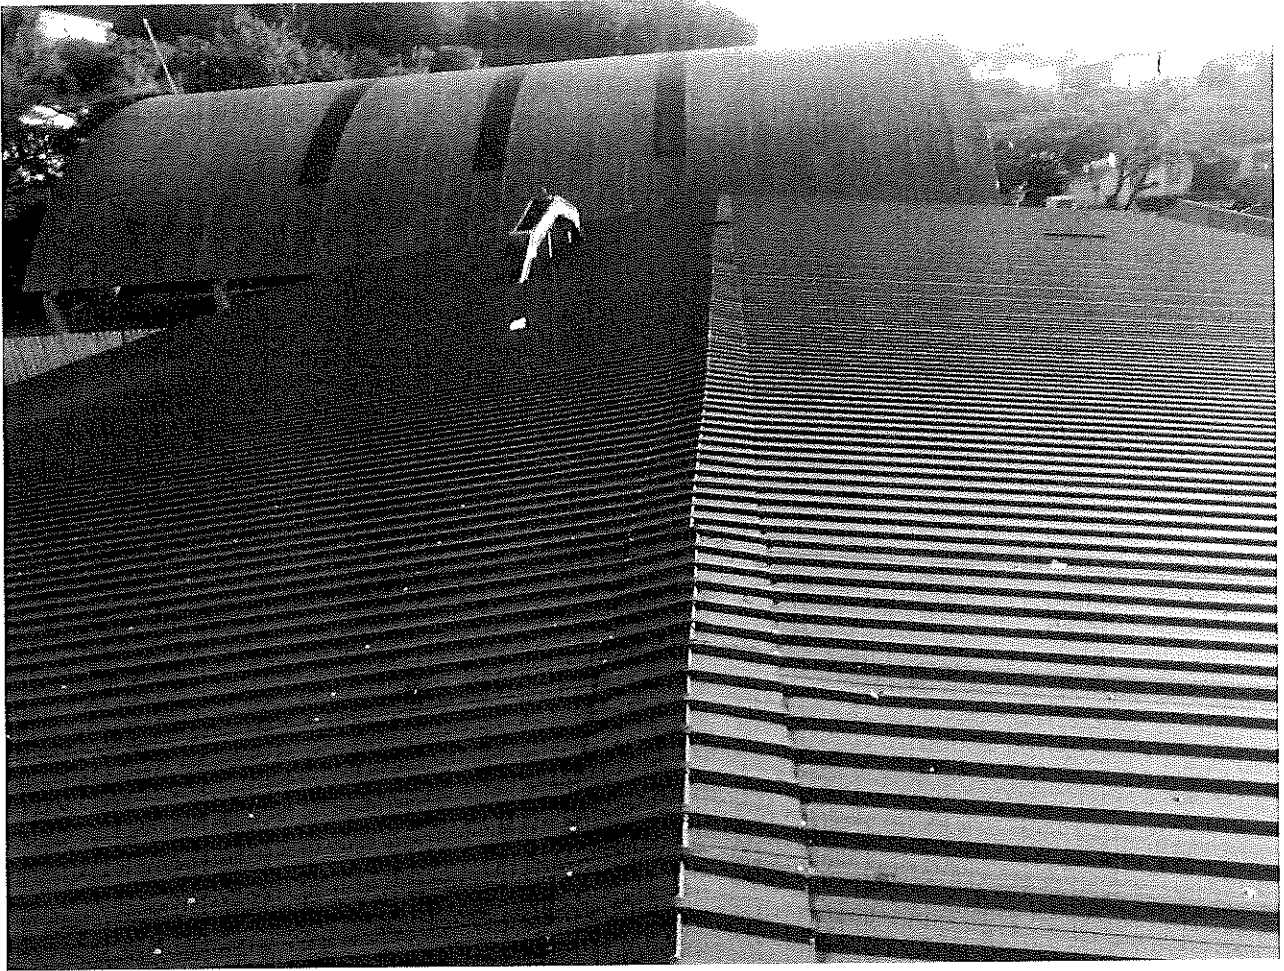


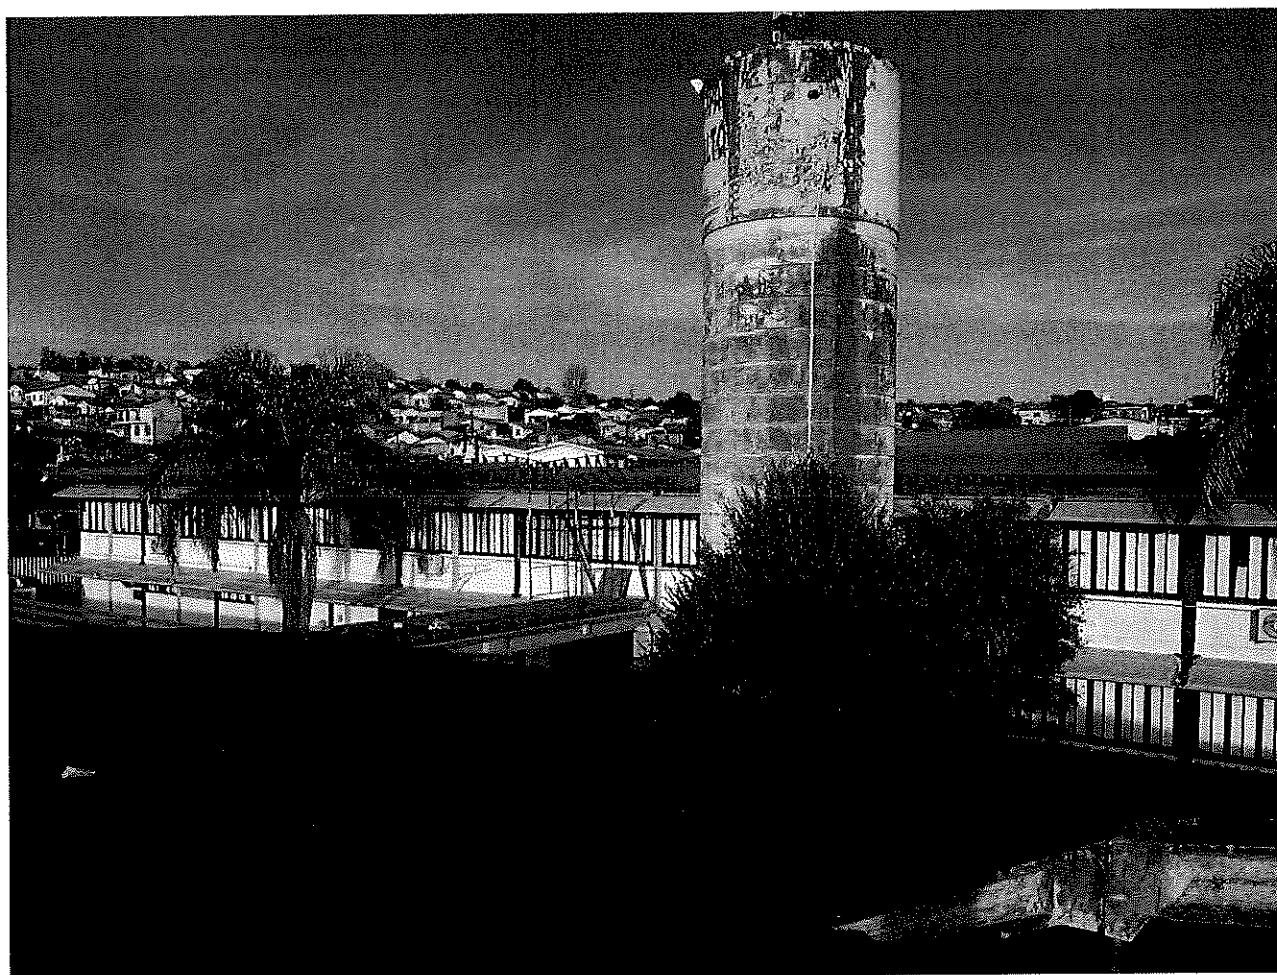



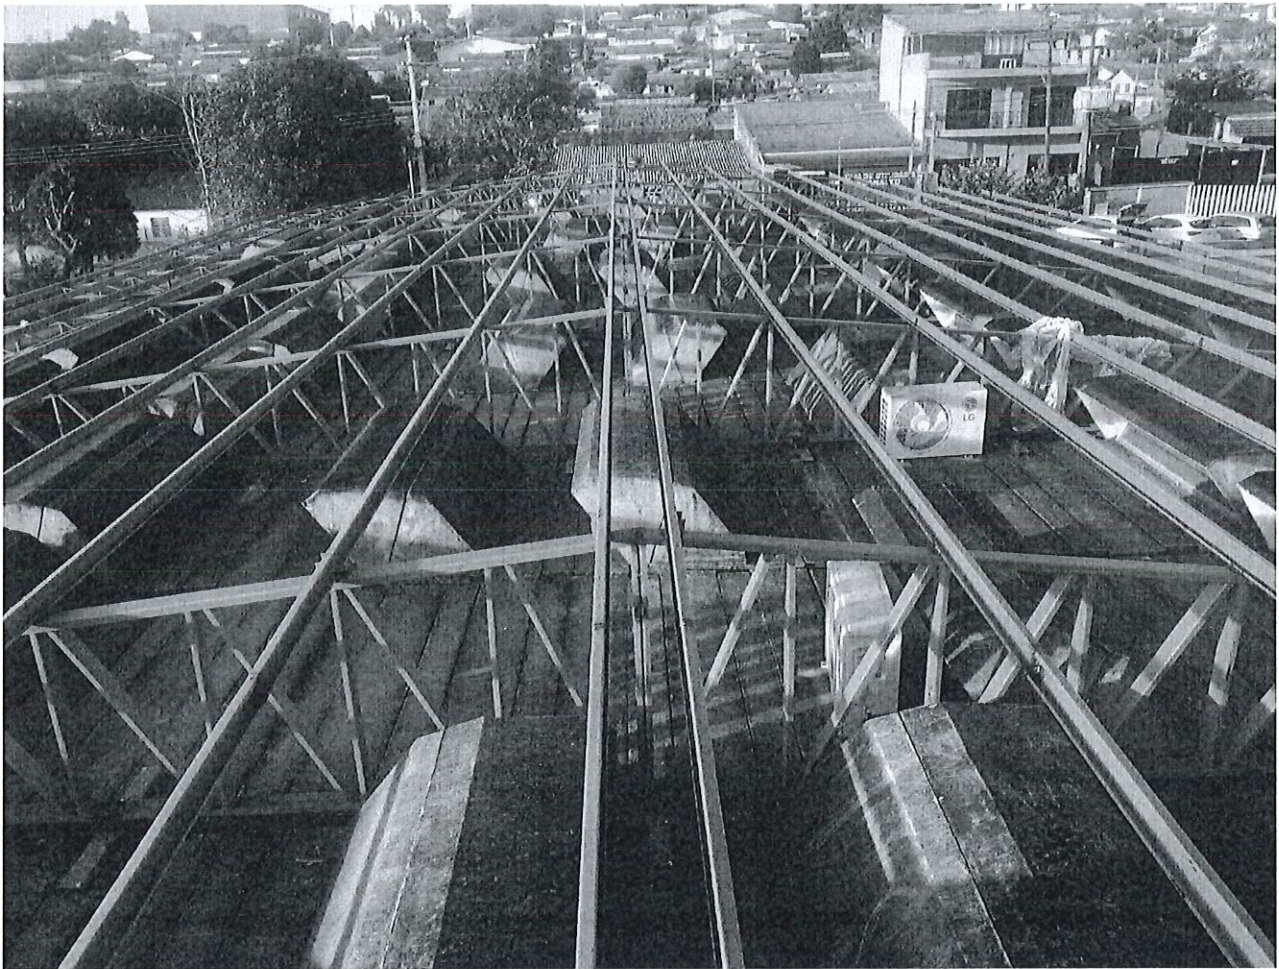

Pato Branco, 08 de agosto de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
