



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	12/08/2024 - seg
Mês	Ago	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SAM	74	Nº	21/2024
Lote	5	DATA:	14/02/2024
Ano	2024		

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA - São Luiz
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	-------------	-------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-					-	-	-
	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	309,74	100,00%	0,0132	1,32%	18,57	5.751,87	5.751,87	-
	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	105,10	100,00%	0,0002	0,02%	0,85	89,34	89,34	-
	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	100,00%	0,0001	0,01%	1,92	28,80	28,80	-
	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	100,00%			1,63	16,30	16,30	-
	1.1.2		LOCACAO		-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	100,00%	0,0068	0,68%	73,50	2.940,00	2.940,00	-
	101206	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), AF_05/2020 FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H	m3	13,42	100,00%	0,0102	1,02%	331,60	4.450,07	4.450,07	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0215	2,15%	1.554,47	9.326,82	9.326,82	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0085	0,85%	3.671,01	3.671,01	3.671,01	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	88,75	100,00%	0,0020	0,20%	9,89	877,74	877,74	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	GRELHA DE CONCRETO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59,03	100,00%	0,0127	excesso	93,57	5.523,43	5.523,43	-
3	4		ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3) ESPESSURA 3,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3,11	100,00%	0,0008	0,08%	114,92	357,40	357,40	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0) ESPESSURA 5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	4,44	100,00%	0,0014	0,14%	132,50	588,30	588,30	-
	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA O- 138. AF_09/2021	KG	23,06	100,00%	0,0072	0,72%	135,74	3.130,16	3.130,16	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A) ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Ago PARCELA 3ª DATA 12/08/2024 - seg

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - São Luiz	Lote	5	Nº	21/2024
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	643,60	100,00%	0,0141	1,41%	9,50	6.114,20	6.114,20	-
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00	100,00%	0,0070	0,70%	17,33	3.032,75	3.032,75	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-	-	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	24,62	73,86	73,86	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	960,00	100,00%	0,0106	1,06%	4,80	4.608,00	4.608,00	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	117,36	117,36	117,36	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	84,67	84,67	84,67	-
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	46,98	46,98	46,98	-
x			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	207,63	207,63	207,63	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29,00	100,00%	0,0087	0,87%	130,54	3.785,66	3.785,66	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO - METÁLICO, COM FLANGE, PINTADO ELETROSTATICAMENTE 50X40X35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%	0,0008	0,08%	359,47	359,47	359,47	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 4,5, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA RUBI TOPO DE POSTE - SOQUETE E-27 PARA LAMPADA DE LED 20W	UNID	30,00	100,00%	0,0823	8,23%	1.191,75	35.752,50	35.752,50	-
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS							-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-				-	-	-	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	12/08/2024 - seg

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Ago	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - São Luiz	SAM	74	Nº	21/2024
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	5	DATA:	14/02/2024
		Ano	2024		

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	187,49	187,49	187,49	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0007	0,07%	297,61	297,61	297,61	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	166,29	166,29	166,29	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	102,65	102,65	102,65	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,72	100,00%	0,0002	0,02%	15,52	104,29	104,29	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,25	100,00%	0,0002	0,02%	45,33	101,99	101,99	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,70	30,70	30,70	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0021	0,21%	912,16	912,16	912,16	-
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO		-				-	-	-	-
	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	145,90	100,00%	0,0162	1,62%	48,27	7.042,59	7.042,59	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	42,43	100,00%	0,0050	0,50%	51,34	2.178,36	2.178,36	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	91,40	100,00%	0,0142	1,42%	67,37	6.157,62	6.157,62	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	202,76	100,00%	0,0343	3,43%	73,55	14.913,00	14.913,00	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A) ASSOCIAÇÃO Amsop

Mês Ago PARCELA 3ª DATA 12/08/2024 - seg

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - São Luiz	Lote	5	Nº	21/2024
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	245,56	100,00%	0,0459	4,59%	81,12	19.919,83	19.919,83	-
x			SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	88,75	100,00%	0,0178	1,78%	87,28	7.746,10	7.746,10	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	206,83	100,00%	0,1307	13,07%	274,42	56.758,29	56.758,29	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS VIBROPRENSADAS. ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII	M2	112,90	100,00%	0,0261	2,61%	100,23	11.315,97	11.315,97	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO ASSETADO COM ACII - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	145,90	100,00%	0,0392	3,92%	116,65	17.019,24	17.019,24	-
7	11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-	-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	177,32	100,00%	0,0156	1,56%	38,23	6.778,94	6.778,94	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE FESTEIRAS. AF 05/2018	M2	0,52	100,00%	0,0007	0,07%	615,25	319,93	319,93	-
x			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	5,00	100,00%	0,0060	0,60%	522,79	2.613,95	2.613,95	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0035	0,35%	1.515,86	1.515,86	1.515,86	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2,00	100,00%	0,0113	1,13%	2.457,72	4.915,44	4.915,44	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0105	1,05%	4.556,48	4.556,48	4.556,48	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0065	0,65%	2.840,72	2.840,72	2.840,72	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	3,00	100,00%	0,0150	1,50%	2.177,76	6.533,28	6.533,28	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PIRÂMIDE DE CORDAS, INCLUSO FUNDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%	0,1839	18,39%	79.871,98	79.871,98	79.871,98	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CARROSSEL PARA PLAYGROUND CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%	0,0061	0,61%	2.640,14	2.640,14	2.640,14	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	GANGORRA PARA PLAYGROUND CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%	0,0031	0,31%	1.329,94	1.329,94	1.329,94	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	12/08/2024 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	21/2024	Nº	
DATA:	14/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Ago
SUBPROJETO:	PRAÇA - São Luiz	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	5
		Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ESCORREGADOR + TÚNEL + ESCALADA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INCLUÍDO REVESTIMENTO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, ESCORREGADORES E AGARRAS DE RESINA - CONFORME PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,1945	19,45%	84.476,74	84.476,74	84.476,74	-	
GLOBAL - LOTE 1						% PREVIST	47,80%	% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	434.281,90	434.281,90	-

OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$434.281,90
										Medição Acumulada:	434.281,90
										Total Anterior:	301.849,92
										Valor Desta Medição:	R\$132.431,98

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 31/10/2024 14:20:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 04/11/2024 08:24:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON
CANTU:4414
3664968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.11.04 11:35:50 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A9102039

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
 PROJETO : PRAÇA - São Luiz
 CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM
 EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 21/2024 DATA : 14/02/2024
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 434.281,90
 SAM : Nº. 74
 LOTE : Nº. 5
 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
 Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023
 MEDIÇÃO Nº: 3ª
 DATA DA MEDIÇÃO : 12/08/2024
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/08/2024
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/02/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR		PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS				(R\$)	(%)		
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	21.824,14	120,39%	21.824,14	26.274,21	20269,67	6.004,54	27,51%	
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	6.401,17	100,00%	6.401,17	6.401,17	6401,17	-	-	
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	10.190,06	100,00%	10.190,06	10.190,06	945,70	9.244,36	90,72%	
4	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	40,00%	19.227,55	100,00%	48.068,88	48.068,88	38543,22	9.525,66	19,82%	
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	35,00%	666,11	100,00%	1.903,18	1.903,18	1800,53	102,65	5,39%	
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	35,00%	50.067,85	100,00%	143.051,00	143.051,00	96679,33	46.371,67	32,42%	
7	11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	50,00%	99.196,70	100,00%	198.393,40	198.393,40	137210,30	61.183,10	30,84%	
8				-		-	-		-		
9				-		-	-		-		
10				-		-	-		-		
11				-		-	-		-		
12				-		-	-		-		
TOTAL CRONOGRAMA				207.573,58		TOTAL MEDIÇÃO	434.281,90	OK	Parcial		
								Acumulado	Dest		
								Med. Anterior	Medição		
								301.849,92	132.431,98		

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$132.431,98

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente



RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 31/10/2024 14:20:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 04/11/2024 08:24:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:441 43664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.11.04 11:32:53 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A9102039

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 5 / 3
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	21/2024
Data da Vistoria:	30/08/2024

Objeto:


Revitalização da Praça São Luís, contendo: área de convivência, play-ground, espaço sacro e calçadas.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **26/07/2024** até **30/08/2024**.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | DETALHE DA PLACA

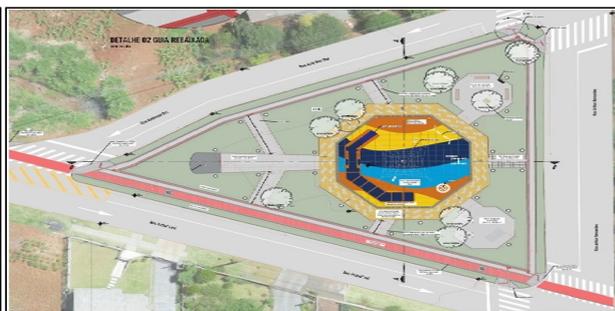

14 | Mapa



2 | PAVER E GRAMAS



3 | Piso e Paver



4 | Brinquedos



5 | Brinquedos



6 | BANCOS E BEBEDOURO



7 | Pisos



8 | Calçada e gramado



9 | Calçadas e gramado



10 | mesas



11 | Calçadas e mesas



12 | bebedouro e bancos



13 | Brinquedos



1 | PLACA DA OBRA

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19329/medicao/12434/relatorio-fotografico/1000>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 07 de outubro de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Antonio Alexandre Otto Guibes (07/10/2024 14:52:53)

Nome/controlado do arquivo:
2024100714525340.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024100714525340>
