

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Apelido EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	Nome DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: **14** Período: **27/09/2024 a 30/10/2024** % Realizado Período.: **6,35%** % Realizado Acum.: **93,56%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1,3,E4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banco inferior	ADM LOCAL - PLE 01	ADM LOCAL - PLE 02	ADM LOCAL - PLE 03	ADM LOCAL - PLE 04	ADM LOCAL - PLE 05	ADM LOCAL - PLE 06	ADM LOCAL - PLE 07	ADM LOCAL - PLE 08
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
43	Instalações elétricas - Quadros de distribuição																									
44	Instalações elétricas - Disjuntores																									
45	Instalações elétricas - Suporte e vergalhão	12																								
46	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 1,5																									
47	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 16,																									
48	Instalações elétricas - Cabos Flexíveis de 95,																									
49	Instalações elétricas - Caixas enterradas	14																								
50	Instalações elétricas - Interruptores e tomada																									
51	Instalações elétricas - Eletrocalhas	14																								
52	Instalações elétricas - Luminárias																									
53	Instalações elétricas - Refletores	13																								
54	Instalações elétricas - Entrada de energia																									
55	SPDA - Terminál aéreo e malha superior	14																								
56	SPDA - Caixas de inspeção e malha inferior																									
57	SPDA - Barra chata de alumínio	14																								
58	SPDA - Descidas	14																								
59	SPDA - Caixas enterradas e caixa de equipor																									
60	PSCIP - Abrigos																									
61	PSCIP - Bomba de Incêndio																									
62	PSCIP - Tubulação aço Ø65mm e conexões	12																								
63	PSCIP - Tubulação aço Ø32mm e conexões																									
64	PSCIP - Reservatório, registros e conexões																									
65	PSCIP - Recalque no passeio																									
66	PSCIP - Acionador manual de bomba de incê																									
67	PSCIP - Sinalizadores, detectores de fumaça																									
68	PSCIP - Barras anti-pânico																									
69	PSCIP - Extintores e sinalização																									
70	Revestimentos - fechamento lateral em telha				13	10																				
71	Revestimentos - paredes internas (chapisco e		11	12				13	13																	
72	Revestimentos - paredes fachada (chapisco e		12	13				11	13	14																
73	Revestimentos - paredes (revest. cerâmico)	14																								
74	Revetimentos - Pisos - Lastro	12	12	12	12	14	14			12																
75	Revestimentos - Pisos - Regularização, reves					14	14																			
76	Revestimentos - Pisos - Piso industrial em C/	11	12	11	12	14	14			10																
77	Revestimentos - Pisos - Acabamento polido	11	12	11	12	14	14																			
78	Revestimentos - Pisos - Sistema flutuante									12																
79	Revestimentos - Forro e teto																									
80	Cobertura - Treliças principais	8	7	8	7	8	7			7																
81	Cobertura - Coberturas Laterais										8	8														
82	Cobertura - Terças	8	7	8	7	8	7			7																
83	Cobertura - Contraventamento																	8	8							
85	Cobertura - Telhamento												9	9	9	9										



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ApELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	Nome DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-9P
---------------------------	---------------------	--	---	---	------------------------

Medição: **14** Período: **27/09/2024 a 30/10/2024** % Realizado Período.: **6,35%** % Realizado Acum.: **93,56%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	SETOR A	SETOR B	SETOR C	SETOR D	SETOR E	SETOR F	ACESSO	QUADRA	TIPO 1,3,E4	TIPO 2	LATERAIS (A e B)	LATERAIS (E e F)	PRINCIPAL FRENTE	PRINCIPAL FUNDOS	contraventamento	travamento do banzo inferior	ADM LOCAL - PLE 01	ADM LOCAL - PLE 02	ADM LOCAL - PLE 03	ADM LOCAL - PLE 04	ADM LOCAL - PLE 05	ADM LOCAL - PLE 06	ADM LOCAL - PLE 07	ADM LOCAL - PLE 08	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																											
86	Cobertura - Calha em chapa de aço galv.	9																									
87	Cobertura - Calha em concreto	12																									
88	Cobertura - Rufo em granito																										
89	Esquadrias - Janelas - Contramarcos		13	13			13	14																			
90	Esquadrias - Janelas - Maxim ar c/ vidros																										
91	Esquadrias - Janelas - Maxim ar veneziana		14	14			14	14																			
92	Esquadrias - Fachada em pele de vidro		12	12			14	14																			
93	Portico em ACM	14																									
94	Esquadrias - Portas																										
95	Esquadrias - Fechaduras e puxadores																										
96	Corrimão simples em aço		14	14	14	14	14	14																			
97	Guarda corpo de aço galvanizado		14	14			14	14																			
98	Guarda corpo em ACM																										
99	Barreira em aço galvanizado													14													
100	Louças																										
101	Metals e acessórios																										
102	Pintura - Paredes		14	14																							
103	Pintura - Tetos																										
104	Serviços Finais																										
105	Administração Local - Manual																			1	2	3	4	5	6	7	8

		Data das Medições											
		23/07/2024	26/09/2024	30/10/2024									
Medições		Medição 12	Medição 13	Medição 14	Medição 15	Medição 16	Medição 17	Medição 18	Medição 19	Medição 20	Medição 21	Medição 22	Medição 23
Período:	%	9,53%	2,68%	6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	2.600.395,95	731.791,51	1.733.289,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	84,52%	87,21%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%	93,56%
	R\$	23.056.018,21	23.787.809,72	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89	25.521.098,89

PATO BRANCO/PR

Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: PR-107389/D

ART/RRT: 1720230911254



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060756-29	Nº SICONV 874951	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO ARENA PATO BRANCO	NOME DA EMPRESA SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Nº CTEF 370/2022-GP
----------------------------------	----------------------------	---	--	--	-------------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	ADM LOCAL - PLE 09	ADM LOCAL - PLE 10	ADM LOCAL - PLE 11	ADM LOCAL - PLE 12	ADM LOCAL - PLE 13	ADM LOCAL - PLE 14	ADM LOCAL - PLE 15	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Serviços Preliminares																									
3	Movimentação de terra - escavação																									
4	Movimentação de terra - reaterro																									
5	Locação da obra																									
6	Fundações - Movimentação de terra - Blocos																									
7	Fundações - Movimentação de terra - Baldrames																									
8	Fundações - Estacas																									
9	Fundações - Blocos																									
10	Estrutura moldada in loco - Vigas baldrames																									
11	Estrutura moldada in loco - Pilares																									
12	Estrutura moldada in loco - Vigas																									
13	Estrutura moldada in loco - Escadas																									
14	Estrutura moldada in loco - Lajes maciças																									
15	Estrutura moldada in loco - Capa laje alveolar																									
16	Estrutura pré-moldada - Pilares																									
17	Estrutura pré-moldada - Vigas																									
18	Estrutura pré-moldada - Vigas jacaré																									
19	Estrutura pré-moldada - Laje arquibancada																									
20	Estrutura pré-moldada - Laje alveolar																									
21	Impermeabilizações																									
22	Alvenarias, vergas e contravergas																									
23	Alvenarias - peitoril em granito																									
24	Divisórias																									
25	Instalações hidrossanitárias - movimentação																									
26	Ramal de distribuição de água																									
27	Tubulação PVC soldável e registros																									
28	Bomba Centrífuga																									
29	Reservatório para armazenamento de água																									
30	Kit cavalete entrada de água																									
31	Tubulação de 40 a 100mm - Esgoto																									
32	Tubulação 150mm - Esgoto																									
33	Caixas enterradas - inc. caixa de gordura																									
34	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																									
35	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - tu																									
36	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - ca																									
37	Instalações hidrossanitárias - água pluvial - C																									
38	Instalações hidrossanitárias - Gás - Tubulaçã																									
39	Instalações elétricas - movimentação de terra																									
40	Instalações elétricas - eletrodutos e caixas ins																									
41	Instalações elétricas - conexões para eletrodu																									
42	Instalações elétricas - eletrodutos aparentes																									

Construção De Ginásio de Esportes de Pato Branco – Arena Pato Branco, localizado no imóvel urbano lote 09 – quadra 433, Marginal da BR-156 Rua Alfredo Luiz de Bortoli, nº5395, Bairro Bortot no município de Pato Branco atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.

CONTRATO Nº370/2022-GP

Relatório de Medição nº 14

Empresa Contratada: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Responsável: Sálvio Pedro Machado

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a décima quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

















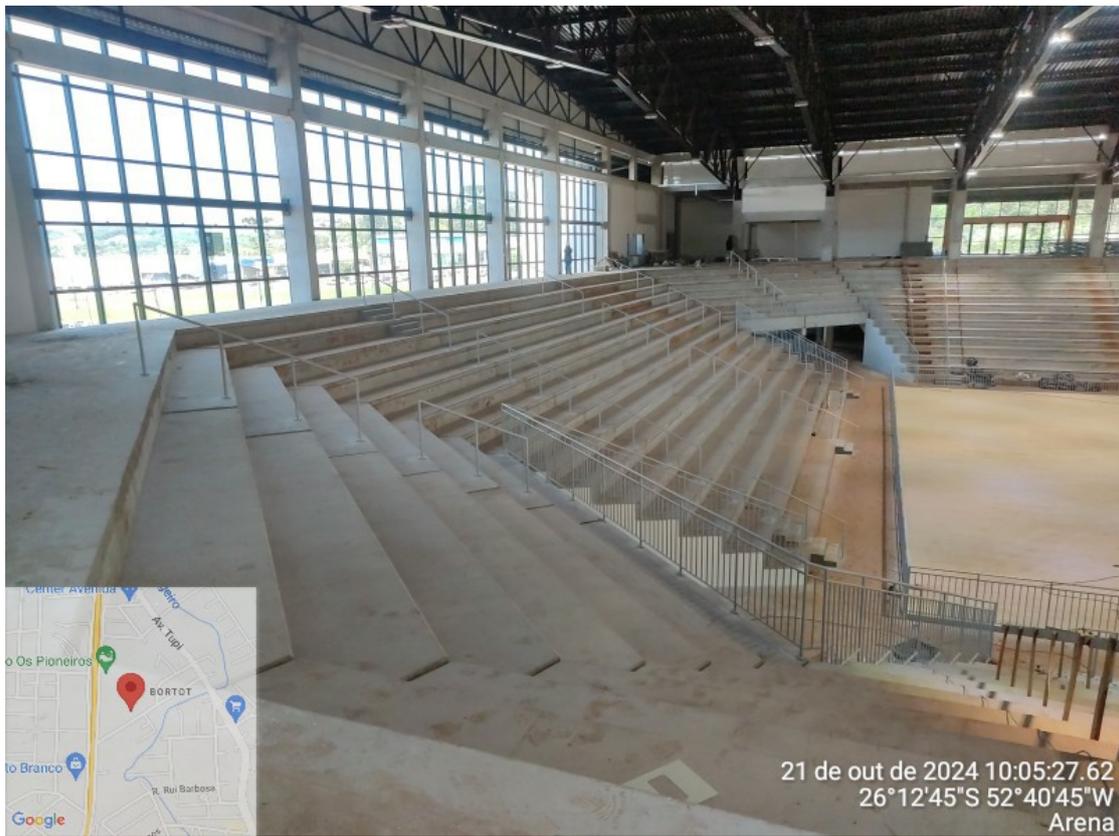

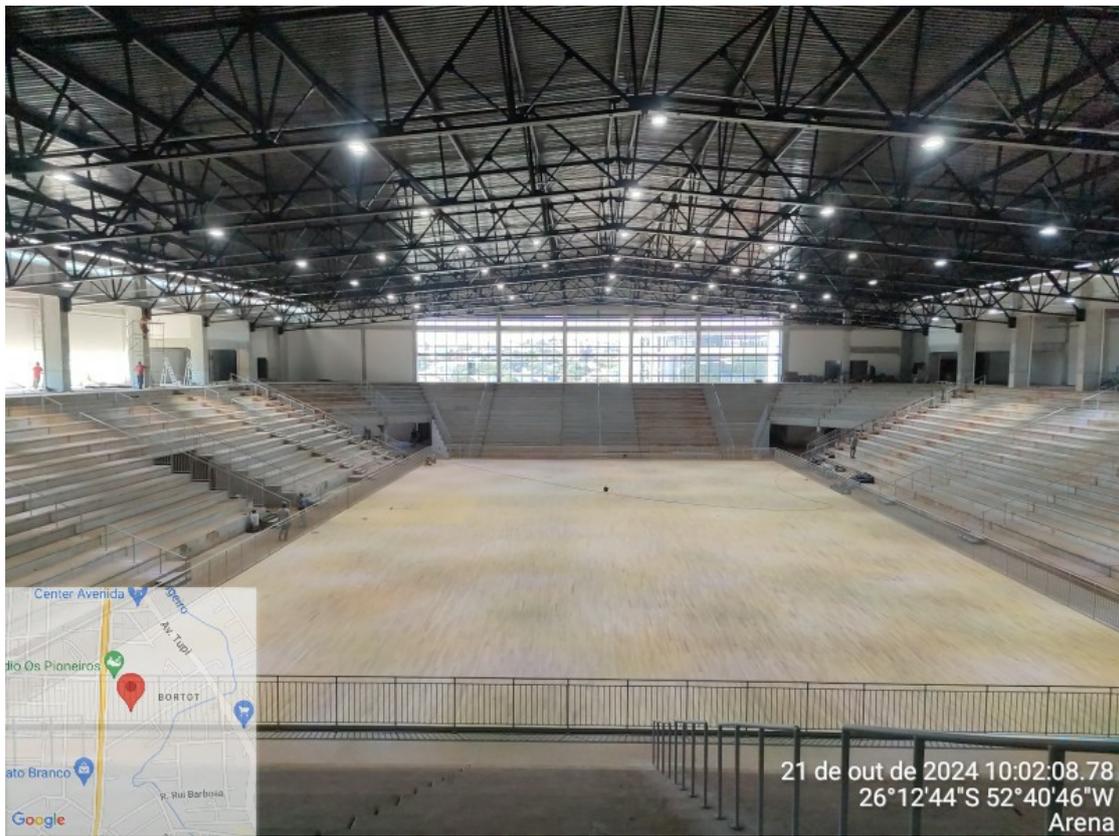



Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 1.733.289,17**.

Pato Branco, 30 de Outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 30/10/2024 17:22:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
