



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 01 de março 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura


LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 229/2022-GP


O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 767.876,56	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 23/11/2022	13,90	106.772,00	86,10	R\$ 661.104,56
A liberar 2. ^a Parcela em 13/12/2022	58,10	339.399,30	41,90	R\$ 321.705,26
A liberar 3. ^a Parcela em 23/01/2023	84,09	199.542,92	15,91	R\$ 122.162,34
A liberar 4. ^a Parcela em 01/03/2023	100,00	122.162,34	-	R\$ -

Valor a ser liberado em 01/03/2023 R\$ 122.162,34

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Seleção o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROFONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		0 TROCA DE TELHADOS	22/09/22
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.587/0001-96	(SELECIONAR)	24/01/2023 a 01/03/2023	4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:												
1. TELHADOS				TOTAL:	767.876,56	-	-	-	645.714,22	122.162,34	767.876,56	
1.1.	ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO	-	-	-	767.876,56	-	-	-	645.714,22	122.162,34	767.876,56	
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1.392,00	62,00	86.304,00	1.392,00	-	1.392,00	86.304,00	-	86.304,00	
1.1.2.	AF 07/2019											
1.1.2.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	4,00	5.568,00	1.392,00	-	1.392,00	5.568,00	-	5.568,00	
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.392,00	7,00	9.744,00	1.392,00	-	1.392,00	9.744,00	-	9.744,00	
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.392,00	225,00	313.200,00	1.392,00	-	1.392,00	313.200,00	-	313.200,00	
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	335,00	120,00	40.200,00	168,00	167,00	335,00	20.160,00	20.040,00	40.200,00	
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	415,00	75,00	31.125,00	415,00	-	415,00	31.125,00	-	31.125,00	
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	558,00	200,00	111.600,00	558,00	-	558,00	111.600,00	-	111.600,00	
1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	336,00	129,45	43.495,20	-	336,00	336,00	-	43.495,20	43.495,20	
1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 07/2020_P	M2	1.392,00	30,00	41.760,00	1.392,00	-	1.392,00	41.760,00	-	41.760,00	
1.1.10.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	114,00	86,64	9.876,96	114,00	-	114,00	9.876,96	-	9.876,96	
1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	5.600,00	1,83	10.248,00	5.600,00	-	5.600,00	10.248,00	-	10.248,00	
1.2.	FORRO DE PVC	-	-	-	60.234,10	-	-	-	1.606,96	58.627,14	60.234,10	
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	758,00	2,12	1.606,96	758,00	-	758,00	1.606,96	-	1.606,96	
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	758,00	70,03	53.082,74	-	758,00	758,00	-	53.082,74	53.082,74	
1.2.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	830,00	6,68	5.544,40	-	830,00	830,00	-	5.544,40	5.544,40	
1.3.	OUTROS	-	-	-	4.521,30	-	-	-	4.521,30	-	4.521,30	
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	93,00	9,70	902,10	93,00	-	93,00	902,10	-	902,10	
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.392,00	2,60	3.619,20	1.392,00	-	1.392,00	3.619,20	-	3.619,20	

Observações:



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	0 TROCA DE TELHADOS	22/09/22
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.587/0001-96	(SELECIONAR)	24/01/2023 a 01/03/2023	4

Orçamento Contratado					Realizado Acumulado: 100,00%		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)	
						Acum. Anterior	Acum. Incluindo o Período
						Período	Período
						Acum. Anterior	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						645.714,22	767.876,56
TOTAL:						122.162,34	767.876,56

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO

Local

quarta-feira, 1 de março de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ADERANDA PAULA DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 112602-0/D

ART/RTT: 0



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA SÃO LUIS
CONTRATO Nº229/2022/GP**

Relatório de Medição nº 04

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

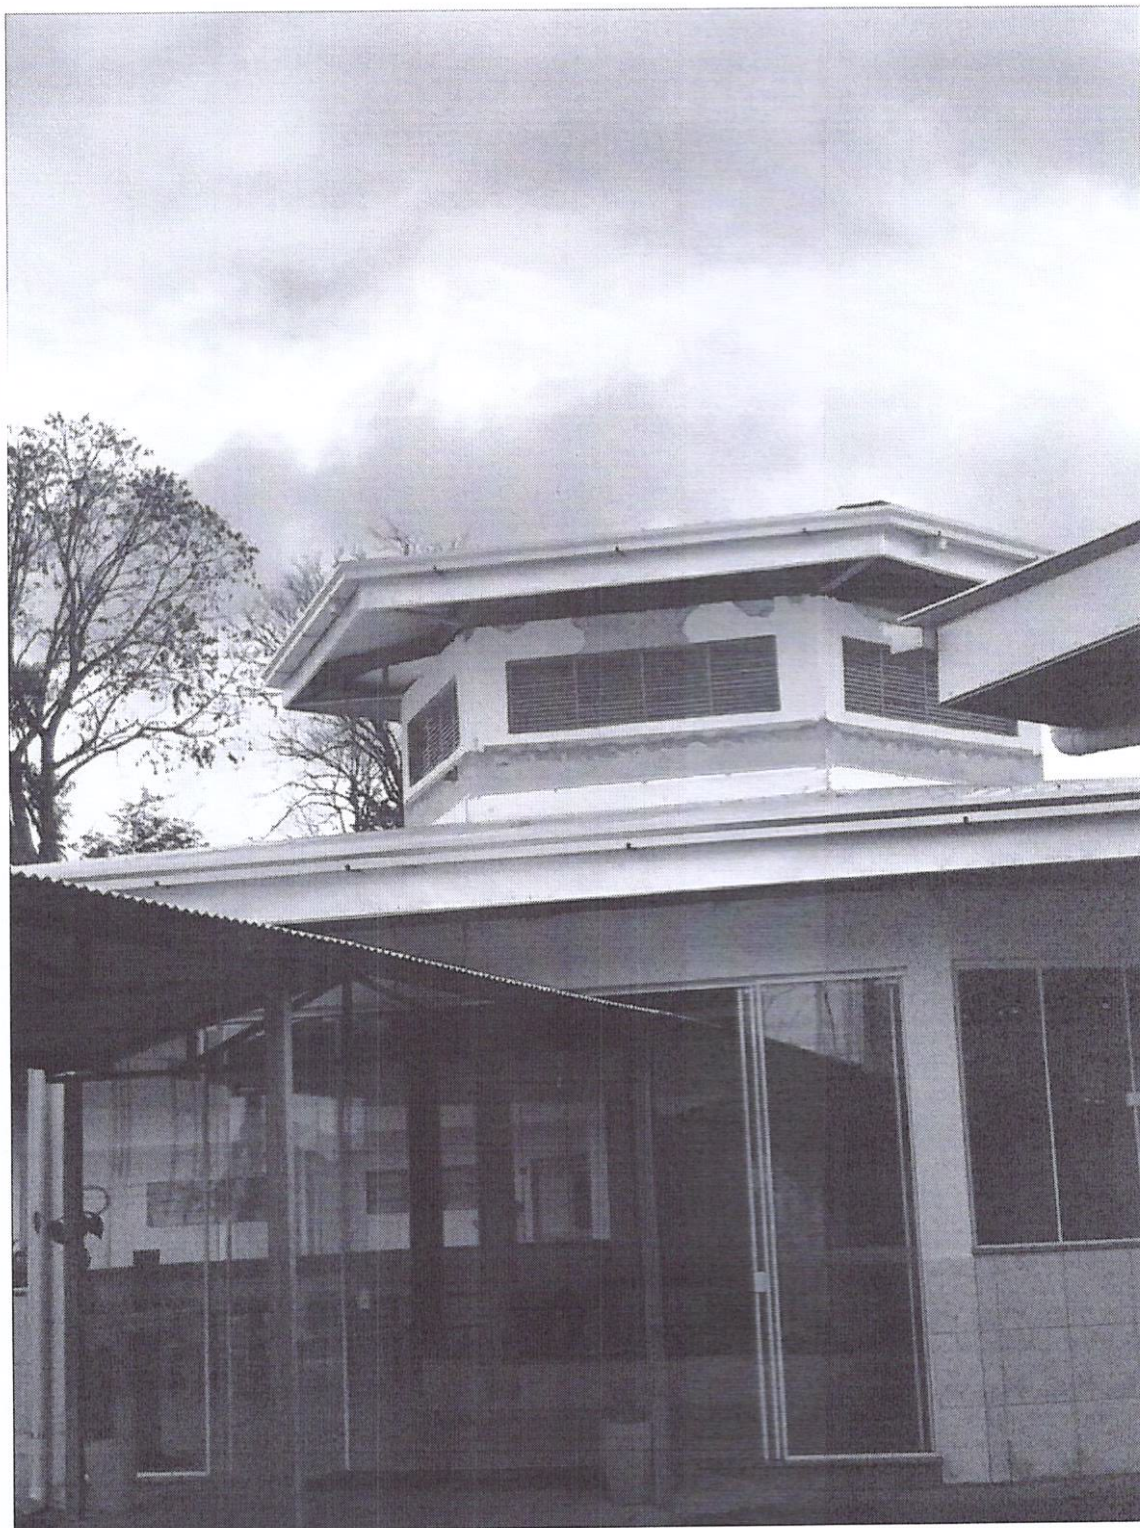
Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 122.162,34.













Pato Branco, 01 de março de 2023.

Adernanda Paula dos Santos

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
