



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 945611/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF 26/2024-GP |
|------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|

Medição: **4** Período: **15/10/2024 a 12/12/2024** % Realizado Período.: **22,44%** % Realizado Acum.: **71,16%**

| Nº do Evento | Título dos Eventos | GERAL | RUA CASTELO BRANCO | RUA DO PRÍNCIPE | RUA DOM JOÃO VI | RUA DOM PEDRO I | RUA ARASSUÁI | TRAVESSA COELHO NETO | RUA PADRE CLARET | RUA UBIRATÁ | RUA CASEMIRO DE ABREU | RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS TRAVESSA | NORMÉLIO ZANIN | RUA BRASÍLIA | RUA PEDRO CALDATO | RUA VINÍCIUS CADORIN | RUA DAS ADÁLIAS | RUA PIONEIRO ARNO BOHN | RUA JOSÉ OLDONI | RUA MARIA GRACIOSA | RUA IGUAÇU | RUA ARTIBANO SUTILE | RUA ILDA BAZZO | RUA AMAPÁ | RUA VIEIRA DA COSTA | RUA AIMORÉ |
|--------------|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|------------|
| | | Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 3 | | 2 | | 4 | | 1 | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 4 | SUB-BASE E BASE | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | | | 4 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | |
| 5 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MEIO-FIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CALÇADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medições | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 24/05/2024 | 28/08/2024 | 14/10/2024 | 12/12/2024 | | | | | | | | |
| Período: | % | 6,24% | 30,65% | 11,84% | 22,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 605.524,20 | 2.975.614,06 | 1.149.331,88 | 2.178.090,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 6,24% | 36,89% | 48,73% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% |
| | R\$ | 605.524,20 | 3.581.138,26 | 4.730.470,14 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 |

PATO BRANCO/PR
Local
quinta-feira, 12 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fernanda Zianni Manarim
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 107.389/D
ART/RRT: 1720242063725



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 945611/2023 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA | Nº CTEF 26/2024-GP |
|------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|--------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SUB-BASE E BASE | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MEIO-FIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CALÇADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Data das Medições | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medições | | Medição 1 | Medição 2 | Medição 3 | Medição 4 | Medição 5 | Medição 6 | Medição 7 | Medição 8 | Medição 9 | Medição 10 | Medição 11 | Medição 12 |
| Período: | % | 6,24% | 30,65% | 11,84% | 22,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | R\$ | 605.524,20 | 2.975.614,06 | 1.149.331,88 | 2.178.090,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acumulado: | % | 6,24% | 36,89% | 48,73% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% | 71,16% |
| | R\$ | 605.524,20 | 3.581.138,26 | 4.730.470,14 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 | 6.908.560,91 |

PATO BRANCO/PR
Local
quinta-feira, 12 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fernanda Zianni Manarim
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 107.389/D
ART/RRT: 1720242063725

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 13/12/2024 08:33:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON
CANTU:4414366
4968
Assinado de forma digital por ROBSON
CANTU:44143664968
Dados: 2024.12.13 10:54:02 -03'00'



Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 56.023,00m², através do Contrato de Repasse Nº 945611/2023, que entre si Celebram a União Federal, por Intermédio do Ministério das Cidades, Representado (a) pela Caixa Econômica Federal, e o (a) Município de Pato Branco, Objetivando a Execução De Ações Relativas a Mobilidade Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.

CONTRATO Nº26/2024/GP

Relatório de Medição nº 04

Empresa Contratada: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda

Representante da empresa: Fernando Zancanaro

Responsável técnico execução: Rodrigo Siliprandi

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:




































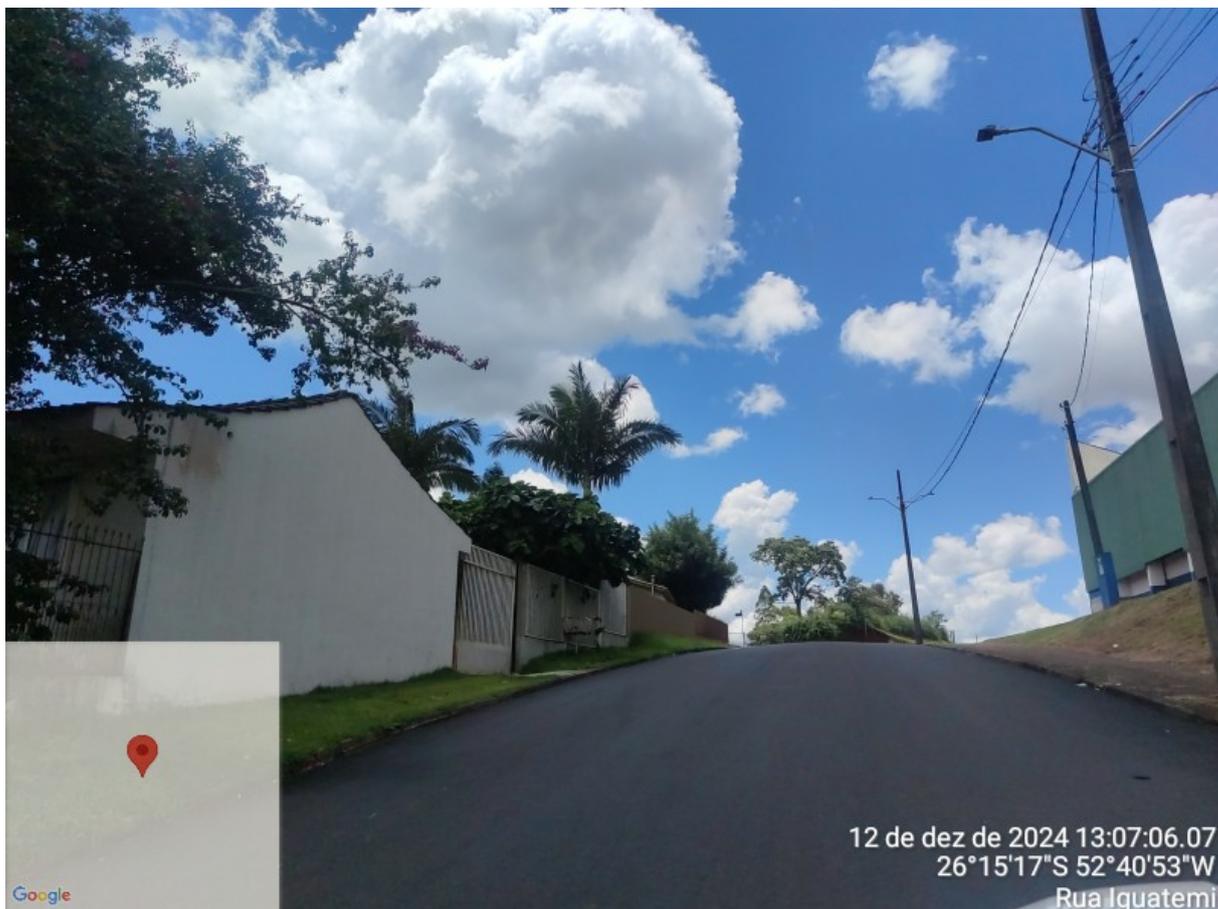



Conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, a contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT. Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de **R\$ 2.178.090,77**.

Pato Branco, 12 de Dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

FERNANDA ZIANNI MANARIM

Data: 16/12/2024 19:27:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
