



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Jul	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PRAÇA - Vila Esperança	SAM	74	PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg
FIRMA EMPREITERA:	Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado Sul Americana Ltda.	Lote	6	CONTRATO EMPREITADA:	Nº	22/2024	ORDEM DE SERVIÇO:
		Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	1.1.2		LOCACAO							-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	126,66	100,00%	0,0324	3,24%	75,90	9.613,49	9.613,49	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA							-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	83,33%	0,0325	2,71%	1.605,08	8.025,40	9.630,48	1.605,08
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0113	1,13%	3.353,10	3.353,10	3.353,10	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA							-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	435,36	100,00%	0,0007	0,07%	0,47	204,62	204,62	-
2	3		FUNDACOES							-	-	-
	3.9		RADIER / OUTROS							-	-	-
	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	103,12	100,00%	0,0013	0,13%	3,60	371,24	371,24	-
3	4		ESTRUTURAS							-	-	-
	4.4		LASTROS							-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES							-	-	-
	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,16	100,00%	0,0023	0,23%	133,53	689,01	689,01	-
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							-	-	-
	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	100,00%	0,0157	1,57%	23,23	4.646,00	4.646,00	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS							-	-	-
	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	14,83	44,49	44,49	-
	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	100,00%	0,0004	0,04%	20,90	125,40	125,40	-
	8.2.5		CABOS							-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V							-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Jul	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PRAÇA - Vila Esperança	SAM	74	PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg
FIRMA EMPREITERA:	Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado Sul Americana Ltda.	Lote	6	CONTRATO EMPREITADA:	Nº	22/2024	ORDEM DE SERVIÇO:
		Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	590,00		0,0099		4,96	-	2.926,40	2.926,40
	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00		0,0017		18,41	-	515,48	515,48
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,0004		121,18	-	121,18	121,18
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0028		816,43	-	816,43	816,43
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		70,49	-	70,49	70,49
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,0006		87,44	-	174,88	174,88
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0002		48,51	-	48,51	48,51
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	16.105.0000	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	100,00%	0,0095	0,95%	2.809,09	2.809,09	2.809,09	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	4,00	100,00%	0,0015	0,15%	111,40	445,60	445,60	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	3,89	100,00%	0,0009	0,09%	67,54	262,73	262,73	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0007		214,39	-	214,39	214,39
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00		0,0082		134,79	-	2.426,22	2.426,22
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 4 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67	UNID	16,00		0,0823		1.526,25	-	24.420,00	24.420,00
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM PROJETOES LED 200W IP-67	UNID	2,00		0,0167		2.475,41	-	4.950,82	4.950,82
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0010	0,10%	307,29	307,29	307,29	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Jul	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	PRAÇA - Vila Esperança	SAM	74	PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg
FIRMA EMPREITEIRA:	Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado Sul Americana Ltda.	Lote	6	CONTRATO EMPREITADA:	Nº	22/2024	ORDEM DE SERVIÇO:
		Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	171,70	171,70	171,70	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	105,99	105,99	105,99	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,20	100,00%	0,0002	0,02%	16,02	51,26	51,26	-
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	100,00%	0,0002	0,02%	11,18	67,08	67,08	-
	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	100,00%	0,0001	0,01%	15,44	30,88	30,88	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,90	100,00%	0,0005	0,05%	46,80	135,72	135,72	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	31,69	31,69	31,69	-
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	48,82	100,00%	0,0115	1,15%	69,57	3.396,41	3.396,41	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	50,98	100,00%	0,0131	1,31%	75,94	3.871,42	3.871,42	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	103,12	100,00%	0,0361	3,61%	103,76	10.699,73	10.699,73	-
x			SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COIADO COM COI A PU MONOCOMPONENTE	M2	103,12		0,0985		283,36	-	29.220,08	29.220,08
7	11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-				-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO		Amsop	
Mês	Jul	PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg	
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO		SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	PRAÇA - Vila Esperança		Lote	6	Nº	22/2024
FIRMA EMPREITEIRA:	Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado Sul Americana Ltda.		Ano	2024	DATA:	09/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	64,23		0,0001		0,49	-	31,47	31,47
	11.1.2		REGULARIZACAO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	170,05	100,00%	0,0017	excesso	2,91	494,83	494,83	-
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	39,52	100,00%	0,0053	0,53%	39,47	1.559,85	1.559,85	-
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	384,38	67,64%	0,0195	1,32%	15,07	3.918,20	5.792,61	1.874,41
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	172,84	100,00%	0,0132	1,32%	22,60	3.906,18	3.906,18	-
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	2,00		0,0036		539,81	-	1.079,62	1.079,62
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	36,00%	0,0099	0,36%	2.933,17	1.055,94	2.933,17	1.877,23
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	DECK ELEVADO (H=0,50M) EM MADEIRA PLÁSTICA TIPO ITAÚBA, SOBRE BARROTEAMENTO DE MADEIRA PLÁSTICA, INCLUSO 3 BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA E 27,76 METROS LINEARES DE GUARDA-CORPO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA VILA ESPERANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	96,00%	0,5514	52,93%	163.525,81	156.984,78	163.525,81	6.541,03
8	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	-
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-	-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	99,80		0,0009		2,54	-	253,49	253,49

GLOBAL - LOTE 1	% PREVIST	31,51%	% EXECUTADO :	73,30%	SOMAS	217.379,12	296.546,33	79.167,21
------------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	-------	-------------------	-------------------	------------------

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$296.546,33
	Medição Acumulada:	217.379,12
	Total Anterior:	41.865,49
	Valor Desta Medição:	R\$175.513,63

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO		Amsop	
Mês	Jul	PARCELA	2ª	DATA	29/07/2024 - seg	
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO				SAM	74
SUBPROJETO:	PRAÇA - Vila Esperança				Lote	6
FIRMA EMPREITERA:	Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado Sul Americana Ltda.				Ano	2024
CONTRATO EMPREITADA:			ORDEM DE SERVIÇO:			
Nº			22/2024			
DATA:			09/02/2024			

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado
Sul Americana Ltda.
Rodrigo Boesing
ENGº CIVIL - CREA PR-124.500/D

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: Jorge Eduardo Chioqueta
ENGº CIVIL - CREA PR-125.426/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RODRIGO
BOESING:728608
71187

Assinado de forma digital
por RODRIGO
BOESING:72860871187
Dados: 2024.08.07 15:27:14
-03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE EDUARDO CHIOQUETA
Data: 02/08/2024 15:20:49-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

ROBSON
CANTU:441436
64968

Assinado de forma digital
por ROBSON
CANTU:44143664968
Dados: 2024.08.07 16:39:37
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
 PROJETO : PRAÇA - Vila Esperança
 CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

MEDIÇÃO Nº: 2ª
 DATA DA MEDIÇÃO : 29/07/2024

EMPRESA VENCEDORA : Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado Sul Americana Ltda.
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 22/2024 DATA : 09/02/2024
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 296.546,33

PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/08/2024
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/02/2025

SAM : Nº. 74
 LOTE : Nº. 6

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
 Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	70,00%	15.961,18	92,96%	22.801,69	21.196,61
2	3	FUNDAÇÕES	50,00%	185,62	100,00%	371,24	371,24
3	4	ESTRUTURAS	60,00%	413,40	100,00%	689,01	689,01
4	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	30,00%	13.505,43	18,51%	45.018,11	8.333,31
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	15,00%	135,24	100,00%	901,61	901,61
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	20,00%	9.437,52	38,08%	47.187,64	17.967,56
7	11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	30,00%	53.797,06	93,64%	179.323,54	167.919,78
8	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		253,49	-
9			20,00%	-		-	-
10			30,00%	-		-	-
11			30,00%	-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				93.435,45		TOTAL MEDIÇÃO	217.379,12

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$175.513,63

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

RODRIGO BOESING:7286087187
 Assinado de forma digital por RODRIGO BOESING:72860871187
 Dados: 2024.08.07 15:26:07 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 gov.br JORGE EDUARDO CHIOQUETA
 Data: 02/08/2024 15:20:49-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968
 Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
 Dados: 2024.08.07 16:39:23 -03'00'

Moldasa Indústria e Comércio de Pré-Fabricado Sul Americana Ltda.
 Rodrigo Boesing
 ENG° CIVIL - CREA PR-124.500/D

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
 FISCAL: Jorge Eduardo Chioqueta
 ENG° CIVIL - CREA PR-125.426/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
 ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medicação:	74 / 6 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	MOLDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-FABRICADOS SUL
Contrato Nº:	22/2024
Data da Vistoria:	30/07/2024

Objeto:

Construção da Praça Vila Esperança, contendo: área para play-groud, área para convivência e calçadas.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **18/04/2024** até **29/07/2024**.


SERVIÇOS EXECUTADOS



13 | Placa de obra



14 | Detalhe da placa de obra

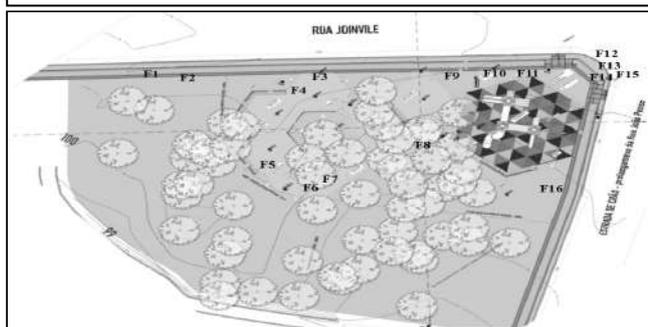

Mapa de localização das fotos



1 | container, plantio de grama



2 | deck de madeira plastica, plantio de grama



3 | deck de madeira plastica, plantio de grama



4 | deck de madeira plastica



5 | deck de madeira plastica, plantio de grama, instalação elétricas



6 | deck de madeira plastica, plantio de grama, instalação elétricas



7 | plantio de grama



8 | instalações elétricas



9 | deck de madeira plastica, plantio de grama, instalação elétricas



10 | deck de madeira plastica, plantio de grama, instalação elétrica, bebedouro, ligação do esgoto



11 | plantio de grama, instalação elétricas



12 | plantio de grama



15 | entrada de água



16 | plantio de grama

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19330/medicao/10662/relatorio-fotografico/291>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 31 de julho de 2024.

Jorge Eduardo Chioqueta
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: CREA PR 125.426/D

Documento assinado digitalmente
gov.br JORGE EDUARDO CHIOQUETA
Data: 31/07/2024 15:38:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
