



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				Mês	Ago	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	3ª	DATA	30/08/2024 - sex		
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO			SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte			Lote	4	Nº	20/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.			Ano	2024	DATA:	14/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	222,47	100,00%	0,0314	3,14%	73,50	16.351,55	16.351,55	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-					-	-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-					-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0179	1,79%	1.554,47	9.326,82	9.326,82	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-					-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0062	0,62%	3.247,38	3.247,38	3.247,38	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-					-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.100,00	100,00%	0,0010	0,10%	0,46	506,00	506,00	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-					-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-					-	-	-
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,65	100,00%	0,0003	0,03%	17,66	170,42	170,42	-
	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	67,36	100,00%	0,0006	0,06%	4,74	319,29	319,29	-
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-					-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,20	100,00%	0,0021	0,21%	13,07	1.100,49	1.100,49	-
	2.1.6		REATERRO MECANIZADO		-					-	-	-
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,91	100,00%	0,0006	0,06%	40,55	320,75	320,75	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-					-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-					-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	180,00	100,00%	0,0034	0,34%	9,89	1.780,20	1.780,20	-
	2.3.6		DRENOS COM TUBOS DE PVC		-					-	-	-
	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	56,65	100,00%	0,0062	0,62%	56,93	3.225,08	3.225,08	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-			-



ESTADO DO PARANÁ

Página 2 de 7



ESTADO DO PARANÁ

Página 3 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				Mês	Ago	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	3ª	DATA	30/08/2024 - sex		
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO			SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte			Lote	4	Nº	20/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.			Ano	2024	DATA:	14/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETOES LED 200W IP-67	UNID	6,00	100,00%	0,0305	3,05%	2.644,88	15.869,28	15.869,28	-
		COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00	100,00%	0,0060	0,60%	130,54	3.132,96	3.132,96	-
8	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS							-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-					-	-	-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-					-	-	-
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	185,79	185,79	185,79	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-					-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	297,61	297,61	297,61	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	158,71	158,71	158,71	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	102,65	102,65	102,65	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-					-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-					-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,71	100,00%	0,0006	0,06%	15,52	290,38	290,38	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-					-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	15,70	100,00%	0,0014	0,14%	45,33	711,68	711,68	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-					-	-	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	100,00%	0,0005	0,05%	31,62	252,96	252,96	-
	9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-					-	-	-
	9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-					-	-	-
	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	3,00	100,00%	0,0008	0,08%	139,86	419,58	419,58	-
	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	2,00	100,00%	0,0006	0,06%	143,33	286,66	286,66	-
	89679	SINAPI	LUBA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	9,00	100,00%	0,0023	0,23%	131,01	1.179,09	1.179,09	-
	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	284,51	284,51	284,51	-
	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	215,59	215,59	215,59	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

				Mês	Ago	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
				PARCELA	3ª	DATA		30/08/2024 - sex	
MUNICÍPIO:	PATO BRANCO			SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte			Lote	4	Nº	20/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.			Ano	2024	DATA:	14/02/2024	DATA	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-					-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM 30X35X60CM, INCLUI GRELHA DE CONCRETO FURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,40	100,00%	0,0304	3,04%	210,37	15.861,90	15.861,90	-
9	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-					-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-					-	-	-
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,75	100,00%	0,0003	0,03%	8,08	167,66	167,66	-
	10.1.3		EMBOCO		-					-	-	-
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20,75	100,00%	0,0025	0,25%	62,36	1.293,97	1.293,97	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-					-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-					-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	130,28	100,00%	0,0168	1,68%	67,37	8.776,96	8.776,96	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	74,48	100,00%	0,0105	1,05%	73,55	5.478,00	5.478,00	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-					-	-	-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	238,90	100,00%	0,0186	1,86%	40,52	9.680,22	9.680,22	-
	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	412,77	100,00%	0,0796	7,96%	100,50	41.483,39	41.483,39	-
	10.4		PINTURAS		-					-	-	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-					-	-	-
	10.4.16		PINTURA EM PISO		-					-	-	-
	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	32,02	100,00%	0,0014	0,14%	23,31	746,39	746,39	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-					-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	115,20	100,00%	0,0193	1,93%	87,28	10.054,66	10.054,66	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	64,80	100,00%	0,0135	1,35%	108,85	7.053,48	7.053,48	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DILUENTE	M2	238,90	100,00%	0,0432	4,32%	94,17	22.497,21	22.497,21	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COI ADO COM COI A PU MONOCOMPONENTE	M2	173,85	100,00%	0,0916	9,16%	274,42	47.707,92	47.707,92	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M2	22,00	100,00%	0,0070	0,70%	166,84	3.670,48	3.670,48	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ

									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
									PARCELA	3ª	DATA	30/08/2024 - sex		
									Mês	Ago				
									SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:			
									Lote	4	Nº	20/2024	ORDEM DE SERVIÇO:	
									Ano	2024	DATA:	14/02/2024	Nº	
											DATA:		DATA	
MUNICÍPIO:									PATO BRANCO					
SUBPROJETO:									PRAÇA - Novo Horizonte					
FIRMA EMPREITERA:									Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.					
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
10	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-			-		
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-			-		
	11.1.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-			-		
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	311,54	100,00%	0,0003	0,03%	0,48	149,54	149,54	-		
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-			-		
	11.2.2		PLANTAS		-				-			-		
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018	UN	8,00	100,00%	0,0017	0,17%	111,62	892,96	892,96	-		
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	430,50	100,00%	0,0121	1,21%	14,60	6.285,30	6.285,30	-		
	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	206,17	206,17	206,17	-		
	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0.60 M.AF 05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	153,16	153,16	153,16	-		
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-			-			
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 08/2017	M3	30,54	100,00%	0,0071	0,71%	121,31	3.704,81	3.704,81	-			
810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	297,00	100,00%	0,0125	1,25%	21,89	6.501,33	6.501,33	-			
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,0067	0,67%	3.505,09	3.505,09	3.505,09	-		
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	1,00	100,00%	0,0088	0,88%	4.562,24	4.562,24	4.562,24	-		
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.476,65	2.476,65	2.476,65	-		
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.476,65	2.476,65	2.476,65	-		
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4,00	100,00%	0,0040	0,40%	522,79	2.091,16	2.091,16	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MULTI CORDAS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,1817	18,17%	94.655,78	94.655,78	94.655,78	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0029	0,29%	1.515,86	1.515,86	1.515,86	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	3,00	100,00%	0,0142	1,42%	2.457,72	7.373,16	7.373,16	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0087	0,87%	4.556,48	4.556,48	4.556,48	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0055	0,55%	2.840,72	2.840,72	2.840,72	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	1,00	100,00%	0,0796	7,96%	41.482,09	41.482,09	41.482,09	-		
11	12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-			-		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-			-		
	99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	384,00	100,00%	0,0005	0,05%	0,67	257,28	257,28	-		
									-		-			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ					
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
									Mês	Ago	PARCELA	3ª	DATA	30/08/2024 - sex
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO							SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:		PRAÇA - Novo Horizonte							Lote	4	Nº	20/2024	Nº	
FIRMA EMPREITERA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.							Ano	2024	DATA:	14/02/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
										-	-	-		
GLOBAL - LOTE 1					% PREVISTO	51,28%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	521.015,31	521.015,31	-	
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$521.015,31			
									Medição Acumulada:		521.015,31			
									Total Anterior:		389.647,49			
									Valor Desta Medição:		R\$131.367,82			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														
 Documento assinado digitalmente RODRIGO PIRES FRANCO Data: 09/10/2024 11:34:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda. Rodrigo Pires Franco Arq. Urb. CAU A91039-2  Documento assinado digitalmente ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES Data: 11/10/2024 08:32:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PREF. MUN. DE PATO BRANCO FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D ROBSON CANTU:441436 64968 Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968 Dados: 2024.10.15 11:13:26 -03'00' PREFEITO DE PATO BRANCO ROBSON CANTU														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - Novo Horizonte

CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 20/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 521.015,31

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 4

MEDICÃO Nº: 3ª

DATA DA MEDIÇÃO : 30/08/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/08/2024

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/02/2025

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	29.431,75	100,00%	29.431,75	29.431,75
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	16.695,36	100,00%	16.695,36	16.695,36
3	3	FUNDACOES	100,00%	1.440,57	100,00%	1.440,57	1.440,57
4	4	ESTRUTURAS	100,00%	33.987,11	100,00%	33.987,11	33.987,11
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	45,00%	6.516,67	100,00%	14.481,51	14.481,51
6	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	100,00%	1.328,70	1.328,70
7	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	40,00%	23.642,57	100,00%	59.106,43	59.106,43
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	35,00%	7.086,48	100,00%	20.247,11	20.247,11
9	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	35,00%	55.513,61	100,00%	158.610,34	158.610,34
10	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	50,00%	92.714,57	100,00%	185.429,15	185.429,15
11	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	50,00%	128,64	100,00%	257,28	257,28
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				267.157,33	TOTAL MEDIÇÃO		521.015,31

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
29431,75	-	
16695,36	-	
1440,57	-	
33987,11	-	
14481,51	-	
1328,70	-	
48383,55	10.722,88	18,14%
20144,46	102,65	0,51%
70550,21	88.060,13	55,52%
153204,27	32.224,88	17,38%
	257,28	100,00%
	-	
OK	Parcial	
Acumulado	Destá	
Med. Anterior	Medição	
389.647,49	131.367,82	

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$131.367,82

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 09/10/2024 11:34:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 11/10/2024 08:32:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON

CANTU:44143

664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.10.15 11:14:12 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 4 / 3
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato N°:	20/2024
Data da Vistoria:	30/08/2024

Objeto:

Construção da Praça Novo Horizonte, contendo: Área de convivência, play-ground, mini-quadra de basquete, pista de caminhada, calçadas e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **26/07/2024** até **30/08/2024**.


SERVIÇOS EXECUTADOS




1 | PLACA DA OBRA




1 | DETALHE DA PLACA

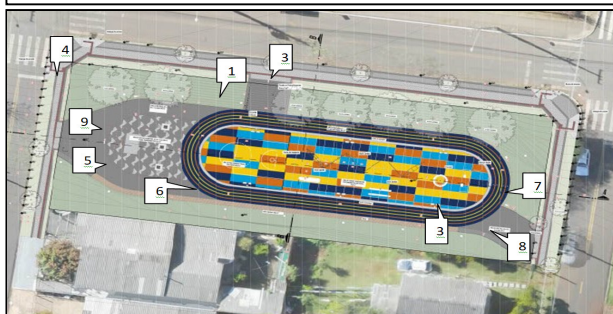

10 | Mapa

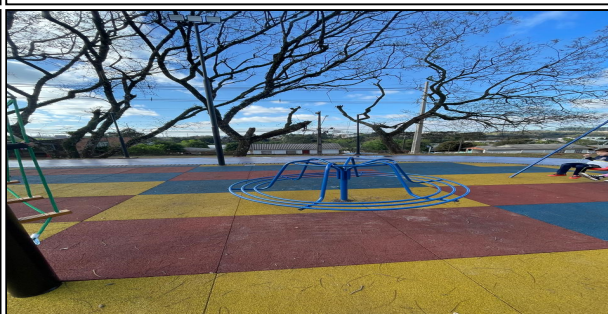

2 | CARROSEL

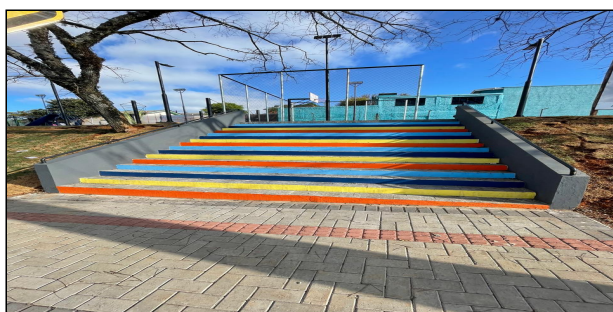


3 | ESCADARIA



4 | CALÇADAS E GRAMADO




5 | MESAS

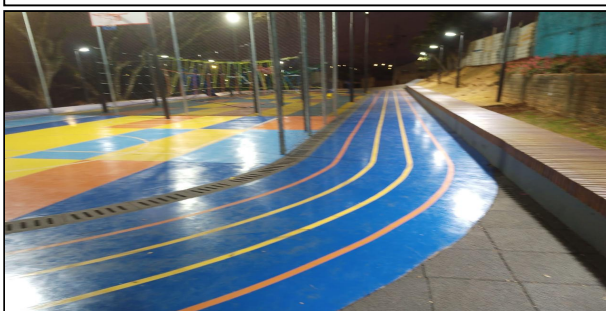

6 | BRINQUEDOS



7 | BRINQUEDOS

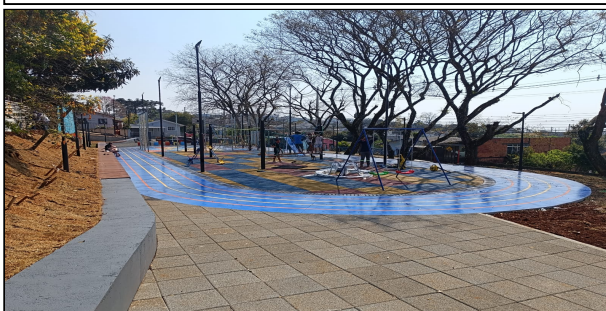

8 | BRINQUEDOS



9 | MESAS

Versão digital: <https://portal dos municipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19328/medicao/12433/relatorio-fotografico/1016>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 17 de setembro de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D

Documento assinado eletronicamente por:
Antonio Alexandre Otto Guibes (17/09/2024 16:06:43)

Nome/controle do arquivo:
2024091716064304.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024091716064304>
