



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23	
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania											
TOTAL:					1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
1.	GERAL				151.558,72	68,61	6,60	75,21	103.988,12	10.004,06	113.992,18
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				72.336,00	43,32	13,83	57,15	31.335,96	10.004,06	41.340,02
1.1.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONSIDERANDO ENGENHEIRO CIVIL 5H/SEMANAIS E ENCARREGADO MENSAL).				72.336,00	43,32	13,83	57,15	31.335,96	10.004,06	41.340,02
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				79.222,72	91,71	-	91,71	72.652,16	-	72.652,16
1.2.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1.484,99	100,00	-	100,00	1.484,99	-	1.484,99
1.2.0.0.2.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 04/2016				12.658,80	100,00	-	100,00	12.658,80	-	12.658,80
1.2.0.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016				6.582,60	100,00	-	100,00	6.582,60	-	6.582,60
1.2.0.0.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)				5.786,88	100,00	-	100,00	5.786,88	-	5.786,88
1.2.0.0.5.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)				6.570,56	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.6.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA.				242,69	100,00	-	100,00	242,69	-	242,69
1.2.0.0.7.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 50A, INCLUINDO POSTE DE CONCRETO ARMADO.				4.579,77	100,00	-	100,00	4.579,77	-	4.579,77
1.2.0.0.8.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 05/2018				41.316,43	100,00	-	100,00	41.316,43	-	41.316,43
2.	REFORMA				615.594,06	66,75	9,18	75,93	410.891,06	56.518,06	467.409,12
2.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				19.397,02	100,00	-	100,00	19.397,02	-	19.397,02
2.1.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				1.879,46	100,00	-	100,00	1.879,46	-	1.879,46
2.1.0.0.2.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				1.659,69	100,00	-	100,00	1.659,69	-	1.659,69
2.1.0.0.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				175,60	100,00	-	100,00	175,60	-	175,60
2.1.0.0.4.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				106,15	100,00	-	100,00	106,15	-	106,15
2.1.0.0.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				396,03	100,00	-	100,00	396,03	-	396,03
2.1.0.0.6.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				444,10	100,00	-	100,00	444,10	-	444,10
2.1.0.0.7.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				798,12	100,00	-	100,00	798,12	-	798,12
2.1.0.0.8.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				1.186,08	100,00	-	100,00	1.186,08	-	1.186,08
2.1.0.0.9.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				2.070,72	100,00	-	100,00	2.070,72	-	2.070,72
2.1.0.0.10.	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				1.136,05	100,00	-	100,00	1.136,05	-	1.136,05
2.1.0.0.11.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				35,64	100,00	-	100,00	35,64	-	35,64
2.1.0.0.12.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017				17,70	100,00	-	100,00	17,70	-	17,70



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.1.0.0.13.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			89,76	100,00	-	100,00	89,76	-	89,76
2.1.0.0.14.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			1,57	100,00	-	100,00	1,57	-	1,57
2.1.0.0.15.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			32,70	100,00	-	100,00	32,70	-	32,70
2.1.0.0.16.	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.			1.386,21	100,00	-	100,00	1.386,21	-	1.386,21
2.1.0.0.17.	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS/CANALETAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.			647,60	100,00	-	100,00	647,60	-	647,60
2.1.0.0.18.	REMOÇÃO DE CALHAS METÁLICAS /TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO DAS CALHAS.			552,10	100,00	-	100,00	552,10	-	552,10
2.1.0.0.19.	RETIRADA DE BEIRAL E TABEIRA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.			1.104,13	100,00	-	100,00	1.104,13	-	1.104,13
2.1.0.0.20.	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SEM REAPROVEITAMENTO.			14,26	100,00	-	100,00	14,26	-	14,26
2.1.0.0.21.	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.			144,66	100,00	-	100,00	144,66	-	144,66
2.1.0.0.22.	DEMOLIÇÃO COMPLETA DA LAVANDERIA, ANTIGA GUARITA, MURETA EXTERNA E PARTE DO MURO QUE SERÁ REFEITO, SEM REAPROVEITAMENTO.			1.203,16	100,00	-	100,00	1.203,16	-	1.203,16
2.1.0.0.23.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, CONTRAPISO E PISO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.			2.299,98	100,00	-	100,00	2.299,98	-	2.299,98
2.1.0.0.24.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL A SER REAPROVEITADO.			435,84	100,00	-	100,00	435,84	-	435,84
2.1.0.0.25.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			809,50	100,00	-	100,00	809,50	-	809,50
2.1.0.0.26.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			770,21	100,00	-	100,00	770,21	-	770,21
2.2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO			38.338,05	89,13	10,87	100,00	34.169,03	4.169,02	38.338,05
2.2.1.	Movimentação de Terra			970,41	100,00	-	100,00	970,41	-	970,41
2.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017			436,63	100,00	-	100,00	436,63	-	436,63
2.2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017			270,29	100,00	-	100,00	270,29	-	270,29
2.2.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016			263,49	100,00	-	100,00	263,49	-	263,49
2.2.2.	Sapatas			10.495,30	60,28	39,72	100,00	6.326,28	4.169,02	10.495,30
2.2.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			170,64	100,00	-	100,00	170,64	-	170,64



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento Centro de Referência em Cidadania	Início de Obra 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	Empresa Executora SJ Prestadora de Serviços	CNPJ 40.474.563/0001-36	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.2.2.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				4.169,02	-	100,00	100,00	-	4.169,02	4.169,02	
2.2.2.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				539,01	100,00	-	100,00	539,01	-	539,01	
2.2.2.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				2.060,25	100,00	-	100,00	2.060,25	-	2.060,25	
2.2.2.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				1.298,67	100,00	-	100,00	1.298,67	-	1.298,67	
2.2.2.0.6.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016				2.257,71	100,00	-	100,00	2.257,71	-	2.257,71	
2.2.3.	Vigas Baldrames				8.975,10	100,00	-	100,00	8.975,10	-	8.975,10	
2.2.3.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017				83,07	100,00	-	100,00	83,07	-	83,07	
2.2.3.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				4.168,87	100,00	-	100,00	4.168,87	-	4.168,87	
2.2.3.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				1.030,32	100,00	-	100,00	1.030,32	-	1.030,32	
2.2.3.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				1.449,21	100,00	-	100,00	1.449,21	-	1.449,21	
2.2.3.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				654,67	100,00	-	100,00	654,67	-	654,67	
2.2.3.0.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017				1.588,96	100,00	-	100,00	1.588,96	-	1.588,96	
2.2.4.	Pilares				7.692,79	100,00	-	100,00	7.692,79	-	7.692,79	
2.2.4.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				2.951,47	100,00	-	100,00	2.951,47	-	2.951,47	
2.2.4.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				1.320,35	100,00	-	100,00	1.320,35	-	1.320,35	
2.2.4.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				2.270,60	100,00	-	100,00	2.270,60	-	2.270,60	
2.2.4.0.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO -- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.				1.150,37	100,00	-	100,00	1.150,37	-	1.150,37	
2.2.5.	Vigas				10.204,45	100,00	-	100,00	10.204,45	-	10.204,45	
2.2.5.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				5.927,32	100,00	-	100,00	5.927,32	-	5.927,32	
2.2.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				1.091,87	100,00	-	100,00	1.091,87	-	1.091,87	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.2.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				1.800,06	100,00	-	100,00	1.800,06	-	1.800,06	
2.2.5.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				192,60	100,00	-	100,00	192,60	-	192,60	
2.2.5.0.5.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.				1.192,60	100,00	-	100,00	1.192,60	-	1.192,60	
2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO				2.410,64	100,00	-	100,00	2.410,64	-	2.410,64	
2.3.0.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018				2.410,64	100,00	-	100,00	2.410,64	-	2.410,64	
2.4.	PAREDES E DIVISÓRIAS				20.323,12	100,00	-	100,00	20.323,12	-	20.323,12	
2.4.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				13.153,98	100,00	-	100,00	13.153,98	-	13.153,98	
2.4.0.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				2.093,76	100,00	-	100,00	2.093,76	-	2.093,76	
2.4.0.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				1.297,78	100,00	-	100,00	1.297,78	-	1.297,78	
2.4.0.0.4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				770,99	100,00	-	100,00	770,99	-	770,99	
2.4.0.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				336,65	100,00	-	100,00	336,65	-	336,65	
2.4.0.0.6.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020				2.669,96	100,00	-	100,00	2.669,96	-	2.669,96	
2.5.	COBERTURA				173.677,27	75,12	-	75,12	130.469,54	-	130.469,54	
2.5.0.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P				38.198,20	100,00	-	100,00	38.198,20	-	38.198,20	
2.5.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				92.271,34	100,00	-	100,00	92.271,34	-	92.271,34	
2.5.0.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, PINTADO NA COR PRETA, DESENVOLVIMENTO DE 35 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.				6.413,35	-	-	-	-	-	-	
2.5.0.0.4.	BEIRAL METÁLICO LINEAR BRANCO COM JUNTA SECA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.				12.684,12	-	-	-	-	-	-	
2.5.0.0.5.	ACABAMENTO LATERAL DA COBERTURA EM CHAPA DE ACM 3MM PRETA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.				24.110,26	-	-	-	-	-	-	
2.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				58.961,61	33,96	29,25	63,21	20.025,76	17.244,56	37.270,32	
2.6.1.	Movimentação de Terra				538,40	90,00	-	90,00	484,57	-	484,57	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVICOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.6.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				129,15	90,00	-	90,00	116,24	-	116,24	
2.6.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				409,25	90,00	-	90,00	368,33	-	368,33	
2.6.2.	Água Fria				7.929,48	94,38	-	94,38	7.484,10	-	7.484,10	
2.6.2.0.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016				252,12	-	-	-	-	-	-	
2.6.2.0.2.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				193,26	-	-	-	-	-	-	
2.6.2.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				4.036,25	100,00	-	100,00	4.036,25	-	4.036,25	
2.6.2.0.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				2.042,75	100,00	-	100,00	2.042,75	-	2.042,75	
2.6.2.0.5.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021				1.327,50	100,00	-	100,00	1.327,50	-	1.327,50	
2.6.2.0.6.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				77,60	100,00	-	100,00	77,60	-	77,60	
2.6.3.	Esgoto				17.280,83	69,77	8,58	78,35	12.057,09	1.482,90	13.539,99	
2.6.3.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015				508,86	100,00	-	100,00	508,86	-	508,86	
2.6.3.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015				5.483,18	100,00	-	100,00	5.483,18	-	5.483,18	
2.6.3.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015				309,14	100,00	-	100,00	309,14	-	309,14	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento Centro de Referência em Cidadania	Início de Obra 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	Empresa Executora SJ Prestadora de Serviços	CNPJ 40.474.563/0001-36	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 8
			Período da Medição 30/08/2024 a 06/11/2024		

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.6.3.0.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_ 10/2015			5.678,31	95,00	-	95,00	5.394,39	-	5.394,39
2.6.3.0.5.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014			451,90	80,00	-	80,00	361,52	-	361,52
2.6.3.0.6.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_ 12/2020			126,78	-	-	-	-	-	-
2.6.3.0.7.	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_ 12/2020			768,26	-	-	-	-	-	-
2.6.3.0.8.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020			3.954,40	-	37,50	37,50	-	1.482,90	1.482,90
2.6.4.	Água Pluvial			33.212,90	-	47,46	47,46	-	15.761,66	15.761,66
2.6.4.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 12/2014			396,78	-	40,00	40,00	-	158,71	158,71
2.6.4.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.			4.174,49	-	40,00	40,00	-	1.669,80	1.669,80
2.6.4.0.3.	CISTERNA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 3000L, INCLUSO CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA, CONJUNTO DE SUÇÃO 2", ADAP. COM FLANGES LIVRES, FREIO D'ÁGUA, TUBULAÇÃO INTERNA E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			7.930,44	-	70,00	70,00	-	5.551,31	5.551,31
2.6.4.0.4.	FILTRO PARA SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.754,41	-	-	-	-	-	-
2.6.4.0.5.	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020			1.589,76	-	-	-	-	-	-
2.6.4.0.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO E TAMPA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PERFURADA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.			3.255,12	-	40,00	40,00	-	1.302,05	1.302,05
2.6.4.0.7.	CANALETA MEIO TUBO DE CONCRETO D:20CM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			11.720,19	-	40,00	40,00	-	4.688,08	4.688,08
2.6.4.0.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015			2.391,71	-	100,00	100,00	-	2.391,71	2.391,71
2.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/SPDA			39.708,86	84,22	0,18	84,41	33.444,48	72,31	33.516,79
2.7.1.	Movimentação de Terra			72,31	-	100,00	100,00	-	72,31	72,31
2.7.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			16,59	-	100,00	100,00	-	16,59	16,59



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.7.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016				55,72	-	100,00	100,00	-	55,72	55,72	
2.7.2.	Instalações Elétricas				37.850,70	84,41	-	84,41	31.951,15	-	31.951,15	
2.7.2.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				682,20	100,00	-	100,00	682,20	-	682,20	
2.7.2.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				477,94	100,00	-	100,00	477,94	-	477,94	
2.7.2.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				129,24	100,00	-	100,00	129,24	-	129,24	
2.7.2.0.4.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				1.400,97	100,00	-	100,00	1.400,97	-	1.400,97	
2.7.2.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020				615,15	100,00	-	100,00	615,15	-	615,15	
2.7.2.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020				5.798,40	100,00	-	100,00	5.798,40	-	5.798,40	
2.7.2.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				3.064,56	100,00	-	100,00	3.064,56	-	3.064,56	
2.7.2.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				5.301,24	100,00	-	100,00	5.301,24	-	5.301,24	
2.7.2.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				1.232,28	100,00	-	100,00	1.232,28	-	1.232,28	
2.7.2.0.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				2.964,35	100,00	-	100,00	2.964,35	-	2.964,35	
2.7.2.0.11.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				92,34	-	-	-	-	-	-	
2.7.2.0.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				262,01	-	-	-	-	-	-	
2.7.2.0.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				296,90	-	-	-	-	-	-	
2.7.2.0.14.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				145,92	-	-	-	-	-	-	
2.7.2.0.15.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				168,30	-	-	-	-	-	-	
2.7.2.0.16.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				713,88	-	-	-	-	-	-	
2.7.2.0.17.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				132,81	-	-	-	-	-	-	
2.7.2.0.18.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				95,90	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania						TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.7.2.0.19.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				16,44	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.20.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				17,23	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.21.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				149,76	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.22.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				37,44	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				82,17	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.24.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				693,76	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.25.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				86,72	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.26.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				271,05	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.27.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020				284,97	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.28.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1.355,92	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.29.	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				400,44	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.0.30.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				561,67	100,00	-	100,00	561,67	-	561,67		
2.7.2.0.31.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				2.220,56	100,00	-	100,00	2.220,56	-	2.220,56		
2.7.2.0.32.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				241,50	100,00	-	100,00	241,50	-	241,50		
2.7.2.0.33.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				472,57	100,00	-	100,00	472,57	-	472,57		
2.7.2.0.34.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				749,09	100,00	-	100,00	749,09	-	749,09		
2.7.2.0.35.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				983,65	100,00	-	100,00	983,65	-	983,65		
2.7.2.0.36.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				232,67	100,00	-	100,00	232,67	-	232,67		
2.7.2.0.37.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				32,14	100,00	-	100,00	32,14	-	32,14		
2.7.2.0.38.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021				71,22	100,00	-	100,00	71,22	-	71,22		



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23	
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.7.2.0.39.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			47,43	100,00	-	100,00	47,43	-	47,43
2.7.2.0.40.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 70 MM2, INCLUSO QUADRO DE MEDIÇÃO, POSTE DE CONCRETO E MURETA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			3.014,00	100,00	-	100,00	3.014,00	-	3.014,00
2.7.2.0.41.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			1.452,11	100,00	-	100,00	1.452,11	-	1.452,11
2.7.2.0.42.	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			206,21	100,00	-	100,00	206,21	-	206,21
2.7.2.0.43.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020			595,59	-	-	-	-	-	-
2.7.3.	Instalações de Lógica			1.785,85	83,62	-	83,62	1.493,33	-	1.493,33
2.7.3.0.1.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019			292,52	-	-	-	-	-	-
2.7.3.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			151,60	100,00	-	100,00	151,60	-	151,60
2.7.3.0.3.	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			476,10	100,00	-	100,00	476,10	-	476,10
2.7.3.0.4.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *120* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			235,92	100,00	-	100,00	235,92	-	235,92
2.7.3.0.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			515,10	100,00	-	100,00	515,10	-	515,10
2.7.3.0.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			114,61	100,00	-	100,00	114,61	-	114,61
2.8.	REVESTIMENTOS			130.393,49	85,70	11,50	97,20	111.752,48	14.991,72	126.744,20
2.8.1.	Piso			56.715,07	78,07	15,50	93,57	44.277,06	8.788,72	53.065,78
2.8.1.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			176,96	100,00	-	100,00	176,96	-	176,96
2.8.1.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017			1.338,93	100,00	-	100,00	1.338,93	-	1.338,93
2.8.1.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016			14.885,40	50,00	50,00	100,00	7.442,70	7.442,70	14.885,40
2.8.1.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021			6.987,95	100,00	-	100,00	6.987,95	-	6.987,95



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.8.1.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 06/2014				3.571,87	95,00	5,00	100,00	3.393,28	178,59	3.571,87	
2.8.1.0.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_ 06/2014				2.238,61	95,00	5,00	100,00	2.126,68	111,93	2.238,61	
2.8.1.0.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 06/2014				21.110,06	95,00	5,00	100,00	20.054,56	1.055,50	21.110,06	
2.8.1.0.8.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020				2.756,00	100,00	-	100,00	2.756,00	-	2.756,00	
2.8.1.0.9.	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.649,29	-	-	-	-	-	-	
2.8.2.	Paredes Internas				44.830,01	100,00	-	100,00	44.830,01	-	44.830,01	
2.8.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014				2.353,85	100,00	-	100,00	2.353,85	-	2.353,85	
2.8.2.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 12/2014				19.569,11	100,00	-	100,00	19.569,11	-	19.569,11	
2.8.2.0.3.	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PLACAS TIPO PORCELANATO 60X60CM ACETINADO RETIFICADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				22.907,05	100,00	-	100,00	22.907,05	-	22.907,05	
2.8.3.	Paredes Externas				10.357,13	100,00	-	100,00	10.357,13	-	10.357,13	
2.8.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				1.746,03	100,00	-	100,00	1.746,03	-	1.746,03	
2.8.3.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 06/2014				8.611,10	100,00	-	100,00	8.611,10	-	8.611,10	
2.8.4.	Forro				18.491,28	66,45	33,55	100,00	12.288,28	6.203,00	18.491,28	
2.8.4.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_ 05/2017_P				12.288,28	100,00	-	100,00	12.288,28	-	12.288,28	
2.8.4.0.2.	FORRO EM DRYWALL COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.				6.203,00	-	100,00	100,00	-	6.203,00	6.203,00	
2.9.	ESQUADRIAS				51.522,33	65,43	14,00	79,42	33.710,60	7.210,85	40.921,45	
2.9.1.	Janelas				24.913,71	100,00	(9,27)	90,73	24.913,71	(2.309,47)	22.604,24	
2.9.1.0.1.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019				2.854,62	100,00	-	100,00	2.854,62	-	2.854,62	
2.9.1.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019				6.194,47	100,00	-	100,00	6.194,47	-	6.194,47	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVICOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.9.1.0.3.	JANELA DE ALUMÍNIO COM BASE FIXA COM VIDRO ATÉ 1,00M E MAXIM-AR ATÉ 2,50M, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				13.555,15	100,00	-	100,00	13.555,15	-	13.555,15	
2.9.1.0.4.	JANELA DE ALUMÍNIO COM BASE FIXA COM VIDRO 0,50M DE ALTURA E GUILHOTINA COM 0,55M DE ALTURA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				2.309,47	100,00	(100,00)	-	2.309,47	(2.309,47)	-	
2.9.2.	Porta e Divisória de MDF				26.608,62	33,06	35,78	68,84	8.796,89	9.520,32	18.317,21	
2.9.2.0.1.	PJ2 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ALUMÍNIO PRETO, VIDROS INCLUSOS, COM MAXIM-AR SUPERIOR DE 40CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 90CM DE LARGURA E 250CM DE ALTURA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				2.411,20	100,00	-	100,00	2.411,20	-	2.411,20	
2.9.2.0.2.	PJ3 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ALUMÍNIO PRETO, VIDROS INCLUSOS, COM MAXIM-AR SUPERIOR DE 40CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 80CM DE LARGURA E 250CM DE ALTURA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.245,93	100,00	-	100,00	1.245,93	-	1.245,93	
2.9.2.0.3.	P1 - PORTA COMPENSADO NAVAL BRANCO COM ACABAMENTO INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMÍNIO, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				3.054,10	-	90,00	90,00	-	2.748,69	2.748,69	
2.9.2.0.4.	P2 - PORTA COMPENSADO NAVAL BRANCO COM ACABAMENTO INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMÍNIO, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				5.907,44	-	90,00	90,00	-	5.316,70	5.316,70	
2.9.2.0.5.	P3 - PORTA COMPENSADO NAVAL BRANCO COM ACABAMENTO INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMÍNIO, 70X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1.616,59	-	90,00	90,00	-	1.454,93	1.454,93	
2.9.2.0.6.	PE1 - PORTA DE EMERGÊNCIA 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ALUMÍNIO PRETO, VIDROS INCLUSOS, COM MAXIM-AR SUPERIOR DE 40CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 165CM DE LARGURA E 250CM DE ALTURA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				5.139,76	100,00	-	100,00	5.139,76	-	5.139,76	
2.9.2.0.7.	DIVISÓRIA COM 1 PAINEL FIXO E 4 PAINÉIS MÓVEIS COM LARGURA TOTAL DE 5,15M x ALTURA DE 2,10M EM CHAPA DE MDF FREIJÓ ESPESSURA 25MM, INCLUSO TRILHO METÁLICO SUPERIOR E INFERIOR, GUIA, ROLDANA METÁLICA, SUPORTE PARA ROLDANA E TRILHO E ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF FREIJÓ 10CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				7.233,60	-	-	-	-	-	-	
2.10.	PINTURA				27.042,50	19,19	47,44	66,63	5.188,39	12.829,60	18.017,99	
2.10.1.	Paredes Internas				10.254,66	44,30	32,00	76,30	4.542,36	3.281,88	7.824,24	
2.10.1.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014				1.136,55	100,00	-	100,00	1.136,55	-	1.136,55	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.10.1.0.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			4.257,26	80,00	20,00	100,00	3.405,81	851,45	4.257,26
2.10.1.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			4.860,85	-	50,00	50,00	-	2.430,43	2.430,43
2.10.2.	Paredes Externas			7.240,12	8,92	-	8,92	646,03	-	646,03
2.10.2.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018			891,49	-	-	-	-	-	-
2.10.2.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014			646,03	100,00	-	100,00	646,03	-	646,03
2.10.2.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017			3.497,84	-	-	-	-	-	-
2.10.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			2.204,76	-	-	-	-	-	-
2.10.3.	Teto e Forro			9.547,72	-	100,00	100,00	-	9.547,72	9.547,72
2.10.3.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			845,71	-	100,00	100,00	-	845,71	845,71
2.10.3.0.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			4.465,21	-	100,00	100,00	-	4.465,21	4.465,21
2.10.3.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			4.236,80	-	100,00	100,00	-	4.236,80	4.236,80
2.11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			49.586,24	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.1.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA PIA DE COZINHA/TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			9.029,94	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.2.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1.323,81	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.3.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL GRANDE 56X33X12 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			466,64	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.4.	DIVISÓRIA DE ACRÍLICO 60X60 CM SOBRE BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			708,60	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.5.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			478,68	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.6.	COIFA EM AÇO INÓX 100X140 CM COM SAÍDA 12" E CHAMINÉ COM 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			10.850,40	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.7.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			3.840,96	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.8.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			886,35	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.9.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1.384,78	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.10.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			2.411,20	-	-	-	-	-	-
2.11.0.0.11.	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (220 V) 7500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			600,18	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.11.0.0.12.	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM PORTA DE CORRER 185 X 210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3.375,68	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.13.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				241,04	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.14.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				150,62	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.15.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				210,90	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.16.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				482,08	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.17.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020				6.946,25	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.18.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				168,76	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.19.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020				333,90	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.20.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				344,85	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.21.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				275,88	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.22.	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1.710,14	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.23.	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				272,70	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.24.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				930,60	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.25.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				196,60	-	-	-	-	-	-	
2.11.0.0.26.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA				1.964,70	-	-	-	-	-	-	
2.12.	PSCIP				1.864,72	-	-	-	-	-	-	
2.12.0.0.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				246,82	-	-	-	-	-	-	
2.12.0.0.2.	EXTINTOR DE PÔ QUÍMICO ABC 4KG - 2A - 20B:C COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				1.231,35	-	-	-	-	-	-	
2.12.0.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				236,70	-	-	-	-	-	-	
2.12.0.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				149,85	-	-	-	-	-	-	
2.13.	SERVIÇOS FINAIS				2.368,21	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
2.13.0.0.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019			1.362,20	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019			316,68	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.3.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019			388,91	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.4.	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019			41,72	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.5.	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019			32,50	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.6.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019			26,00	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.7.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019			116,30	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.8.	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019			62,98	-	-	-	-	-	-
2.13.0.0.9.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019			20,92	-	-	-	-	-	-
3.	AMPLIAÇÃO			442.870,12	53,79	19,59	73,39	238.232,85	86.779,20	325.012,05
3.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			11.377,46	100,00	-	100,00	11.377,46	-	11.377,46
3.1.0.0.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			105,66	100,00	-	100,00	105,66	-	105,66
3.1.0.0.2.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			192,79	100,00	-	100,00	192,79	-	192,79
3.1.0.0.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			346,48	100,00	-	100,00	346,48	-	346,48
3.1.0.0.4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			640,55	100,00	-	100,00	640,55	-	640,55
3.1.0.0.5.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			1.376,96	100,00	-	100,00	1.376,96	-	1.376,96
3.1.0.0.6.	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			908,84	100,00	-	100,00	908,84	-	908,84
3.1.0.0.7.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			14,96	100,00	-	100,00	14,96	-	14,96
3.1.0.0.8.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			1,57	100,00	-	100,00	1,57	-	1,57
3.1.0.0.9.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			32,70	100,00	-	100,00	32,70	-	32,70
3.1.0.0.10.	RETIRADA DE BEIRAL E TABEIRA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.			1.071,71	100,00	-	100,00	1.071,71	-	1.071,71
3.1.0.0.11.	DEMOLIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, EXCETO A RETIRADA DE PORTAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS, LUMINÁRIAS, FORRO, BEIRAL, ESTRUTURA DE FORRO E BEIRAL, TELHAMENTO E ESTRUTURA DA COBERTURA.			5.496,32	100,00	-	100,00	5.496,32	-	5.496,32
3.1.0.0.12.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL A SER REAPROVEITADO.			168,27	100,00	-	100,00	168,27	-	168,27
3.1.0.0.13.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			535,83	100,00	-	100,00	535,83	-	535,83



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVICOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.1.0.0.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			484,82	100,00	-	100,00	484,82	-	484,82
3.2.	LOCAÇÃO DA OBRA			3.199,89	100,00	-	100,00	3.199,89	-	3.199,89
3.2.0.0.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018			3.199,89	100,00	-	100,00	3.199,89	-	3.199,89
3.3.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO			77.520,94	100,00	-	100,00	77.520,94	-	77.520,94
3.3.1.	Movimentação de Terra			1.362,30	100,00	-	100,00	1.362,30	-	1.362,30
3.3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			546,89	100,00	-	100,00	546,89	-	546,89
3.3.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			441,48	100,00	-	100,00	441,48	-	441,48
3.3.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			373,93	100,00	-	100,00	373,93	-	373,93
3.3.2.	Sapatas			12.040,65	100,00	-	100,00	12.040,65	-	12.040,65
3.3.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			211,05	100,00	-	100,00	211,05	-	211,05
3.3.2.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			4.400,44	100,00	-	100,00	4.400,44	-	4.400,44
3.3.2.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			548,55	100,00	-	100,00	548,55	-	548,55
3.3.2.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			2.412,00	100,00	-	100,00	2.412,00	-	2.412,00
3.3.2.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			1.060,28	100,00	-	100,00	1.060,28	-	1.060,28
3.3.2.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			381,48	100,00	-	100,00	381,48	-	381,48
3.3.2.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			155,62	100,00	-	100,00	155,62	-	155,62
3.3.2.0.8.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016			2.871,23	100,00	-	100,00	2.871,23	-	2.871,23
3.3.3.	Vigas Baldrame			17.450,93	100,00	-	100,00	17.450,93	-	17.450,93
3.3.3.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			134,71	100,00	-	100,00	134,71	-	134,71
3.3.3.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			7.910,14	100,00	-	100,00	7.910,14	-	7.910,14
3.3.3.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			1.972,40	100,00	-	100,00	1.972,40	-	1.972,40
3.3.3.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			2.078,34	100,00	-	100,00	2.078,34	-	2.078,34
3.3.3.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			1.291,55	100,00	-	100,00	1.291,55	-	1.291,55
3.3.3.0.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			719,58	100,00	-	100,00	719,58	-	719,58



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVICOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.3.3.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				405,18	100,00	-	100,00	405,18	-	405,18	
3.3.3.0.8.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017				2.939,03	100,00	-	100,00	2.939,03	-	2.939,03	
3.3.4.	Pilares				8.960,46	100,00	-	100,00	8.960,46	-	8.960,46	
3.3.4.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				3.262,38	100,00	-	100,00	3.262,38	-	3.262,38	
3.3.4.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				1.440,60	100,00	-	100,00	1.440,60	-	1.440,60	
3.3.4.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				1.994,94	100,00	-	100,00	1.994,94	-	1.994,94	
3.3.4.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				717,84	100,00	-	100,00	717,84	-	717,84	
3.3.4.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				273,23	100,00	-	100,00	273,23	-	273,23	
3.3.4.0.6.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.				1.271,47	100,00	-	100,00	1.271,47	-	1.271,47	
3.3.5.	Vigas				22.345,02	100,00	-	100,00	22.345,02	-	22.345,02	
3.3.5.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				13.356,48	100,00	-	100,00	13.356,48	-	13.356,48	
3.3.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				2.145,26	100,00	-	100,00	2.145,26	-	2.145,26	
3.3.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				500,92	100,00	-	100,00	500,92	-	500,92	
3.3.5.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				2.109,45	100,00	-	100,00	2.109,45	-	2.109,45	
3.3.5.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				1.291,68	100,00	-	100,00	1.291,68	-	1.291,68	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.3.5.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			1.096,66	100,00	-	100,00	1.096,66	-	1.096,66
3.3.5.0.7.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			1.844,57	100,00	-	100,00	1.844,57	-	1.844,57
3.3.6.	Lajes			15.361,58	100,00	-	100,00	15.361,58	-	15.361,58
3.3.6.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022			8.093,52	100,00	-	100,00	8.093,52	-	8.093,52
3.3.6.0.2.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			3.410,14	100,00	-	100,00	3.410,14	-	3.410,14
3.3.6.0.3.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			3.857,92	100,00	-	100,00	3.857,92	-	3.857,92
3.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO			15.869,52	21,63	39,19	60,81	3.432,55	6.218,49	9.651,04
3.4.0.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018			3.432,55	100,00	-	100,00	3.432,55	-	3.432,55
3.4.0.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, INCLUINDO CONTRAPISO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, E=3MM E E=4MM (MANTA INFERIOR DE SACRIFÍCIO E SUPERIOR ALUMINIZADA ANTIRAIZ), PLACA DE ISOPOR DE ALTA DENSIDADE COM 25MM DE ESPESSURA, MANTA GEOTÊXTIL E ARGILA EXPANDIDA, CONFORME DETALHE EM PROJETO			12.436,97	-	50,00	50,00	-	6.218,49	6.218,49
3.5.	PAREDES E DIVISÓRIAS			19.547,27	100,00	-	100,00	19.547,27	-	19.547,27
3.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			14.836,21	100,00	-	100,00	14.836,21	-	14.836,21
3.5.0.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			2.244,21	100,00	-	100,00	2.244,21	-	2.244,21
3.5.0.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			664,87	100,00	-	100,00	664,87	-	664,87
3.5.0.0.4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			387,92	100,00	-	100,00	387,92	-	387,92
3.5.0.0.5.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020			1.414,06	100,00	-	100,00	1.414,06	-	1.414,06
3.6.	COBERTURA			83.855,57	65,52	-	65,52	54.938,68	-	54.938,68
3.6.0.0.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P			14.432,40	100,00	-	100,00	14.432,40	-	14.432,40
3.6.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			40.506,28	100,00	-	100,00	40.506,28	-	40.506,28



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVICOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.6.0.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, PINTADO NA COR PRETA, DESENVOLVIMENTO DE 35 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			3.935,20	-	-	-	-	-	-
3.6.0.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, PINTADO NA COR PRETA, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			3.291,65	-	-	-	-	-	-
3.6.0.0.5.	BEIRAL METÁLICO LINEAR BRANCO COM JUNTA SECA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.			6.073,50	-	-	-	-	-	-
3.6.0.0.6.	ACABAMENTO LATERAL DA COBERTURA EM CHAPA DE ACM 3MM PRETA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			15.616,54	-	-	-	-	-	-
3.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			18.456,45	15,73	26,82	42,55	2.903,27	4.949,78	7.853,05
3.7.1.	Movimentação de Terra			132,74	80,01	-	80,01	106,20	-	106,20
3.7.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			33,17	80,00	-	80,00	26,54	-	26,54
3.7.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			99,57	80,00	-	80,00	79,66	-	79,66
3.7.2.	Água Fria			1.384,07	100,00	-	100,00	1.384,07	-	1.384,07
3.7.2.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			424,49	100,00	-	100,00	424,49	-	424,49
3.7.2.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			959,58	100,00	-	100,00	959,58	-	959,58
3.7.3.	Esgoto			2.080,54	67,92	-	67,92	1.413,00	-	1.413,00
3.7.3.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			127,22	95,00	-	95,00	120,86	-	120,86
3.7.3.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015			648,84	95,00	-	95,00	616,40	-	616,40
3.7.3.0.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			711,30	95,00	-	95,00	675,74	-	675,74



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.7.3.0.4.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			90,38	-	-	-	-	-	-
3.7.3.0.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			502,80	-	-	-	-	-	-
3.7.4.	Água Pluvial			14.859,10	-	33,31	33,31	-	4.949,78	4.949,78
3.7.4.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014			688,61	-	50,00	50,00	-	344,31	344,31
3.7.4.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.			2.958,30	-	50,00	50,00	-	1.479,15	1.479,15
3.7.4.0.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO E TAMPA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PERFURADA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.			3.396,39	-	-	-	-	-	-
3.7.4.0.4.	CANALETA MEIO TUBO DE CONCRETO D:20CM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			7.815,80	-	40,00	40,00	-	3.126,32	3.126,32
3.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/SPDA			18.302,06	44,56	-	44,56	8.155,53	-	8.155,53
3.8.1.	Movimentação de Terra			46,49	100,00	-	100,00	46,49	-	46,49
3.8.1.0.1.	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			10,56	100,00	-	100,00	10,56	-	10,56
3.8.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			35,93	100,00	-	100,00	35,93	-	35,93
3.8.2.	Instalações Elétricas			17.067,31	42,26	-	42,26	7.213,30	-	7.213,30
3.8.2.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			379,00	100,00	-	100,00	379,00	-	379,00
3.8.2.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			187,02	100,00	-	100,00	187,02	-	187,02
3.8.2.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			272,84	100,00	-	100,00	272,84	-	272,84
3.8.2.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			27,81	100,00	-	100,00	27,81	-	27,81
3.8.2.0.5.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			940,95	100,00	-	100,00	940,95	-	940,95
3.8.2.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			3.390,91	-	-	-	-	-	-
3.8.2.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			2.470,42	70,00	-	70,00	1.729,29	-	1.729,29



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.8.2.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				4.156,33	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.9.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				46,17	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.10.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				74,86	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				178,14	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				119,80	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.13.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				63,79	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.14.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				145,92	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.15.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				213,42	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.16.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				168,30	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.17.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				555,24	-	-	-	-	-	-	
3.8.2.0.18.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				340,55	100,00	-	100,00	340,55	-	340,55	
3.8.2.0.19.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				2.362,76	100,00	-	100,00	2.362,76	-	2.362,76	
3.8.2.0.20.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				568,34	100,00	-	100,00	568,34	-	568,34	
3.8.2.0.21.	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				206,21	100,00	-	100,00	206,21	-	206,21	
3.8.2.0.22.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020				198,53	100,00	-	100,00	198,53	-	198,53	
3.8.3.	Instalações de Lógica				1.188,26	75,38	-	75,38	895,74	-	895,74	
3.8.3.0.1.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019				292,52	-	-	-	-	-	-	
3.8.3.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				37,90	100,00	-	100,00	37,90	-	37,90	
3.8.3.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				41,56	100,00	-	100,00	41,56	-	41,56	
3.8.3.0.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				14,36	100,00	-	100,00	14,36	-	14,36	
3.8.3.0.5.	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *120* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				235,92	100,00	-	100,00	235,92	-	235,92	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento Centro de Referência em Cidadania	Início de Obra 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	Empresa Executora SJ Prestadora de Serviços	CNPJ 40.474.563/0001-36	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 8
			Período da Medição 30/08/2024 a 06/11/2024		

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania					TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.8.3.0.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				566,00	100,00	-	100,00	566,00	-	566,00	
3.9.	REVESTIMENTOS				104.750,64	53,92	21,14	75,06	56.484,99	22.141,07	78.626,06	
3.9.1.	Piso				46.322,30	45,26	44,29	89,55	20.966,27	20.517,12	41.483,39	
3.9.1.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021				138,63	100,00	-	100,00	138,63	-	138,63	
3.9.1.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017				1.048,77	100,00	-	100,00	1.048,77	-	1.048,77	
3.9.1.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016				11.680,55	100,00	-	100,00	11.680,55	-	11.680,55	
3.9.1.0.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021				4.887,58	100,00	-	100,00	4.887,58	-	4.887,58	
3.9.1.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014				3.304,53	-	100,00	100,00	-	3.304,53	3.304,53	
3.9.1.0.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014				17.212,59	-	100,00	100,00	-	17.212,59	17.212,59	
3.9.1.0.7.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020				3.210,74	100,00	-	100,00	3.210,74	-	3.210,74	
3.9.1.0.8.	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				4.838,91	-	-	-	-	-	-	
3.9.2.	Paredes Internas				23.954,56	58,36	4,01	62,37	13.980,30	959,72	14.940,02	
3.9.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				1.212,13	100,00	-	100,00	1.212,13	-	1.212,13	
3.9.2.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014				8.929,29	100,00	-	100,00	8.929,29	-	8.929,29	
3.9.2.0.3.	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PLACAS TIPO PORCELANATO 60X60CM ACETINADO RETIFICADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				4.798,60	80,00	20,00	100,00	3.838,88	959,72	4.798,60	
3.9.2.0.4.	REVESTIMENTO DE PAREDE EM TIJOLINHO NATURAL RÚSTICO 25X7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				9.014,54	-	-	-	-	-	-	
3.9.3.	Paredes Externas				23.559,65	47,91	-	47,91	11.288,52	-	11.288,52	
3.9.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				2.096,82	100,00	-	100,00	2.096,82	-	2.096,82	
3.9.3.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014				9.191,70	100,00	-	100,00	9.191,70	-	9.191,70	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23	
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.9.3.0.3.	REVESTIMENTO DE PAREDE EM TIJOLINHO NATURAL RÚSTICO 25X7 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			12.271,13	-	-	-	-	-	-
3.9.4.	Forro			10.914,13	93,91	6,09	100,00	10.249,90	664,23	10.914,13
3.9.4.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P			10.249,90	100,00	-	100,00	10.249,90	-	10.249,90
3.9.4.0.2.	FORRO EM DRYWALL COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.			664,23	-	100,00	100,00	-	664,23	664,23
3.10.	ESQUADRIAS			58.178,93	-	74,20	74,20	-	43.168,30	43.168,30
3.10.1.	Janelas			49.684,27	-	76,52	76,52	-	38.020,66	38.020,66
3.10.1.0.1.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			4.731,89	-	100,00	100,00	-	4.731,89	4.731,89
3.10.1.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			4.505,07	-	100,00	100,00	-	4.505,07	4.505,07
3.10.1.0.3.	JANELA DE ALUMÍNIO COM BASE FIXA COM VIDRO ATÉ 1,00M E MAXIM-AR ATÉ 2,50M, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			28.783,70	-	100,00	100,00	-	28.783,70	28.783,70
3.10.1.0.4.	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			11.663,61	-	-	-	-	-	-
3.10.2.	Porta e Divisória de MDF			8.494,66	-	60,60	60,60	-	5.147,64	5.147,64
3.10.2.0.1.	PJ1 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ALUMÍNIO PRETO, VIDROS INCLUSOS, COM MAXIM-AR SUPERIOR DE 40CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 100CM DE LARGURA E 250CM DE ALTURA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			3.978,48	-	66,66	66,66	-	2.652,05	2.652,05
3.10.2.0.2.	PJ3 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ALUMÍNIO PRETO, VIDROS INCLUSOS, COM MAXIM-AR SUPERIOR DE 40CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 80CM DE LARGURA E 250CM DE ALTURA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			1.245,93	-	-	-	-	-	-
3.10.2.0.3.	P1 - PORTA COMPENSADO NAVAL BRANCO COM ACABAMENTO INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMÍNIO, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			2.772,88	-	90,00	90,00	-	2.495,59	2.495,59
3.10.2.0.4.	DIVISÓRIA FIXA EM CHAPA DE MDF FREIJÓ ESPESSURA 25MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			497,37	-	-	-	-	-	-
3.11.	PINTURA			19.847,75	3,39	51,90	55,29	672,27	10.301,56	10.973,83
3.11.1.	Paredes Internas			5.876,38	6,01	72,61	78,61	352,88	4.266,65	4.619,53
3.11.1.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			588,14	60,00	40,00	100,00	352,88	235,26	588,14
3.11.1.0.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			2.774,54	-	100,00	100,00	-	2.774,54	2.774,54
3.11.1.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			2.513,70	-	50,00	50,00	-	1.256,85	1.256,85
3.11.2.	Paredes Externas			6.978,19	4,58	3,05	7,63	319,39	212,93	532,32



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.11.2.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018			648,35	-	-	-	-	-	-
3.11.2.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014			532,32	60,00	40,00	100,00	319,39	212,93	532,32
3.11.2.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017			3.436,76	-	-	-	-	-	-
3.11.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			2.360,76	-	-	-	-	-	-
3.11.3.	Teto e Forro			6.993,18	-	83,25	83,25	-	5.821,98	5.821,98
3.11.3.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			446,67	-	100,00	100,00	-	446,67	446,67
3.11.3.0.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			3.137,59	-	100,00	100,00	-	3.137,59	3.137,59
3.11.3.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			2.237,72	-	100,00	100,00	-	2.237,72	2.237,72
3.11.3.0.4.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ACRÍLICO PARA CONCRETO APARENTE 3 DEMÃOS.			1.171,20	-	-	-	-	-	-
3.12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			9.366,95	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.1.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			564,39	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.2.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			177,27	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.3.	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			1.361,41	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.4.	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (220 V) 7500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			300,09	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.5.	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM PORTA DE CORRER 194X 210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.112,08	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.6.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			120,52	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			150,62	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.8.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			210,90	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.9.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			241,04	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.10.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, 1 1/2", COMPRIMENTO 130 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			195,84	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.11.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			1.230,71	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.12.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020			1.629,20	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23	
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
3.12.0.0.13.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020			84,38	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.14.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020			66,78	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.15.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			68,97	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.16.	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			68,97	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.17.	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020			90,90	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.18.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021			103,40	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.19.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021			98,30	-	-	-	-	-	-
3.12.0.0.20.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA			491,18	-	-	-	-	-	-
3.13.	PSCIP			953,40	-	-	-	-	-	-
3.13.0.0.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020			211,56	-	-	-	-	-	-
3.13.0.0.2.	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - 2A - 20B:C COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			492,54	-	-	-	-	-	-
3.13.0.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			189,36	-	-	-	-	-	-
3.13.0.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			59,94	-	-	-	-	-	-
3.14.	SERVIÇOS FINAIS			1.643,29	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_ 04/2019			1.067,14	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.2.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_ 04/2019			54,66	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.3.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_ 04/2019			205,41	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.4.	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_ 04/2019			6,50	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.5.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_ 04/2019			6,50	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.6.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_ 04/2019			257,86	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.7.	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_ 04/2019			40,57	-	-	-	-	-	-
3.14.0.0.8.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_ 04/2019			4,65	-	-	-	-	-	-
4.	EXTERNO			237.446,65	21,00	23,98	44,98	49.868,78	56.945,84	106.814,62
4.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			9.099,31	87,72	11,30	99,02	7.982,09	1.028,49	9.010,58
4.1.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017			2.666,98	100,00	-	100,00	2.666,98	-	2.666,98
4.1.0.0.2.	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME E MOURÕES DE CONCRETO E PORTÕES, COM REAPROVEITAMENTO DOS MOURÕES.			1.520,99	100,00	-	100,00	1.520,99	-	1.520,99



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.1.0.0.3.	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO, COM EMPILHAMENTO E REAPROVEITAMENTO.			1.986,75	50,00	50,00	100,00	993,38	993,37	1.986,75
4.1.0.0.4.	REMOÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COMPLETO, INCLUSIVE RETIRADA DO POSTE E DEMOLIÇÃO DA MURETA DE ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DO POSTE.			88,73	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.5.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, CONTRAPISO E PISO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.			1.204,08	100,00	-	100,00	1.204,08	-	1.204,08
4.1.0.0.6.	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO.			35,12	-	100,00	100,00	-	35,12	35,12
4.1.0.0.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL A SER REAPROVEITADO.			1.176,78	100,00	-	100,00	1.176,78	-	1.176,78
4.1.0.0.8.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			95,16	100,00	-	100,00	95,16	-	95,16
4.1.0.0.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			324,72	100,00	-	100,00	324,72	-	324,72
4.2.	CENTRAL GLP, LIXEIRA E ESCADA			83.056,07	12,56	54,06	66,63	10.434,36	44.901,86	55.336,22
4.2.1.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO			35.644,45	29,27	70,73	100,00	10.434,36	25.210,09	35.644,45
4.2.1.1.	Movimentação de Terra			875,13	50,00	50,00	100,00	437,57	437,56	875,13
4.2.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			602,02	50,00	50,00	100,00	301,01	301,01	602,02
4.2.1.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			120,45	50,00	50,00	100,00	60,23	60,22	120,45
4.2.1.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			152,66	50,00	50,00	100,00	76,33	76,33	152,66
4.2.1.2.	Sapatas			13.443,60	30,00	70,00	100,00	4.033,08	9.410,52	13.443,60
4.2.1.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			161,65	30,00	70,00	100,00	48,50	113,15	161,65
4.2.1.2.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			4.838,54	30,00	70,00	100,00	1.451,56	3.386,98	4.838,54
4.2.1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			4.157,50	30,00	70,00	100,00	1.247,25	2.910,25	4.157,50
4.2.1.2.4.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016			4.285,91	30,00	70,00	100,00	1.285,77	3.000,14	4.285,91
4.2.1.3.	Vigas Baldrame			6.915,52	30,00	70,00	100,00	2.074,66	4.840,86	6.915,52
4.2.1.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			44,90	30,00	70,00	100,00	13,47	31,43	44,90
4.2.1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			3.062,67	30,00	70,00	100,00	918,80	2.143,87	3.062,67
4.2.1.3.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			841,91	30,00	70,00	100,00	252,57	589,34	841,91
4.2.1.3.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			787,92	30,00	70,00	100,00	236,38	551,54	787,92



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Pato Branco		Nº Operação N.A	Nº Siconv N.A	Apelido do Empreendimento Centro de Referência em Cidadania	Início de Obra 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	Empresa Executora SJ Prestadora de Serviços	CNPJ 40.474.563/0001-36	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº Medição 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.2.1.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			1.078,07	30,00	70,00	100,00	323,42	754,65	1.078,07
4.2.1.3.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			1.100,05	30,00	70,00	100,00	330,02	770,03	1.100,05
4.2.1.4.	Pilares			10.147,16	30,00	70,00	100,00	3.044,15	7.103,01	10.147,16
4.2.1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			3.617,00	30,00	70,00	100,00	1.085,10	2.531,90	3.617,00
4.2.1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			1.645,02	30,00	70,00	100,00	493,51	1.151,51	1.645,02
4.2.1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			2.341,28	30,00	70,00	100,00	702,38	1.638,90	2.341,28
4.2.1.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			1.090,76	30,00	70,00	100,00	327,23	763,53	1.090,76
4.2.1.4.5.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO -- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			1.453,10	30,00	70,00	100,00	435,93	1.017,17	1.453,10
4.2.1.5.	Vigas			2.816,33	30,00	70,00	100,00	844,90	1.971,43	2.816,33
4.2.1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			1.766,23	30,00	70,00	100,00	529,87	1.236,36	1.766,23
4.2.1.5.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			259,74	30,00	70,00	100,00	77,92	181,82	259,74
4.2.1.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			492,21	30,00	70,00	100,00	147,66	344,55	492,21
4.2.1.5.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			298,15	30,00	70,00	100,00	89,45	208,70	298,15
4.2.1.6.	Lajes			1.446,71	-	100,00	100,00	-	1.446,71	1.446,71
4.2.1.6.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022			839,33	-	100,00	100,00	-	839,33	839,33
4.2.1.6.2.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015			249,60	-	100,00	100,00	-	249,60	249,60
4.2.1.6.3.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			357,78	-	100,00	100,00	-	357,78	357,78



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVICOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período		
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania						TOTAL:	1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.2.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO				3.895,80	-	23,50	23,50	-	915,37	915,37		
4.2.2.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018				915,37	-	100,00	100,00	-	915,37	915,37		
4.2.2.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018				1.880,75	-	-	-	-	-	-		
4.2.2.0.3.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018				758,74	-	-	-	-	-	-		
4.2.2.0.4.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018				340,94	-	-	-	-	-	-		
4.2.3.	PAREDES E DIVISÓRIAS				3.733,91	-	100,00	100,00	-	3.733,91	3.733,91		
4.2.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				3.157,21	-	100,00	100,00	-	3.157,21	3.157,21		
4.2.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				166,80	-	100,00	100,00	-	166,80	166,80		
4.2.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				156,46	-	100,00	100,00	-	156,46	156,46		
4.2.3.0.4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				89,22	-	100,00	100,00	-	89,22	89,22		
4.2.3.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				164,22	-	100,00	100,00	-	164,22	164,22		
4.2.4.	REVESTIMENTOS				7.987,79	-	78,05	78,05	-	6.234,82	6.234,82		
4.2.4.1.	Piso				1.059,34	-	100,00	100,00	-	1.059,34	1.059,34		
4.2.4.1.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021				4,88	-	100,00	100,00	-	4,88	4,88		
4.2.4.1.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017				36,43	-	100,00	100,00	-	36,43	36,43		
4.2.4.1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016				608,50	-	100,00	100,00	-	608,50	608,50		
4.2.4.1.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021				192,89	-	100,00	100,00	-	192,89	192,89		
4.2.4.1.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				216,64	-	100,00	100,00	-	216,64	216,64		
4.2.4.2.	Paredes Internas				3.691,23	-	52,51	52,51	-	1.938,26	1.938,26		
4.2.4.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				271,52	-	100,00	100,00	-	271,52	271,52		



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.2.4.2.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014			1.666,74	-	100,00	100,00	-	1.666,74	1.666,74
4.2.4.2.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014			1.752,97	-	-	-	-	-	-
4.2.4.3.	Paredes Externas			3.000,20	-	100,00	100,00	-	3.000,20	3.000,20
4.2.4.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			505,78	-	100,00	100,00	-	505,78	505,78
4.2.4.3.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			2.494,42	-	100,00	100,00	-	2.494,42	2.494,42
4.2.4.4.	Teto			237,02	-	100,00	100,00	-	237,02	237,02
4.2.4.4.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014			46,40	-	100,00	100,00	-	46,40	46,40
4.2.4.4.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015			190,62	-	100,00	100,00	-	190,62	190,62
4.2.5.	ESQUADRIAS			7.460,13	-	-	-	-	-	-
4.2.5.1.	Janelas			730,42	-	-	-	-	-	-
4.2.5.1.1.	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			131,15	-	-	-	-	-	-
4.2.5.1.2.	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO VENEZIANA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			599,27	-	-	-	-	-	-
4.2.5.2.	Porta			6.729,71	-	-	-	-	-	-
4.2.5.2.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			3.970,95	-	-	-	-	-	-
4.2.5.2.2.	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			2.758,76	-	-	-	-	-	-
4.2.6.	PINTURA			3.874,66	-	60,60	60,60	-	2.348,07	2.348,07
4.2.6.1.	Paredes Internas			1.271,23	-	52,86	52,86	-	671,97	671,97
4.2.6.1.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			117,53	-	100,00	100,00	-	117,53	117,53
4.2.6.1.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			554,44	-	100,00	100,00	-	554,44	554,44
4.2.6.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			599,26	-	-	-	-	-	-
4.2.6.2.	Paredes Externas			2.350,04	-	64,68	64,68	-	1.520,10	1.520,10



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.2.6.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014			187,14	-	100,00	100,00	-	187,14	187,14
4.2.6.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017			1.332,96	-	100,00	100,00	-	1.332,96	1.332,96
4.2.6.2.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			829,94	-	-	-	-	-	-
4.2.6.3.	Teto			253,39	-	61,57	61,57	-	156,00	156,00
4.2.6.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			19,44	-	100,00	100,00	-	19,44	19,44
4.2.6.3.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			136,56	-	100,00	100,00	-	136,56	136,56
4.2.6.3.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			97,39	-	-	-	-	-	-
4.2.7.	PSCIP			1.335,22	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			35,26	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P			716,45	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			71,01	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			29,97	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DIÂMETRO DE 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			24,35	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO TRIANGULAR LADO 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			41,56	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.7.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3000 LUMENS BLOCO AUTÔNOMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			393,62	-	-	-	-	-	-
4.2.7.0.8.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			23,00	-	-	-	-	-	-
4.2.8.	ESCADA			19.124,11	-	33,78	33,78	-	6.459,60	6.459,60
4.2.8.1.	Estrutura			6.001,48	-	100,00	100,00	-	6.001,48	6.001,48
4.2.8.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020			3.218,95	-	100,00	100,00	-	3.218,95	3.218,95
4.2.8.1.2.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020			309,64	-	100,00	100,00	-	309,64	309,64
4.2.8.1.3.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020			1.225,33	-	100,00	100,00	-	1.225,33	1.225,33
4.2.8.1.4.	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			1.247,56	-	100,00	100,00	-	1.247,56	1.247,56
4.2.8.2.	Revestimentos e Pintura do Piso			768,39	-	59,62	59,62	-	458,12	458,12
4.2.8.2.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021			458,12	-	100,00	100,00	-	458,12	458,12



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23	
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.2.8.2.2.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			310,27	-	-	-	-	-	-
4.2.8.3.	Guarda-corpo e Corrimão			12.354,24	-	-	-	-	-	-
4.2.8.3.1.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P			8.103,65	-	-	-	-	-	-
4.2.8.3.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P			2.418,86	-	-	-	-	-	-
4.2.8.3.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P			884,08	-	-	-	-	-	-
4.2.8.3.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P			947,65	-	-	-	-	-	-
4.3.	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO			49.853,79	-	22,40	22,40	-	11.165,26	11.165,26
4.3.0.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			1.436,52	-	100,00	100,00	-	1.436,52	1.436,52
4.3.0.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016			367,85	-	100,00	100,00	-	367,85	367,85
4.3.0.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021			9.360,89	-	100,00	100,00	-	9.360,89	9.360,89
4.3.0.0.4.	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)			31.954,71	-	-	-	-	-	-
4.3.0.0.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016			3.832,04	-	-	-	-	-	-
4.3.0.0.6.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022			2.901,78	-	-	-	-	-	-
4.4.	ESTRUTURA MURO DE ARRIMO			3.307,04	100,00	-	100,00	3.307,04	-	3.307,04
4.4.1.	Movimentação de Terra			125,70	100,00	-	100,00	125,70	-	125,70
4.4.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			36,94	100,00	-	100,00	36,94	-	36,94
4.4.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017			44,10	100,00	-	100,00	44,10	-	44,10
4.4.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016			44,66	100,00	-	100,00	44,66	-	44,66
4.4.2.	Sapatas			1.098,89	100,00	-	100,00	1.098,89	-	1.098,89
4.4.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			13,47	100,00	-	100,00	13,47	-	13,47



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23	
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024	Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.4.2.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			305,20	100,00	-	100,00	305,20	-	305,20
4.4.2.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			519,47	100,00	-	100,00	519,47	-	519,47
4.4.2.0.4.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016			260,75	100,00	-	100,00	260,75	-	260,75
4.4.3.	Vigas Baldrame			1.372,70	100,00	-	100,00	1.372,70	-	1.372,70
4.4.3.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017			17,96	100,00	-	100,00	17,96	-	17,96
4.4.3.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017			558,64	100,00	-	100,00	558,64	-	558,64
4.4.3.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			190,80	100,00	-	100,00	190,80	-	190,80
4.4.3.0.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017			281,40	100,00	-	100,00	281,40	-	281,40
4.4.3.0.5.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017			323,90	100,00	-	100,00	323,90	-	323,90
4.4.4.	Paredes			709,75	100,00	-	100,00	709,75	-	709,75
4.4.4.0.1.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019			62,79	100,00	-	100,00	62,79	-	62,79
4.4.4.0.2.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019			146,74	100,00	-	100,00	146,74	-	146,74
4.4.4.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			291,15	100,00	-	100,00	291,15	-	291,15
4.4.4.0.4.	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021			209,07	100,00	-	100,00	209,07	-	209,07
4.5.	REVESTIMENTOS MUROS E CERCAMENTO			80.851,01	34,81	(0,19)	34,63	28.145,29	(149,77)	27.995,52
4.5.1.	Impermeabilização			334,01	50,00	50,00	100,00	167,01	167,00	334,01
4.5.1.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018			334,01	50,00	50,00	100,00	167,01	167,00	334,01
4.5.2.	Alvenaria			730,31	50,00	50,00	100,00	365,16	365,15	730,31
4.5.2.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			730,31	50,00	50,00	100,00	365,16	365,15	730,31
4.5.3.	Revestimento			5.735,19	50,00	50,00	100,00	2.867,60	2.867,59	5.735,19
4.5.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			1.209,58	50,00	50,00	100,00	604,79	604,79	1.209,58



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		N.A	N.A	Centro de Referência em Cidadania	12/04/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
45/2023/GP	SJ PRESTADORA DE SERVICOS	40.474.563/0001-36	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO
					8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania										
TOTAL:				1.447.469,55	55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.5.3.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014			4.525,61	50,00	50,00	100,00	2.262,81	2.262,80	4.525,61
4.5.4.	Pintura			2.478,17	-	100,00	100,00	-	2.478,17	2.478,17
4.5.4.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014			522,19	-	100,00	100,00	-	522,19	522,19
4.5.4.0.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016			1.955,98	-	100,00	100,00	-	1.955,98	1.955,98
4.5.5.	Cercamento			71.573,33	34,57	(8,42)	26,15	24.745,52	(6.027,68)	18.717,84
4.5.5.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020			1.455,64	40,00	60,00	100,00	582,26	873,38	1.455,64
4.5.5.0.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF 01/2017			6.475,71	40,00	60,00	100,00	2.590,28	3.885,43	6.475,71
4.5.5.0.3.	CERCAMENTO EM GRADIL COM POSTES METÁLICO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO RETANGULAR A PARAFUSADO EM VIGA DE CONCRETO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU PVC DE ALTA ADERÊNCIA, SEÇÃO 40X60MM, TELA MALHA 5X20CM EM AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSSOLDADA E REVESTIDA EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU COM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, DIÂMETRO DO ARAME DE 5,0MM, PAINEL COM 2,43M DE ALTURA E POSTES A CADA 2,50M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			53.932,46	40,00	(20,00)	20,00	21.572,98	(10.786,49)	10.786,49
4.5.5.0.4.	PORTÃO DE CORRER LARGURA 1,20M, 1 FOLHA, EM GRADIL TELA MALHA 5X20CM EM AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSSOLDADA E REVESTIDA EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU COM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, DIÂMETRO DO ARAME DE 5,0MM, PAINEL COM 2,43M DE ALTURA, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.904,20	-	-	-	-	-	-
4.5.5.0.5.	PORTÃO DE ABRIR LARGURA 2,00M, 2 FOLHAS, EM GRADIL TELA MALHA 5X20CM EM AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSSOLDADA E REVESTIDA EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU COM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, DIÂMETRO DO ARAME DE 5,0MM, PAINEL COM 2,43M DE ALTURA, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			4.468,00	-	-	-	-	-	-
4.5.5.0.6.	PORTÃO DE ABRIR LARGURA 90CM, 1 FOLHA, EM GRADIL TELA MALHA 5X20CM EM AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSSOLDADA E REVESTIDA EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA OU COM PVC DE ALTA ADERÊNCIA, DIÂMETRO DO ARAME DE 5,0MM, PAINEL COM 2,43M DE ALTURA, COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			2.337,32	-	-	-	-	-	-
4.6.	CALÇADAS			11.279,43	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		Nº OPERAÇÃO N.A	Nº SICONV N.A	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Referência em Cidadania	INÍCIO DE OBRA 12/04/23
Nº CTEF 45/2023/GP	EMPRESA EXECUTORA SJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	CNPJ 40.474.563/0001-36	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 30/08/2024 a 06/11/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 70,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Centro de Referência em Cidadania						55,47	14,53	70,00	802.980,81	210.247,16	1.013.227,97
4.6.0.0.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				484,00	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015				3.249,35	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015				2.287,26	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.4.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022				2.040,73	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO COLORIDO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, DE 20 X 20 CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, ESPESSURA 6 CM.				2.171,79	-	-	-	-	-	-
4.6.0.0.6.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONFORME DETALHE EM PROJETO E NBR 9050				1.046,30	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total;

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO - PR
Local

quarta-feira, 6 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA-PR 107.389/D
ART/RRT: 1720232334599



Documento assinado digitalmente
FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 07/11/2024 07:41:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Execução de Demolição de 114,83m², Reforma de 228,10m² e Ampliação de 182,70m² nas antigas instalações da unidade de saúde e creche localizadas na Rua 21 de Abril no Bairro São Cristovão, no lote 01 da quadra 1626, para implantação do Centro de Referência em Cidadania ao Idoso – CRECI, com área total de 410,80m².

Relatório de Medição nº 08

Empresa Contratada: S J PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Responsável Técnico: Luiz Carlos Maciel de Vargas

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a oitava medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:














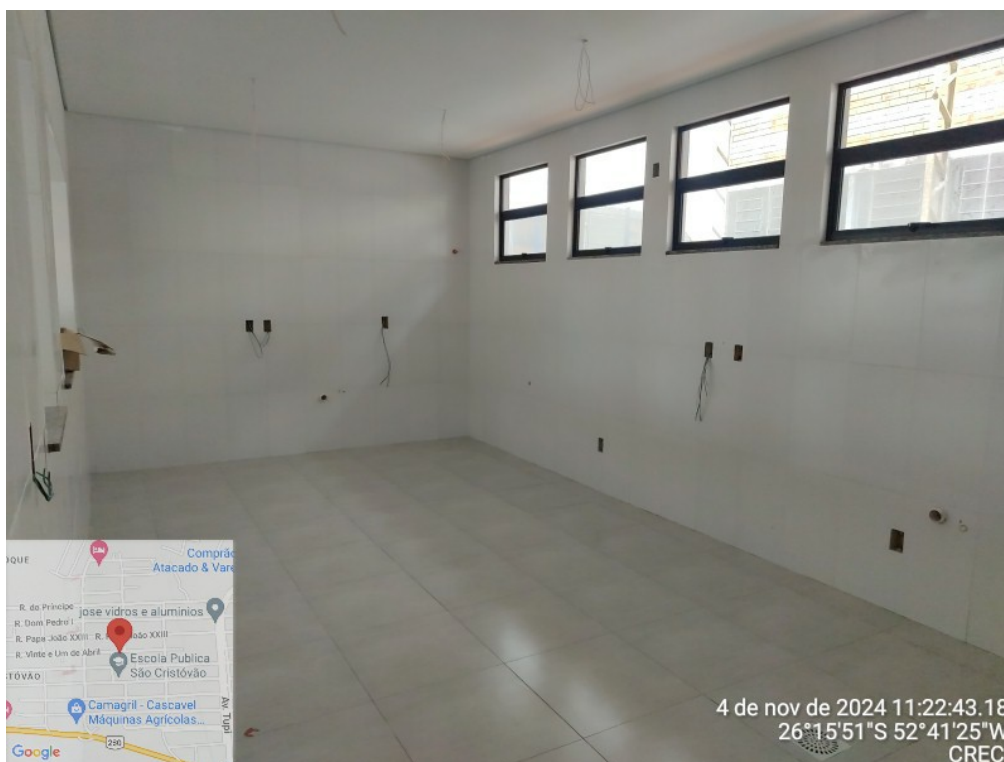






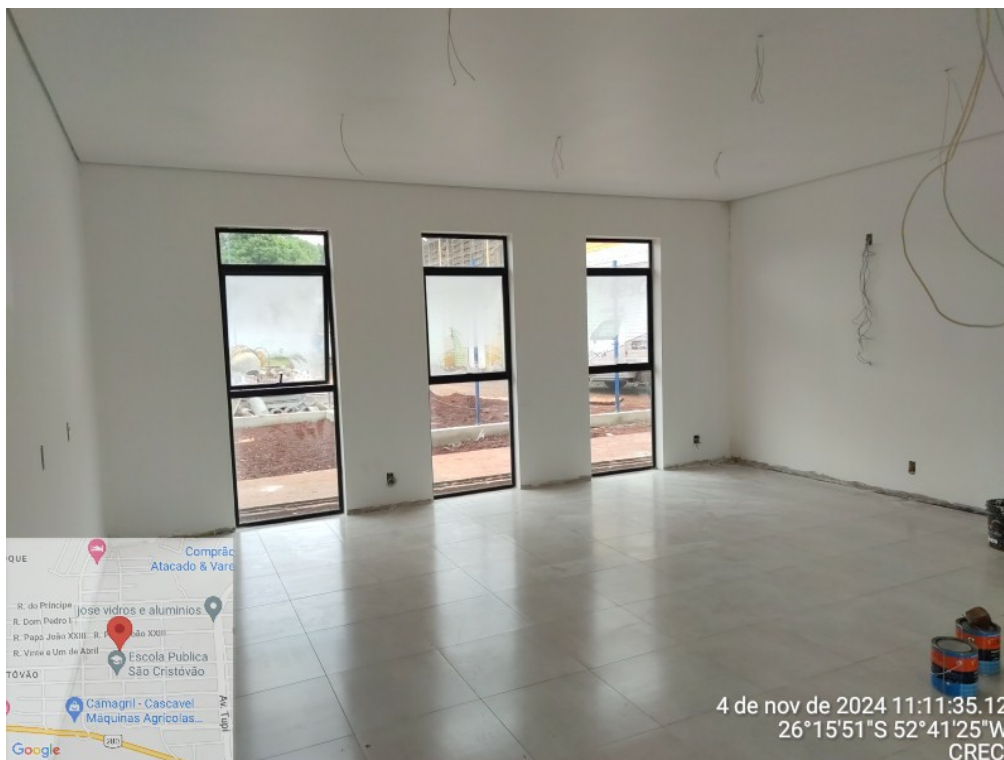

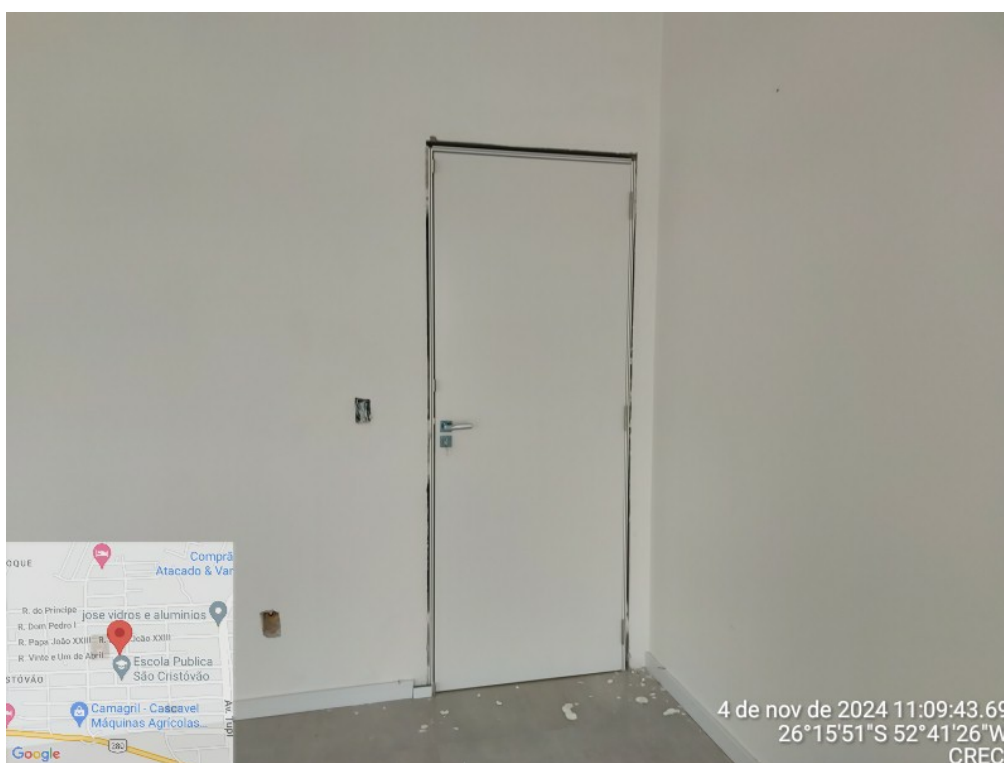

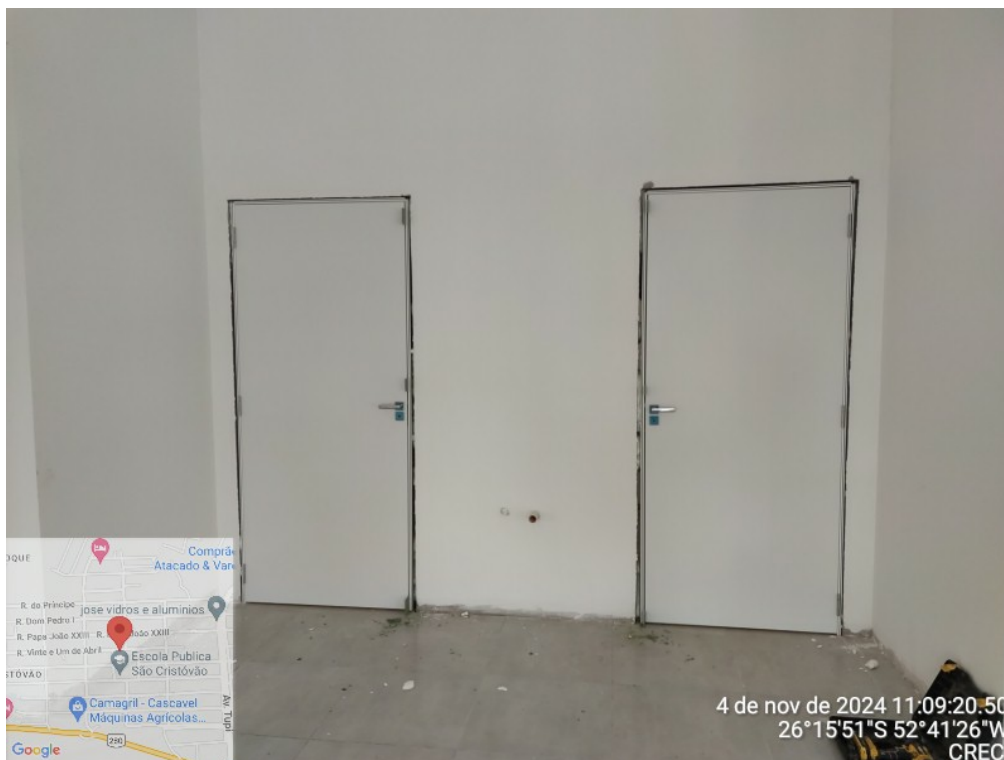





Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 210.247,16**.

Pato Branco, 07 de Novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ZIANNI MANARIM
Data: 07/11/2024 07:41:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Zianni Manarim
Engenheira Civil
CREA-PR 107.389/D
