



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)	01/03/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/01/1900 a 07/03/2024	Nº MEDIÇÃO	3	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CHIE MENINO DEUS				TOTAL:	599.264,14	-	-	-	486.938,31	113.265,83	599.264,14
1.1.	ESTRUTURA DO TELHADO E TELHAMENTO	-	-	-	599.264,14	-	-	-	486.938,31	113.265,83	599.264,14
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUIS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	2.338,02	62,00	144.957,24	2.338,02	-	2.338,02	144.957,24	-	144.957,24
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.231,57	4,00	4.926,28	1.231,57	-	1.231,57	4.926,28	-	4.926,28
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.231,57	7,00	8.620,99	1.231,57	-	1.231,57	8.620,99	-	8.620,99
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUIS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.231,57	225,00	277.103,25	1.231,57	-	1.231,57	277.103,25	-	277.103,25
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	92,00	120,00	11.040,00	-	92,00	92,00	-	11.040,00	11.040,00
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	122,16	75,00	9.162,00	-	122,16	122,16	-	9.162,00	9.162,00
1.1.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P	M2	1.231,57	30,00	36.947,10	1.231,57	-	1.231,57	36.947,10	-	36.947,10
1.1.8.	CUMEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	68,00	86,64	5.891,52	68,00	-	68,00	5.891,52	-	5.891,52
1.1.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARVIEJAS DE VEDAÇÃO	CJ	2.700,00	1,83	4.941,00	2.700,00	-	2.700,00	4.941,00	-	4.941,00
1.2.	Ferro de PVC	-	-	-	91.997,38	-	-	-	2.610,93	89.386,45	91.997,38
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.231,57	2,12	2.610,93	1.231,57	-	1.231,57	2.610,93	-	2.610,93
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	1.231,57	70,03	86.246,85	-	1.231,57	1.231,57	-	86.246,85	86.246,85
1.2.3.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	470,00	6,68	3.139,60	-	470,00	470,00	-	3.139,60	3.139,60
1.3.	OUTROS	-	-	-	3.677,38	-	-	-	-	3.677,38	3.677,38
1.3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	49,00	9,70	475,30	-	49,00	49,00	-	475,30	475,30
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.231,57	2,60	3.202,08	-	1.231,57	1.231,57	-	3.202,08	3.202,08

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.



BM - Boletim de Medição
Seleção o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
0		0		0		0 TROCA DE TELHADOS		00/01/00	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
0		0		0		(SELECIONAR)		01/01/1900 a 07/03/2024	
								Nº MEDIÇÃO	
								3	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CMEI MENINO DEUS						TOTAL:	599.264,14	-	486.998,31	113.265,83	599.264,14

PATO BRANCO
Local
Data quinta-feira, 7 de março de 2024

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

Ademir de Jesus



MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigbola, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharla@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execuções das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados no CMEI MENINO DEUS, Rua Pedro Ramires De Mello, nº 1067, Bairro Menino Deus, CEP: 85502-050 no município de Pato Branco/PR.

Contrato nº 75/2023/GP


Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
Responsável: Lincoln Fernando Machado de Souza

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:

Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 113.266,83**.

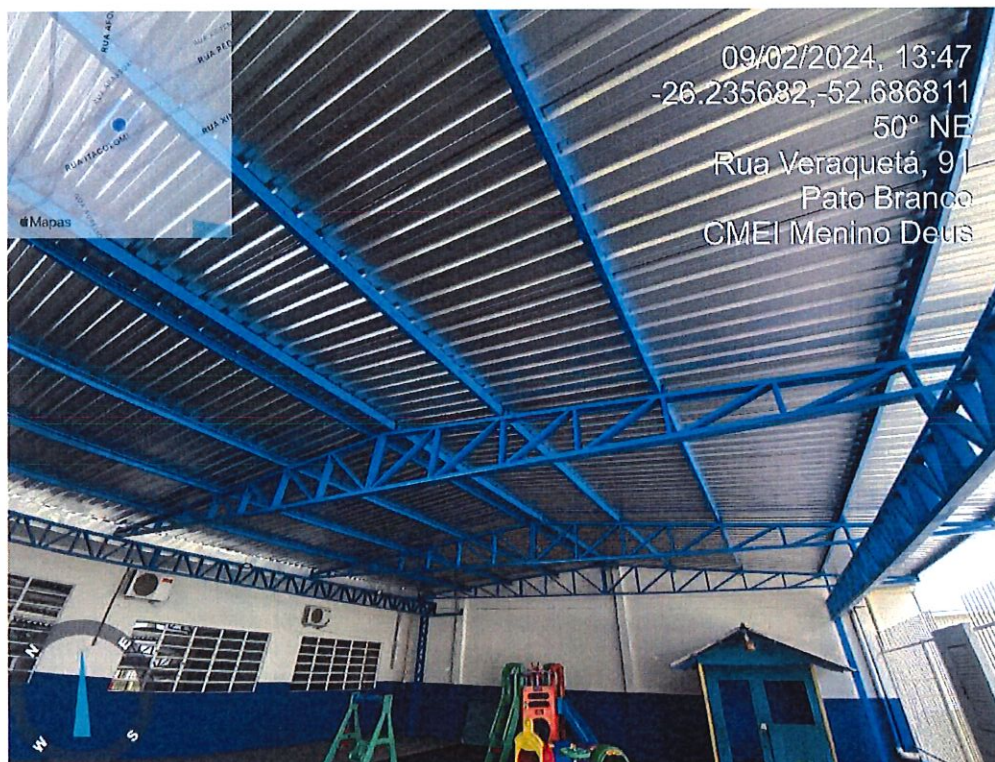







09/02/2024, 13:49
-26.235292,-52.687285
92° E
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus




09/02/2024, 13:49
-26.235292,-52.687285
324° NW
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus




09/02/2024, 13:52
-26.235405,-52.687109
36° NE
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus






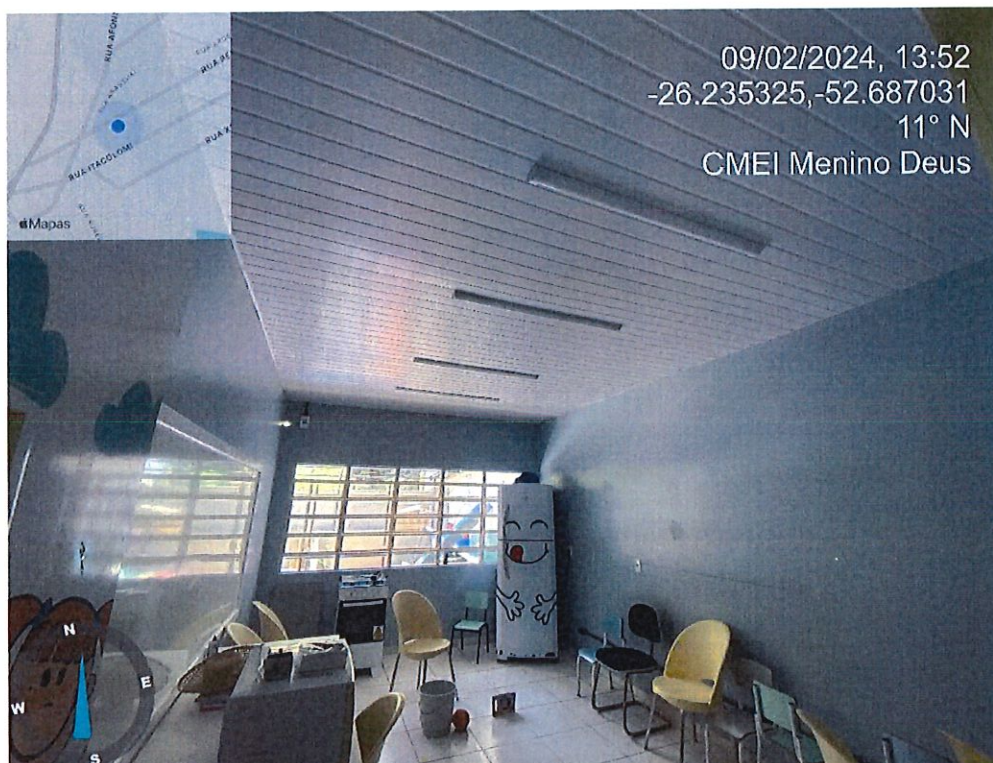

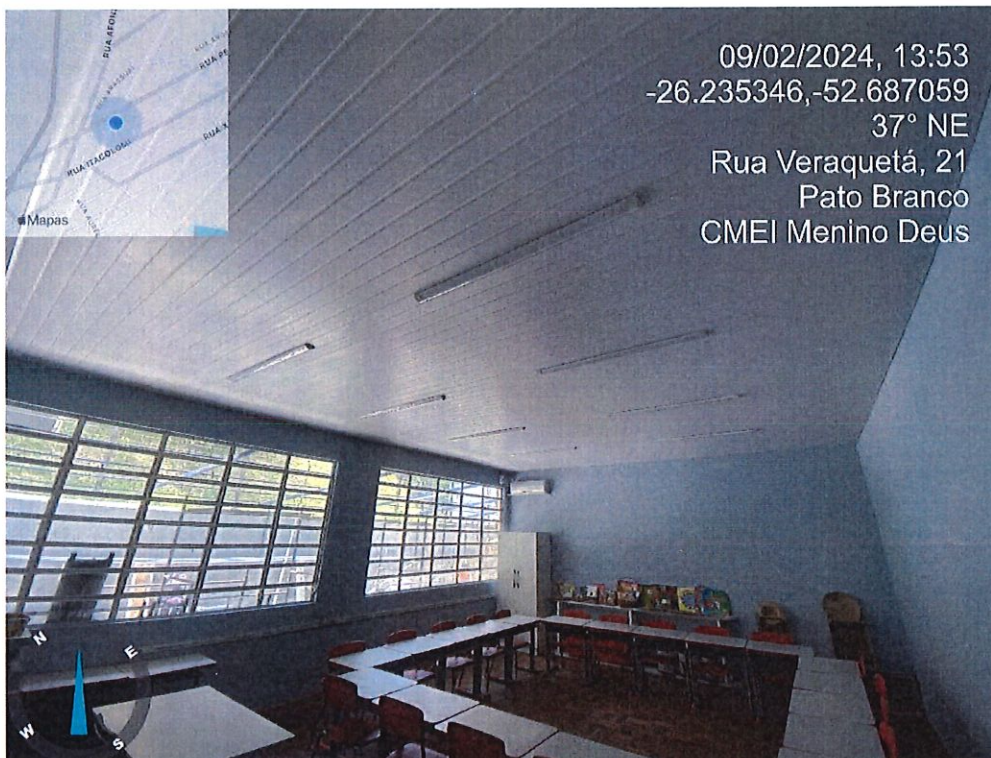

09/02/2024, 13:53
-26.235346,-52.687059
37° NE
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus

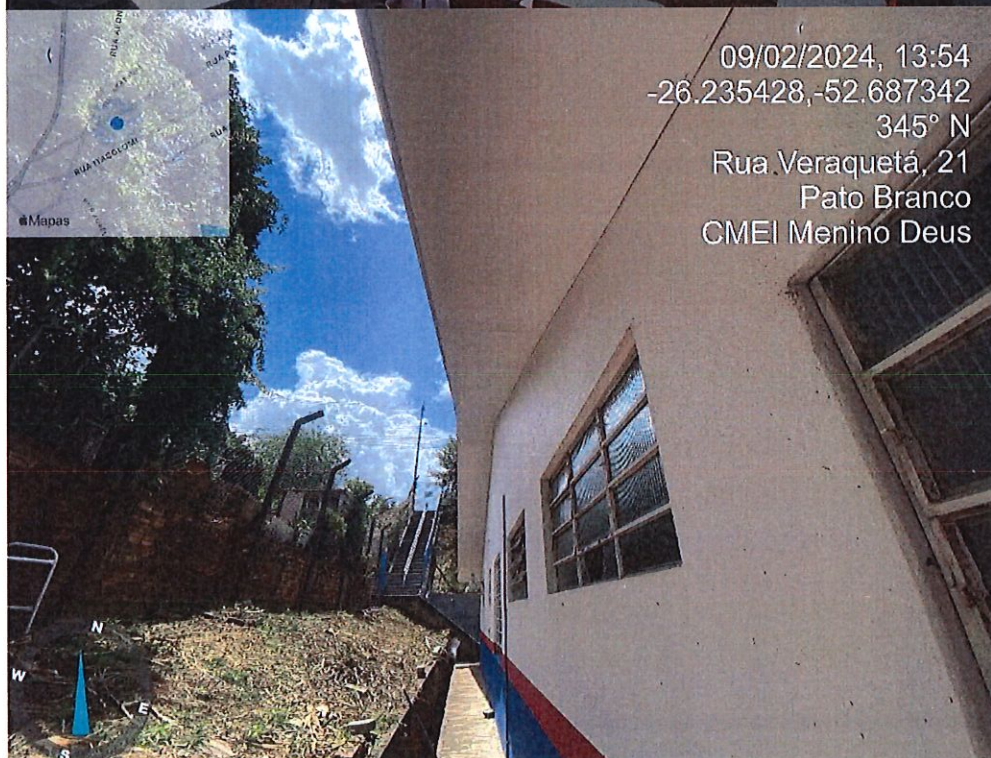

09/02/2024, 13:54
-26.235428,-52.687342
345° N
Rua Veraquetá, 21
Pato Branco
CMEI Menino Deus



Pato Branco, 26 de fevereiro de 2024.


ADERNANDA PAULA DOS SANTOS
Engenheira Civil
CREA-SC12602-0/D
