



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 10 de março 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 339/2022-GP

O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 618.058,17	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 10/03/2023	66,07	408.357,68	33,93	R\$ 209.700,49
A liberar 2. ^a Parcela em				
A liberar 3. ^a Parcela em				

Valor a ser liberado em 10/03/2023 R\$ 408.357,68

Gestora e fiscal do contrato.

Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato

Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato

PROPOSTANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		INÍCIO DE OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Nº MEDIÇÃO
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	62,00	67.766,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	4,00	4.372,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	7,00	7.651,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	225,00	245.325,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	120,00	130.260,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	75,00	81.525,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	200,00	219.200,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	129,45	140.400,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	30,00	32.790,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	86,64	94.600,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	1,83	1.970,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	2,12	2.300,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	70,03	76.527,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	6,68	7.260,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	9,70	10.600,00	-	-	-	1
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	M2	1.093,00	2,60	2.841,80	-	-	-	1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:						
1.	TELHADOS	-	-	-	618.058,17	-	-	-	-	-	-
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	548.617,76	-	-	-	-	406.357,68	406.357,68
1.1.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.093,00	62,00	67.766,00	-	900,00	900,00	-	55.800,00	55.800,00
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.093,00	4,00	4.372,00	-	900,00	900,00	-	3.600,00	3.600,00
1.1.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.093,00	7,00	7.651,00	-	900,00	900,00	-	6.300,00	6.300,00
1.1.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1.093,00	225,00	245.925,00	-	900,00	900,00	-	202.500,00	202.500,00
1.1.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	263,00	120,00	31.560,00	-	150,00	150,00	-	18.000,00	18.000,00
1.1.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M	326,00	75,00	24.450,00	-	250,00	250,00	-	18.750,00	18.750,00
1.1.7.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	410,00	200,00	82.000,00	-	300,00	300,00	-	60.000,00	60.000,00
1.1.8.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	264,00	129,45	34.174,80	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_P	M2	1.093,00	30,00	32.790,00	-	900,00	900,00	-	27.000,00	27.000,00
1.1.10.	CUMEIEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	114,00	86,64	9.876,96	-	80,00	80,00	-	6.931,20	6.931,20
1.1.11.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4.400,00	1,83	8.052,00	-	3.900,00	3.900,00	-	7.137,00	7.137,00
1.2.	Forro de PVC	-	-	-	65.871,11	-	-	-	-	1.757,48	1.757,48
1.2.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	829,00	2,12	1.757,48	-	829,00	829,00	-	1.757,48	1.757,48
1.2.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	M2	829,00	70,03	58.054,87	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	907,00	6,68	6.058,76	-	-	-	-	-	-
1.3.	OUTROS	-	-	-	3.569,30	-	-	-	-	582,00	582,00
1.3.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	75,00	9,70	727,50	-	60,00	60,00	-	582,00	582,00
1.3.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.093,00	2,60	2.841,80	-	-	-	-	-	-

Observações:

Assinado



BM - Boletim de Medição
Seleção o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / Tomador		Nº Siconv		Apelido do Empreendimento		Grau de Sigilo	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	Nº OPERAÇÃO	REGIME DE EXECUÇÃO	01 TROCA DE TELHADOS	22/09/22	#PUBLICO	
0	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	0	(SELECIONAR)				
	CNPJ			PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO	
	10.783.587/0001-96			22/09/2022 a 10/03/2023		1	

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:					

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO

Local

sexta-feira, 10 de março de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ADERNANDA PAULA DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 112602-0/D
ART/RRT: 1720230300123



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

CONTRATO Nº342/2022/GP

Relatório de Medição nº 01

Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA


Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 408.357,68.






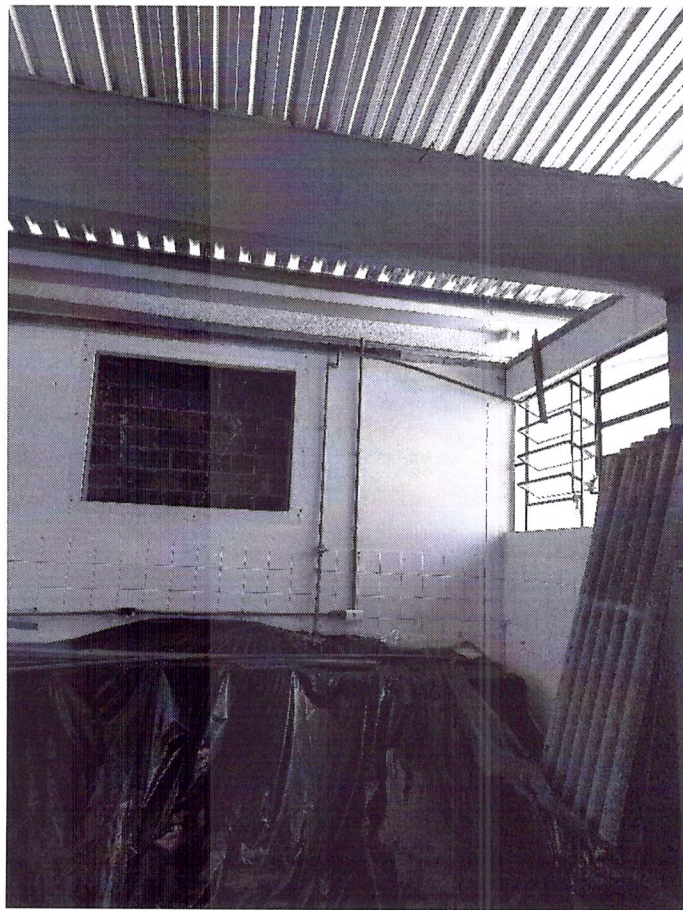





Pato Branco, 10 de março de 2023.



Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D
