

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2024	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO LUIS Esta intervenção foi concluída	Contrato 21/2024	180	09/02/2024	R\$ 420.267,54	100,00%
5	2024	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO LUIS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	180	09/02/2024	R\$ 420.267,54	100,00%

Nº5/2024
Data Inicial: 09/02/2024

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO LUIS

R\$ 420.267,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70271

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1859	2024	26/02/2024	12433
8364	2024	20/06/2024	12433
16585	2024	05/12/2024	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1132	580522	26/02/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.2*.6**-94	ART (CREA)	17**2*3**96**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	13**7*3*	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.2*.7**-43	ART (CREA)	17**2*4**72**	Orçamento	Sim
CPF	89*.0*.0**-34	ART (CREA)	17**2*2**52**	Fiscalização	Não

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32853	R\$ 476.051,66	27/09/2023	
Contrato	21	2024	76.995.448/0001-54	32854	R\$ 420.267,54	08/02/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	76.995.448/0001-54	33177	R\$ 14.014,36	10/10/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32902	Medição	1	Jurisdicionado	27/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	0,10%
32947	Medição	2	Jurisdicionado	25/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	0,10%

32987	Medição	3	Jurisdicionado	28/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	0,10%
33018	Medição	4	Jurisdicionado	26/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	14,76%
33060	Medição	5	Jurisdicionado	25/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	71,82%
33093	Medição	6	Jurisdicionado	27/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	71,82%
33132	Medição	7	Jurisdicionado	27/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	71,82%
33160	Medição	8	Jurisdicionado	28/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	71,82%
33176	Medição	9	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	100,00%
33178	Medição	10	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
33227	Medição	11	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	100,00%
33242	Medição	12	Jurisdicionado	28/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 21/2024	100,00%
33251	Conclusão	13	Jurisdicionado	18/02/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900180779279					

Nº5/2024
Data Inicial: 09/02/2024

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO LUIS

Documentos

R\$ 420.267,54

Planilha Base

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL							
Município:	PATO BRANCO -PR					SAM	74
Projeto:	PRAÇA SÃO LUIS					LOTE nº	5
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração							27/09/2023 - Wed
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			
				QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					24,191.46
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					x x x x x x x x x x
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES					
97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	309.74	20.99	6,501.44	
97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	105.10	0.96	100.90	
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15.00	2.17	32.55	
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10.00	1.84	18.40	
1.1.2		LOCACAO		-	-	-	
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40.00	83.09	3,323.60	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS	0	-	-	-	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6.00	1,757.26	10,543.56	x x x
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1.00	3,671.01	3,671.01	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	7,236.42
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	x x x
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL	0	-	-	-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	88.75	11.18	992.23	
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	x
COMPOSIÇÃO 54	COMPOSIÇÃO	GRELHA DE CONCRETO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59.03	105.78	6,244.19	x
4		ESTRUTURAS	0	-	-	-	1,069.08
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS	0	-	-	-	x x x
COMPOSIÇÃO 44	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3) ESPESSURA 3,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	3.11	129.91	404.02	
COMPOSIÇÃO 45	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0) ESPESSURA 5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	4.44	149.79	665.06	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	-	-	-	54,343.25
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS	0	-	-	-	x x x
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES	0	-	-	-	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS	0	-	-	-	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175.00	19.59	3,428.25	x x x
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS	0	-	-	-	
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.00	27.83	83.49	
8.2.5		CABOS	0	-	-	-	x
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V	0	-	-	-	

Planilha Base

97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1.00	132.67	132.67	
8.2.11		DISJUNTORES	0	-	-	-	
8.2.11.2		BIPOLARES	0	-	-	-	
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	95.72	95.72	
8.2.21		REATORES E OUTROS	0	-	-	-	
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.00	53.11	53.11	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	234.72	234.72	
COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29.00	147.57	4,279.53	
COMPOSIÇÃO 47	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO - METÁLICO, COM FLANGE, PINTADO ELETROSTATICAMENTE 50X40X35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	406.36	406.36	
COMPOSIÇÃO 46	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 4,5, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA RUBI TOPO DE POSTE - SOQUETE E-27 PARA LAMPADA DE LED 20W	UNID	30.00	1,347.22	40,416.60	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	0	-	-	-	2,149.50
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	0	-	-	-	
9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA	0	-	-	-	
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1.00	210.03	210.03	
9.3.12		ENTRADA DE AGUA	0	-	-	-	
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1.00	336.43	336.43	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1.00	187.98	187.98	
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1.00	116.04	116.04	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA	0	-	-	-	
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	0	-	-	-	
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6.72	17.54	117.87	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2.25	51.24	115.29	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	0	-	-	-	
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1.00	34.70	34.70	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	1,031.16	1,031.16	
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	0	-	-	-	163,148.43
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS	0	-	-	-	
10.3.2		CONTRAPISO	0	-	-	-	
87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	145.90	54.57	7,961.76	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO	0	-	-	-	
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	42.43	58.04	2,462.64	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,	M2	91.40	76.16	6,961.02	

Planilha Base

94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	245.56	97.55	23,954.38	
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	0	-	-	-	x
COMPOSIÇÃO 2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	88.75	98.67	8,756.96	
COMPOSIÇÃO 5	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	206.83	310.22	64,162.80	
COMPOSIÇÃO 52	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS VIBROPRENSADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII	M2	112.90	113.30	12,791.57	
COMPOSIÇÃO 53	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO ASSETADO COM ACII - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	145.90	131.87	19,239.83	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	0	-	-	-	223,913.52
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO	0	-	-	-	x
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-	-	-	x
94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	177.32	43.22	7,663.77	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	x
605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	5.00	590.99	2,954.95	
COMPOSIÇÃO 8	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	1,713.61	1,713.61	
COMPOSIÇÃO 9	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2.00	2,778.34	5,556.68	
COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	1.00	5,150.89	5,150.89	
COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1.00	3,211.30	3,211.30	
COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	3.00	2,461.86	7,385.58	
COMPOSIÇÃO 48	COMPOSIÇÃO	PIRÂMIDE DE CORDAS, INCLUSO FUNDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	90,291.63	90,291.63	
COMPOSIÇÃO 49	COMPOSIÇÃO	CARROSSEL PARA PLAYGROUND CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	2,984.56	2,984.56	
COMPOSIÇÃO 50	COMPOSIÇÃO	GANGORRA PARA PLAYGROUND CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	1,503.44	1,503.44	
COMPOSIÇÃO 51	COMPOSIÇÃO	ESCORREGADOR + TÚNEL + ESCALADA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INCLUÍDO REVESTIMENTO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, ESCORREGADORES E AGARRAS DE RESINA - CONFORME PROJETO	UN	1.00	95,497.11	95,497.11	
x		TOTAL GERAL					476,051.66

Planilha de Contrato

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli														
Município: PATO BRANCO - PR		CNPJ: 16.700.335/0001-52		SAM		68		1		27/09/2023 - qua				
Projeto: Construção Civil														
Tabela de Referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração														
CODIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					UD	PUTAB	PU-BDI	QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS	
ORÇAMENTO														
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												21.823,40
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES												
97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,10	20,99	18,57	5,751,18							
97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	0,78	0,96	0,85	89,25							
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,77	2,17	1,92	28,79							
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,50	1,84	1,63	16,28							
1.1.2		LOCAÇÃO												
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,70	83,09	73,50	2.940,06							
1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTIEIRO DE OBRAS												
1.2.2		BARRACAO DE OBRA												
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	1.431,69	1.757,26	1.554,47	9.326,83							
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	2.990,88	3.671,01	3.671,01	3.671,01							
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS												6.401,33
2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS												
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTÊXTIL												
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	9,11	11,18	9,89	877,72							
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS												
COMPOSIÇÃO 54	COMPOSIÇÃO	GRELHA DE CONCRETO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	86,18	105,78	93,57	5.523,61							
4		ESTRUTURAS												
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS												
COMPOSIÇÃO 44	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3) ESPESSURA 3,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	105,84	129,91	114,92	357,40							
COMPOSIÇÃO 45	COMPOSIÇÃO	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0) ESPESSURA 5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	122,04	149,79	132,50	588,31							
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												48.072,03
8.2		ELETRODUTOS E CONEXÕES												
8.2.3		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS												
8.2.3.1		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015												
91836	SINAPI	ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS	M	15,96	19,59	17,33	3.032,63							
8.2.3.2		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015												
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,67	27,83	24,62	73,86							
8.2.5		CABOS												
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V												
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,42	5,43	4,80	4.611,24							
8.2.6		CAIXAS												


Planilha de Contrato

97281	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF. 12/2020	UN	108,09	132,67	1,00	117,36	117,36
8.2.11	DISJUNTORES							
8.2.12	BIPOLARES							
98666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	77,99	95,72	1,00	84,67	84,67
8.2.21	REATORES E OUTROS							
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	43,27	53,11	1,00	46,98	46,98
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						
COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	191,23	234,72	1,00	207,63	207,63
COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAUFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	120,23	147,57	29,00	130,54	3.785,67
COMPOSIÇÃO 47	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO - METÁLICO, COM FLANGE, PINTADO ELETROSTATICAMENTE 50X40X35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	331,07	406,36	1,00	359,47	359,47
COMPOSIÇÃO 46	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 4,5, DIÂMETRO INFERIOR = 95" MM, COM LUMINÁRIA RUBI TOPO DE POSTE - SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA DE LED 20W	UNID	1.067,62	1.347,22	30,00	1.191,75	35.752,52
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						
9.3		INSTALACOES HIDROSANITARIAS						
9.3.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA						
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	171,12	210,03	1,00	185,79	185,79
9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA						
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")	UN	274,10	336,43	1,00	297,61	297,61
95675	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF. 11/2016	UN	153,15	187,98	1,00	166,29	166,29
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	94,54	116,04	1,00	102,65	102,65
9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA						
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO						
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	14,29	17,54	6,72	15,52	104,27
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS						
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	41,75	51,24	2,25	45,33	101,99
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO						
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	28,27	34,70	1,00	30,70	30,70
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS						
COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRACA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	840,12	1.031,16	1,00	912,16	912,16
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS						
10.3.2		CONTRAPISO						
87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	44,46	54,57	145,90	48,27	7.042,98
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO						
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	47,29	58,04	42,43	51,34	2.178,45
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	62,05	76,16	91,40	67,37	6.157,72
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	67,74	83,14	202,76	73,55	14.912,11
10.3.12		PISO DE CONCRETO						
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	79,48	97,55	245,56	81,12	19.918,64
								143.049,71

E-mail: mg.construocivil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Marcio Galina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

Planilha de Contrato



SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									
Materiais de Construção	COMPOSIÇÃO 4	COMPOSIÇÃO							
	COMPOSIÇÃO 5	COMPOSIÇÃO							
	COMPOSIÇÃO 52	COMPOSIÇÃO							
	COMPOSIÇÃO 53	COMPOSIÇÃO							
	11								
11.1									
11.1.9									
94263	SINAPI								
x									
605000G	DER-PR Iw/23								
COMPOSIÇÃO 8	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 9	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 48	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 49	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 50	COMPOSIÇÃO								
COMPOSIÇÃO 51	COMPOSIÇÃO								
x									
TOTAL GERAL									
420.267,54									

Rodrigo Dias Franco
Arquiteto e Urbanista
CAU/ A91039-2

de
unf

 EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO ESTADO										REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)					
										Mês		Jun		PARCELA		1ª	
MUNICÍPIO:				PATO BRANCO						SAM		74		CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO:				PRAÇA - São Luiz						Lote		5		Nº		21/2024	
FIRMA EMPREITERA:				Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.						Ano		2024		DATA:		14/02/2024	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS														OR			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS			Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido					
GLOBAL - LOTE 1																	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				-										
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES				-	60,00%									
	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M2	309,74	100,00%	0,0137	1,37%	18,57	5.751,87					
	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M	105,10	100,00%	0,0002	0,02%	0,85	89,34					
	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			UN	15,00	100,00%	0,0001	0,01%	1,92	28,80					
	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			UN	10,00	100,00%			1,63	16,30					
	1.1.2		LOCACAO				-				-						
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018			M	40,00	100,00%	0,0070	0,70%	73,50	2.940,00					
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS				-				-						
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA				-				-						
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO			MES	6,00	66,67%	0,0222	1,48%	1.554,47	6.217,87					
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO				-				-						
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES			UN	1,00	100,00%	0,0087	0,87%	3.671,01	3.671,01					
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS														
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS				-				-						
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL				-				-						
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9			M2	99,75	79,98%	0,0031	0,15%	0,99	611,42					

 EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO	
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)
									Mês	Jun
									PARCELA	1ª
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO	SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:					
SUBPROJETO:		PRAÇA - São Luiz	Lote	5	Nº		21/2024			
FIRMA EMPREITERA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024	DATA:		14/02/2024			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00		0,0072		17,33	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00		0,0002		24,62	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	960,00		0,0110		4,80	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,0003		117,36	-
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		84,67	-
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0001		46,98	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0005		207,63	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29,00		0,0090		130,54	-
			QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO - METÁLICO - COM FLANGE - BINTADO							

 EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)		
									Mês	Jun	PARCELA	1ª
MUNICÍPIO:			PATO BRANCO						SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO:			PRAÇA - São Luiz						Lote	5	Nº	21/2024
FIRMA EMPREITERA:			Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.						Ano	2024	DATA:	14/02/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido		
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0002		102,65	-		
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-		
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-		
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,72		0,0002		15,52	-		
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-		
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,25		0,0002		45,33	-		
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-		
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00		0,0001		30,70	-		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0022		912,16	-		
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-		
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-		
	10.3.2		CONTRAPISO		-				-	-		
	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	145,90		0,0168		48,27	-		



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 1ª

Mês Jun

SAM 74

Lote 5

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 21/2024

DATA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - São Luiz

FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	206,83		0,1351		274,42	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS VIBROPRENSADAS. ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII	M2	112,90		0,0269		100,23	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO ASSETADO COM ACII - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	145,90		0,0405		116,65	-
7	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-
	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	177,32	100,00%	0,0161	1,61%	38,23	6.778,94
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	5,00	80,00%	0,0062	0,50%	522,79	2.091,16
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0036		1.515,86	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2,00	50,00%	0,0117	0,59%	2.457,72	2.457,72
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0108	1,08%	4.556,48	4.556,48
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0068		2.840,72	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	3,00	66,70%	0,0155	1,03%	2.177,76	4.357,70



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)
PARCELA	1ª

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Jun
SUBPROJETO:	PRAÇA - São Luiz	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	5
		Ano	2024

CONTRATO EMPREITADA:	
Nº	21/2024
DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
Valor Desta Medição:										

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 24/06/2024 17:15:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arg. Urb. CAU A9102039



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 26/06/2024 13:42:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

ROBSON
CANTU:441
43664968

Assinado digital por CANTU:441
Dados: 2024-06-26 14:26:25 -0300

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - São Luiz

CONVÊNIO : Nº. 611/2023

PAM

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

21/2024

420.267,54

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 5

MEDIÇÃO Nº: 1ª

DATA DA MEDIÇÃO : 14/06/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/05/2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2023

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	21.824,14	85,75%	21.824,14	18.715,19
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	6.401,17	9,60%	6.401,17	614,42
3	4	ESTRUTURAS		-	100,00%	945,70	945,70
4	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILACÃO		-		48.068,88	-
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5,00%	95,15	24,37%	1.903,18	463,90
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	5,00%	7.152,55	14,73%	143.051,00	21.070,62
7	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	20,00%	39.614,69	10,22%	198.073,47	20.242,00
8				-		-	-
9				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				75.087,70	TOTAL MEDIÇÃO		62.051,83

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$62.051,83

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 24/06/2024 17:15:55-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 26/06/2024 13:42:25-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ROBSON CANTU:441436649683664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968

Dados: 2024.06.26 14:26:57 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Rodrigo Pires Franco

Arq. Urb. CAU A9102039

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU

Medição 01

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
	18.715,19	85,75%
	614,42	9,60%
	945,70	100,00%
	-	
	463,90	24,37%
	21.070,62	14,73%
	20.242,00	10,22%
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
ATRASSO	Parcial	
Acumulado	Desta	
Med. Anterior	Medição	
-	62.051,83	

ROBSON
CANTU:44143664968

Assinado de forma digital por
ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.06.26 14:27:10 -03'00'

CO
O GUIBES
8/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 5 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	21/2024
Data da Vistoria:	14/06/2024

Objeto:


Revitalização da Praça São Luís, contendo: área de convivência, play-ground, espaço sacro e calçadas.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **14/02/2024** até **14/06/2024**.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 |



2 |

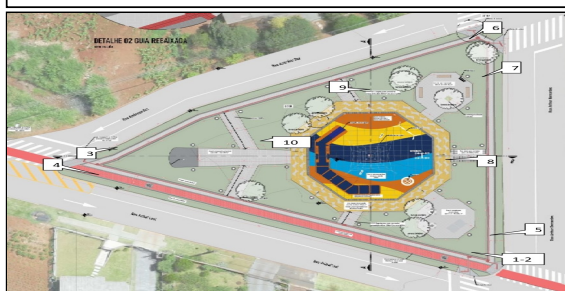

1 |



3 |



4 |



5 |



6 |



7 |




8 |



9 |



10 |



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/ote/19329/medicao/9555/relatorio-fotografico/130>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Medição 01

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES**
Data: 24/06/2024 09:53:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pato Branco, 21 de junho de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D















 EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO										ESTADO			
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)		
										Mês	Jul	PARCELA	2ª
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO								SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO:		PRAÇA - São Luiz								Lote	5	Nº	21/2024
FIRMA EMPREITERA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.								Ano	2024	DATA:	14/02/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS												OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido			
GLOBAL - LOTE 1													
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-								
	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	309,74	100,00%	0,0137	1,37%	18,57	5.751,87			
	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	105,10	100,00%	0,0002	0,02%	0,85	89,34			
	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	100,00%	0,0001	0,01%	1,92	28,80			
	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	100,00%			1,63	16,30			
	1.1.2		LOCACAO		-				-				
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	100,00%	0,0070	0,70%	73,50	2.940,00			
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-				
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-				
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	83,33%	0,0222	1,85%	1.554,47	7.772,35			
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-				
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0087	0,87%	3.671,01	3.671,01			
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS										
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-				
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-				
	100710	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9	M2	99,75	100,00%	0,0031	0,31%	0,00	077,74			

 EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO	
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)
									PARCELA	2ª
Município:							Mês	Jul	CONTRATO EMPREITADA:	
Subprojeto:							SAM	74	Nº	21/2024
Firma empreiteira:							Lote	5	DATA:	14/02/2024
							Ano	2024		
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										OR
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00	85,71%	0,0072	0,62%	17,33	2.599,50
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	24,62	73,86
	8.2.5		CABOS		-				-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	960,00		0,0110		4,80	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	117,36	117,36
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		84,67	-
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0001		46,98	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0005		207,63	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	29,00		0,0090		130,54	-
			QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO - METÁLICO - COM FLANGE - BINTADO							

 EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)		
									Mês	Jul		
									PARCELA	2ª		
MUNICÍPIO:									SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO:									Lote	5	Nº	21/2024
FIRMA EMPREITERA:									Ano	2024	DATA:	14/02/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										OR		
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido		
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0002		102,65	-		
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-		
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-		
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,72	100,00%	0,0002	0,02%	15,52	104,29		
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-		
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,25	100,00%	0,0002	0,02%	45,33	101,99		
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-		
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,70	30,70		
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0022	0,22%	912,16	912,16		
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							-		
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-		
	10.3.2		CONTRAPISO		-				-	-		
	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	145,90	100,00%	0,0168	1,68%	48,27	7.042,59		



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 2ª

Mês Jul

SAM 74

Lote 5

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 21/2024

DATA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - São Luiz

FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	206,83	100,00%	0,1351	13,51%	274,42	56.758,29
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS VIBROPRESSADAS. ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII	M2	112,90		0,0269		100,23	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO ASSETADO COM ACII - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	145,90		0,0405		116,65	-
7	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-
	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	177,32	100,00%	0,0161	1,61%	38,23	6.778,94
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	5,00	80,00%	0,0062	0,50%	522,79	2.091,16
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0036	0,36%	1.515,86	1.515,86
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2,00	50,00%	0,0117	0,59%	2.457,72	2.457,72
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0108		4.556,48	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0068	0,68%	2.840,72	2.840,72
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	3,00	100,00%	0,0155	1,55%	2.177,76	6.533,28



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)
PARCELA	2ª

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Jul
SUBPROJETO:	PRAÇA - São Luiz	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	5
		Ano	2024

CONTRATO EMPREITADA:	
Nº	21/2024
DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
									Valor Desta Medição:	


RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 12/08/2024 14:11:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 12/08/2024 15:10:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968


Assinado digitalmente
CANTU:44143664968
Dados: 2024/08/14 17:13:52

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A9102039

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - São Luiz

CONVÊNIO : Nº. 611/2023

PAM

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 21/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 420.267,54

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 5

MEDIÇÃO Nº: 2ª

DATA DA MEDIÇÃO : 25/07/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/05/2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2023

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	21.824,14	92,88%	21.824,14	20.269,67
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	6.401,17	100,00%	6.401,17	6.401,17
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	945,70	100,00%	945,70	945,70
4	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	20,00%	9.613,77	80,18%	48.068,88	38.543,22
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10,00%	190,31	94,61%	1.903,18	1.800,53
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	15,00%	21.457,65	67,58%	143.051,00	96.679,33
7	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	35,00%	69.325,71	69,27%	198.073,47	137.210,30
8				-		-	-
9				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				129.758,45		TOTAL MEDIÇÃO	301.849,92

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO (R\$)	(%)
18715,19	1.554,48	7,12%
614,42	5.786,75	90,40%
945,70	-	-
	38.543,22	80,18%
463,90	1.336,63	70,23%
21070,62	75.608,71	52,85%
20242,00	116.968,30	59,05%
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
OK	Parcial	
Acumulado	Destá	
Med. Anterior	Medição	
62.051,83	239.798,09	

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$239.798,09

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

 **RODRIGO PIRES FRANCO**
Data: 12/08/2024 14:11:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 **ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES**
Data: 12/08/2024 15:10:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968
664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968

Dados: 2024.08.12 17:13:36 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A9102039

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medicação:	74 / 5 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	21/2024
Data da Vistoria:	30/07/2024


Objeto:

Revitalização da Praça São Luís, contendo: área de convivência, play-ground, espaço sacro e calçadas.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **17/06/2024** até **25/07/2024**.

SERVIÇOS EXECUTADOS



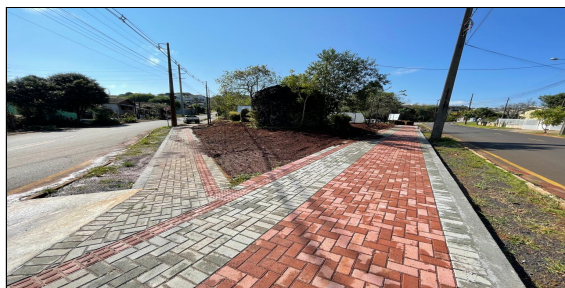

4 | PAVER




5 | REGULARIZAÇÃO TERRENO



6 | BANCOS E BEBEDOURO



7 | BANCOS E BEBEDOURO

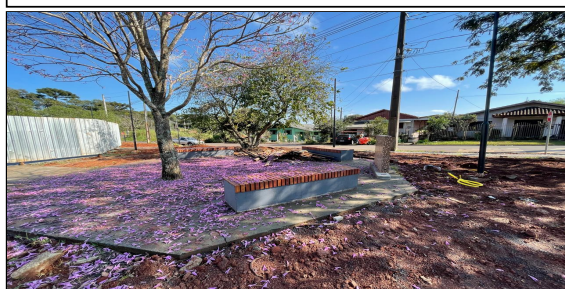

8 | BANCOS E BEBEDOURO



9 | BRINQUEDOS



10 | BRINQUEDOS



11 | BRINQUEDOS

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/ lote/19329/medicao/11631/relatorio-fotografico/287>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 31 de julho de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 31/07/2024 15:58:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



















EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 3ª

Mês Ago

SAM 74

Lote 5

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 21/2024

DATA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - São Luiz

FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	-------------	-------------------	---------	----------------	--------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-
	1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		-					-
	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	309,74	100,00%	0,0132	1,32%	18,57	5.751,87
	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	105,10	100,00%	0,0002	0,02%	0,85	89,34
	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	15,00	100,00%	0,0001	0,01%	1,92	28,80
	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	10,00	100,00%			1,63	16,30
	1.1.2		LOCACAO		-				-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	100,00%	0,0068	0,68%	73,50	2.940,00
	101206	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), AF_05/2020 FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H	m3	13,42	100,00%	0,0102	1,02%	331,60	4.450,07
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0215	2,15%	1.554,47	9.326,82
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0085	0,85%	3.671,01	3.671,01



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 3ª

Mês Ago

SAM 74

Lote 5

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 21/2024

DATA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - São Luiz

FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	643,60	100,00%	0,0141	1,41%	9,50	6.114,20
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00	100,00%	0,0070	0,70%	17,33	3.032,75
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS		-				-	-
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	24,62	73,86
	8.2.5		CABOS		-				-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	960,00	100,00%	0,0106	1,06%	4,80	4.608,00
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	117,36	117,36
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	84,67	84,67
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 3ª

Mês Ago

SAM 74

Lote 5

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 21/2024

DATA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - São Luiz

FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
89957		SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	187,49	187,49
9.3.12			ENTRADA DE AGUA		-				-	-
95635		SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0007	0,07%	297,61	297,61
95675		SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	166,29	166,29
95676		SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	102,65	102,65
9.3.16			TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-
9.3.16.2			INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-
89402		SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	6,72	100,00%	0,0002	0,02%	15,52	104,29
9.3.24			TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-
89714		SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	2,25	100,00%	0,0002	0,02%	45,33	101,99
9.3.26			EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-
89744		SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	30,70	30,70
x			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO		SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0021	0,21%	912,16	912,16

 EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO	
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)
									PARCELA	3ª
MUNICÍPIO:						Mês	Ago			
SUBPROJETO:						SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		
FIRMA EMPREITERA:						Lote	5	Nº		21/2024
						Ano	2024	DATA:		14/02/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	245,56	100,00%	0,0459	4,59%	81,12	19.919,83
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	88,75	100,00%	0,0178	1,78%	87,28	7.746,10
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	206,83	100,00%	0,1307	13,07%	274,42	56.758,29
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS VIBROPRENSADAS. ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII	M2	112,90	100,00%	0,0261	2,61%	100,23	11.315,97
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO ASSETADO COM ACII - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	145,90	100,00%	0,0392	3,92%	116,65	17.019,24
7	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							-
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	-
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-
	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	177,32	100,00%	0,0156	1,56%	38,23	6.778,94
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	M2	0,52	100,00%	0,0007	0,07%	615,25	319,93
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	5,00	100,00%	0,0060	0,60%	522,79	2.613,95
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME	UNID	1,00	100,00%	0,0035	0,35%	1.515,86	1.515,86



EFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

REGIONAL

Francisco Beltrão (P.A.)

Mês

Ago

PARCELA

3ª

MUNICÍPIO:

PATO BRANCO

SUBPROJETO:

PRAÇA - São Luiz

FIRMA EMPREITERA:

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

SAM

74

Lote

5

Ano

2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº

21/2024

DATA:

14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ESCORREGADOR + TÚNEL + ESCALADA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INCLUÍDO REVESTIMENTO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, ESCORREGADORES E AGARRAS DE RESINA - CONFORME PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,1945	19,45%	84.476,74	84.476,74

GLOBAL - LOTE 1

% PREVIST

47,80%

% EXECUTADO :

100,00%

SOMAS

434.281,90

OBSERVAÇÕES :

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

gov.br

Documento assinado digitalmente

RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 31/10/2024 14:20:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 04/11/2024 08:24:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968

Assinado digital por CANTU:44143664968

Dados: 2024-11-30 11:35:50 -03

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Rodrigo Pires Franco

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - São Luiz

CONVÊNIO : Nº. 611/2023

PAM

MARCO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 21/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 434.281,90

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 5

MEDICÇÃO Nº: 3ª

DATA DA MEDIÇÃO : 12/08/2024

PRazo DE EXECUÇÃO: 12/08/2024

PRazo DE VIGÊNCIA: 08/02/2025

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	21.824,14	120,39%	21.824,14	26.274,21	20269,67	6.004,54	27,51%
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	6.401,17	100,00%	6.401,17	6.401,17	6401,17	-	-
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	10.190,06	100,00%	10.190,06	10.190,06	945,70	9.244,36	90,72%
4	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	40,00%	19.227,55	100,00%	48.068,88	48.068,88	38543,22	9.525,66	19,82%
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	35,00%	666,11	100,00%	1.903,18	1.903,18	1800,53	102,65	5,39%
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	35,00%	50.067,85	100,00%	143.051,00	143.051,00	96679,33	46.371,67	32,42%
7	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	50,00%	99.196,70	100,00%	198.393,40	198.393,40	137210,30	61.183,10	30,84%
8				-		-	-		-	
9				-		-	-		-	
10				-		-	-		-	
11				-		-	-		-	
12				-		-	-		-	
TOTAL CRONOGRAMA				207.573,58		TOTAL MEDIÇÃO	434.281,90	OK	Parcial	
								Acumulado	Dest	
								Med. Anterior	Medição	
								301.849,92	132.431,98	

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$132.431,98

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

 RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 31/10/2024 14:20:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 04/11/2024 08:24:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968

Dados: 2024.11.04 11:32:53 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Rodrigo Pires Franco

Arq. Urb. CAU A9102039

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU

Página 1 de 1

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 5 / 3
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	21/2024
Data da Vistoria:	30/08/2024

Objeto:


Revitalização da Praça São Luís, contendo: área de convivência, play-ground, espaço sacro e calçadas.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **26/07/2024** até **30/08/2024**.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | DETALHE DA PLACA

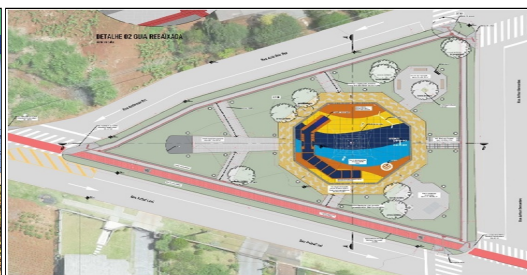


14 | Mapa




2 | PAVER E GRAMAS



3 | Piso e Paver

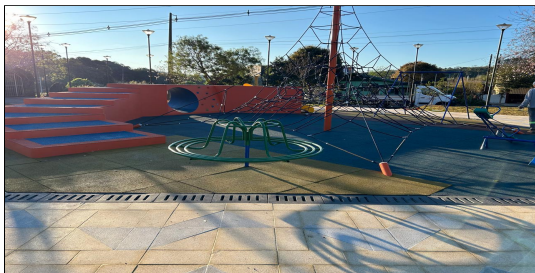

4 | Brinquedos

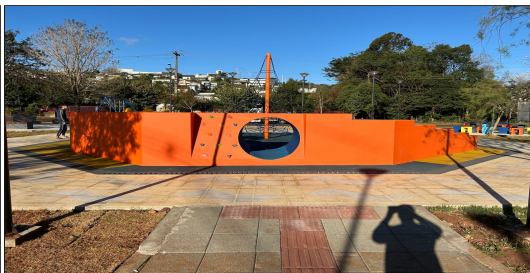

5 | Brinquedos



6 | BANCOS E BEBEDOURO



7 | Pisos



8 | Calçada e gramado



9 | Calçadas e gramado



10 | mesas



11 | Calçadas e mesas



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lot/19329/medicao/12434/relatorio-fotografico/1000>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 07 de outubro de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D

**PARANACIDADE**

Documento assinado eletronicamente por:
Antonio Alexandre Otto Guibes (07/10/2024 14:52:53)

Nome/controlado do arquivo:
2024100714525340.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024100714525340>

