

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Contrato 19/2024	180	09/02/2024	R\$ 288.652,40	100,00%

Nº6/2024
Data Inicial: 09/02/2024

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARQUE DO SOM

R\$ 288.652,40

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

68958

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1858	2024	26/02/2024	12433
8366	2024	20/06/2024	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1132	580522	26/02/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	17**2*1**79**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	13**7*6*	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	17**2*3**91**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32855	R\$ 326.308,37	27/09/2023	
Contrato	19	2024	76.995.448/0001-54	32856	R\$ 288.652,40	08/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32904	Medição	1	Jurisdicionado	27/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	0,10%
32933	Medição	2	Jurisdicionado	11/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	25,58%
32980	Medição	3	Jurisdicionado	28/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	25,58%
33026	Medição	4	Jurisdicionado	28/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	25,58%

33063	Medição	5	Jurisdicionado	29/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	66,28%
33098	Medição	6	Jurisdicionado	27/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	66,28%
33123	Medição	7	Jurisdicionado	25/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	100,00%
33156	Medição	8	Jurisdicionado	28/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2024	100,00%
33195	Conclusão	9	Jurisdicionado	18/11/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900180773872					

Nº6/2024
Data Inicial: 09/02/2024

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PARQUE DO SOM

Documentos

R\$ 288.652,40

Planilha Base

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL							
Município:	PATO BRANCO -PR					SAM	74
Projeto:	PRAÇA PARQUE DO SOM					LOTE nº	3
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração							27/09/2023 - Wed
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			
				QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					42,634.49
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.2		LOCACAO					
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107.25	83.09	8,911.40	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS	0	-	-	-	
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA	0	-	-	-	
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS	0	-	-	-	
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100.00	174.82	17,482.00	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6.00	1,757.26	10,543.56	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1.00	3,671.01	3,671.01	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA	0	-	-	-	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	774.12	0.52	402.54	
COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA	M	37.00	22.22	822.14	
COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	104.00	7.71	801.84	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	3,079.64
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL	0	-	-	-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	275.46	11.18	3,079.64	
4		ESTRUTURAS	0	-	-	-	1,272.38
4.4		LASTROS	0	-	-	-	
4.4.2		CONCRETO SIMPLES	0	-	-	-	
100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9.64	131.99	1,272.38	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	-	-	-	55,164.79
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS	0	-	-	-	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES	0	-	-	-	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS	0	-	-	-	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335.00	19.59	6,562.65	
91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50.00	17.20	860.00	
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100.00	22.39	2,239.00	
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS	0	-	-	-	
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.00	21.18	63.54	

Planilha Base

91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500.00	5.43	2,715.00	
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45.00	20.15	906.75	
8.2.8		CAIXAS	0	-	-	-	
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1.00	132.67	132.67	
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA	0	-	-	-	
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	938.35	938.35	
8.2.11		DISJUNTORES	0	-	-	-	
8.2.11.1		MONOPOLARES	0	-	-	-	
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	17.54	17.54	
8.2.11.2		BIPOLARES	0	-	-	-	
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	77.17	77.17	
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.00	95.72	191.44	
8.2.21		REATORES E OUTROS	0	-	-	-	
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.00	53.11	53.11	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	-	-	-	
16.105.000032.SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1.00	3,075.42	3,075.42	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6.00	121.97	731.82	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	4.50	73.95	332.77	
COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	234.72	234.72	
COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14.00	147.57	2,065.98	
COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=4,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13.00	2,425.26	31,528.38	
COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM	UNID	1.00	1,586.29	1,586.29	
COMPOSIÇÃO 24	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12.00	59.42	713.04	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	0	-	-	-	2,323.02
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	0	-	-	-	
9.3.12		ENTRADA DE AGUA	0	-	-	-	
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1.00	336.43	336.43	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1.00	187.98	187.98	
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1.00	116.04	116.04	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA	0	-	-	-	
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	0	-	-	-	
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9.65	17.54	169.26	
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	0	-	-	-	
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3.00	13.38	40.14	
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2.00	18.42	36.84	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	
		TUBO PVC, SERIE NORMAL, 500000 PRESSÃO, DN 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE					

Planilha Base

89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1.00	34.70	34.70
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS	0	-	-	-
COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	1,031.16	1,031.16
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	0	-	-	-
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS	0	-	-	-
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO	0	-	-	-
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	150.54	76.16	11,465.13
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73.02	83.14	6,070.88
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	0	-	-	-
COMPOSIÇÃO 3	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	275.46	123.05	33,895.35
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	0	-	-	-
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO	0	-	-	-
11.1.2		REGULARIZACAO		-	-	-
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	483.46	3.19	1,542.24
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-	-	-
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	94.00	55.25	5,193.50
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-
11.2.2		PLANTAS		-	-	-
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	16.00	126.18	2,018.88
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	296.97	16.50	4,900.01
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1.00	108.27	108.27
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1.00	97.20	97.20
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	13.77	137.14	1,888.42
810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	179.05	24.74	4,429.70
605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1.00	590.99	590.99
COMPOSIÇÃO 9	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	1.00	2,778.34	2,778.34
COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1.00	3,211.30	3,211.30
COMPOSIÇÃO 25	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTÍNUO EM "S"(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E ILUMINAÇÃO	M	19.29	1,882.70	36,317.28
COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	6.00	2,461.86	14,771.16
COMPOSIÇÃO 28	COMPOSIÇÃO	PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	91,442.13	91,442.13
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-

1,113.27

Planilha de Contrato

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - Marcio Galina Construção civil e Materiais de Construção Eireli											
Município: PATO BRANCO - PR		CNPJ: 16.700.335/0001-52		SAM		68					
Projeto: PRAÇA PARQUE DO SOM				LOTE nº		1		27/09/2023 - qua			
Tabela de referência SINAPI de 1º de fevereiro de 2023, sem desoneração											
CODIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS		
Materiais de Construção											
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								37.714,49	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.2		LOCACAO									
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	67,70	83,09	107,25	73,50	7.883,03			
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS									
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA									
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS									
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	142,43	174,82	100,00	154,65	15.464,58			
1.2.2		BARRACAO DE OBRA									
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	1.431,69	1.757,26	6,00	1.554,47	9.326,83			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICACAO / LETREIRO									
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇAO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	2.990,88	3.671,01	1,00	3.247,38	3.247,38			
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIÁMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	0,42	0,52	774,12	0,46	356,09			
COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MÓRÕES E TELA	M	18,10	22,22	37,00	19,66	727,27			
COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,28	7,71	104,00	6,82	709,31			
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS								2.724,25	
2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL									
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	9,11	11,18	275,46	9,89	2.724,25			
4		ESTRUTURAS								1.125,55	
4.4		LASTROS									
4.4.2		CONCRETO SIMPLES									
100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	107,54	131,99	9,64	116,76	1.125,55			
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO								48.798,78	
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS									
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES									
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS									
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,96	19,59	335,00	17,33	5.805,32			
91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,01	17,20	50,00	15,22	760,76			
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,24	22,39	100,00	19,81	1.980,62			
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS									
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,26	21,18	3,00	18,74	56,21			
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,67	27,83	5,00	24,62	123,09			
8.2.5		CABOS									
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V									
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,42	5,43	500,00	4,80	2.401,69			
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,42	20,15	45,00	17,82	802,11			
8.2.8		CAIXAS									


E-mail: mg.construcaoocivil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Marcio Galina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

Planilha de Contrato

97981	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	108,09	132,67	1,00	117,36	117,36
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-	-	-	-	-
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	764,50	938,35	1,00	830,06	830,06
8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-	-	-
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,29	17,54	1,00	15,52	15,52
8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-	-	-
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	62,87	77,17	1,00	68,26	68,26
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	77,99	95,72	2,00	84,67	169,35
8.2.21		REATORES E OUTROS		-	-	-	-	-
101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	43,27	53,11	1,00	46,98	46,98
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-
16.105.000032.SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2.505,64	3.075,42	1,00	2.720,52	2.720,52
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	98,37	121,97	6,00	107,89	647,37
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	60,25	73,95	4,50	65,42	294,37
COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	191,23	234,72	1,00	207,63	207,63
COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	120,23	147,57	14,00	130,54	1.827,57
COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=1,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.975,93	2.425,26	13,00	2.145,38	27.890,00
COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM	UNID	1.292,40	1.586,29	1,00	1.403,23	1.403,23
COMPOSIÇÃO 24	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR SW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	48,41	59,42	12,00	52,56	630,76
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-	-	-	-	2.054,95
9.3		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-	-	-	-	-
9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA		-	-	-	-	-
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	274,10	336,43	1,00	297,61	297,61
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	153,15	187,98	1,00	166,29	166,29
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	94,54	116,04	1,00	102,65	102,65
9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		-	-	-	-	-
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,29	17,54	9,65	15,52	149,73
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,90	13,38	3,00	11,84	35,51
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,01	18,42	2,00	16,29	32,59
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	41,75	51,24	1,65	45,33	74,79
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-	-	-	-	-
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,12	35,74	8,00	31,62	252,92
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,27	34,70	1,00	30,70	30,70
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-	-	-	-	-
COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	840,12	1.031,16	1,00	912,16	912,16
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	45.496,18
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-	-	-	-	-
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-	-	-	-	-
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COB. NATURAL DE 20 X 10, COM ESPESURA 6 CM AF_10/2022	M2	92,95	110,94	150,54	67,37	10.142,05

[Handwritten signature and initials]



Planilha de Contrato

93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	67,74	83,14	73,02	73,55	5.370,30
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS								
COMPOSIÇÃO 3	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	100,25	123,05	275,46	108,85	29.983,83
11.1 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								
11.1.1 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO								
11.1.2 - REGULARIZAÇÃO								
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2,60	3,19	483,46	2,82	1.364,26
11.1.3 - MEIO-FIO E SARJETAS								
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	45,01	55,25	94,00	48,87	4.594,17
11.2 - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								
11.2.2 - PLANTAS								
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	102,80	126,18	16,00	111,62	1.785,90
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	13,44	16,50	296,97	14,60	4.334,54
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	88,21	108,27	1,00	95,78	95,78
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	73,19	97,20	1,00	85,98	85,98
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	111,73	137,14	13,77	121,31	1.670,49
810250E	DER-PR fev/23	Fiscalização de concreto - (9x19x39cm-0,017m3/m)	M	20,16	24,74	179,05	21,89	3.918,51
605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTEL (NBR 9050)	UN	481,50	590,99	1,00	522,79	522,79
COMPOSIÇÃO 9	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2.263,60	2.778,34	1,00	2.457,72	2.457,72
COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	2.616,34	3.211,30	1,00	2.840,72	2.840,72
COMPOSIÇÃO 25	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTÍNUO EM "S" (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E ILUMINAÇÃO	M	1.533,89	1.882,70	19,29	1.665,44	32.126,27
COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M. REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	2.005,75	2.461,86	6,00	2.177,76	13.066,57
COMPOSIÇÃO 28	COMPOSIÇÃO	PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	74.500,68	91.442,13	1,00	80.889,71	80.889,71
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						
12.1		LIMPEZAS						
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS						
98814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2,27	2,79	399,02	2,47	984,79
TOTAL GERAL								
								268.652,40

E-mail: mg.construcaoocivil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Marcio Galina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR













**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO**

ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop		
				Mês		Abr		PARCELA		1ª		
				SAM		74		CONTRATO EMPREITADA:				
				Lote		3		Nº		19/2024		
				Ano		2024		DATA:		09/02/2024		
								DATA				
MUNICÍPIO:								PATO BRANCO				
SUBPROJETO:								PRAÇA - Parque do Som				
FIRMA EMPREITEIRA:								Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.				
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS												
ORÇAMENTO												
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,25	80,00%	0,0273	2,18%	73,50	6.306,30	7.882,88	1.576,58
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-					-	-	
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-					-	-	
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-					-	-	
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	100,00%	0,0536	5,36%	154,65	15.465,00	15.465,00	
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-					-	-	
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	33,33%	0,0323	1,08%	1.554,47	3.108,63	9.326,82	6.218,19
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-					-	-	
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇAO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0113	1,13%	3.247,38	3.247,38	3.247,38	
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-					-	-	
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	774,12	100,00%	0,0012	0,12%	0,46	356,10	356,10	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA	M	37,00	100,00%	0,0025	0,25%	19,66	727,41	727,41	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	104,00	100,00%	0,0025	0,25%	6,82	709,28	709,28	
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-					-	-	
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-					-	-	
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	275,46		0,0094		9,89	-	2.724,30	2.724,30
3	4		ESTRUTURAS							-	-	
	4.4		LASTROS		-					-	-	
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-					-	-	
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9,64		0,0039		116,76	-	1.125,57	1.125,57
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							-	-	
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-					-	-	
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-					-	-	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ				
									REGIONALFrancisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃOAmsop			
									Mês	Abr	PARCELA1ª	DATA11/04/2024 - qui	
MUNICÍPIO:									SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEN DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:									Lote	3	Nº19/2024	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA:									Ano	2024	DATA:09/02/2024	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0026	0,26%	15,22	761,00	761,00	-	
	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00		0,0069		19,81	-	1.981,00	1.981,00	
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-	-	-	
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00		0,0002		18,74	-	56,22	56,22	
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00		0,0004		24,62	-	123,10	123,10	
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-	
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-	
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00		0,0083		4,80	-	2.400,00	2.400,00	
	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00		0,0028		17,82	-	801,90	801,90	
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-	
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00		0,0004		117,36	-	117,36	117,36	
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-	
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0029		830,06	-	830,06	830,06	
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-	
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-	
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0001		15,52	-	15,52	15,52	
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-	
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0002		68,26	-	68,26	68,26	
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,0006		84,67	-	169,34	169,34	
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-	
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00		0,0002		46,98	-	46,98	46,98	
	v		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE										

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	1ª	DATA	11/04/2024 - qui
MUNICÍPIO:									CONTRATO EMPREITADA:			
SUBPROJETO:									Nº			
FIRMA EMPREITEIRA:									DATA:			
Mês									Abr			
SAM									74			
Lote									3			
Ano									2024			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6,00	10,00%	0,0022	0,02%	107,89	64,73	647,34	582,61
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	4,50	10,00%	0,0010	0,01%	65,42	29,44	294,39	264,95
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0007		207,93	-	207,93	207,93
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00		0,0063		130,54	-	1.827,56	1.827,56
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=4,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00		0,0966		2.145,38	-	27.889,94	27.889,94
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRACA PARQUE DO SOM	UNID	1,00		0,0049		1.403,23	-	1.403,23	1.403,23
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00		0,0022		52,56	-	630,72	630,72
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS						-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA						-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0010	0,10%	297,61	297,61	297,61	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	166,29	166,29	166,29	-
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00		0,0004		102,65	-	102,65	102,65
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA						-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO						-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,65		0,0005		15,52	-	149,77	149,77
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA						-	-	-	-
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00		0,0001		11,84	-	35,52	35,52
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00		0,0001		16,29	-	32,58	32,58
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS						-	-	-	-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,65		0,0003		45,33	-	74,79	74,79
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO						-	-	-	-
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00		0,0009		31,62	-	252,96	252,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ			
									REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO Amsop	
									Mês	Abr	PARCELA 1ª	DATA 11/04/2024 - qui
MUNICÍPIO: PATO BRANCO									SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO: PRAÇA - Parque do Som									Lote	3	Nº 19/2024	Nº
FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.									Ano	2024	DATA: 09/02/2024	DATA
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0032		912,16	-	912,16	912,16
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	150,54		0,0351		67,37	-	10.141,88	10.141,88
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,02		0,0186		73,55	-	5.370,62	5.370,62
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	275,46		0,1039		108,85	-	29.983,82	29.983,82
7	11		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		-				-	-	-	-
	11.1.2		REGULARIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	483,46		0,0047		2,82	-	1.363,36	1.363,36
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	94,00		0,0159		48,87	-	4.593,78	4.593,78
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF_05/2018	UN	16,00		0,0062		111,62	-	1.785,92	1.785,92
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	296,97		0,0150		14,60	-	4.335,76	4.335,76
	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	95,78	95,78	95,78	-
	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.20 M E MENOR QUE 0.40 M. AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	84,53	84,53	84,53	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO								ESTADO DO PARANÁ						
								REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO Amsop					
								Mês	Abr	PARCELA 1ª	DATA 11/04/2024 - qui			
MUNICÍPIO: PATO BRANCO								SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:			ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: PRAÇA - Parque do Som								Lote	3	Nº 19/2024			Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.								Ano	2024	DATA: 09/02/2024			DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO						
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0085		2.457,72	-	2.457,72	2.457,72		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00		0,0098		2.840,72	-	2.840,72	2.840,72		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTÍNUO EM "S" (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E LIMPEZA	M	19,29	81,64%	0,1113	9,09%	1.665,44	26.227,94	32.126,34	5.898,40		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA	UNID	6,00	34,98%	0,0453	1,58%	2.177,76	4.570,68	13.066,56	8.495,88		
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	11,00%	0,2802	3,08%	80.889,71	8.897,87	80.889,71	71.991,84		
8	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	-		
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-	-	-		
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	-		
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	399,02		0,0034		2,47	-	985,58	985,58		
									-	-	-	-		
									-	-	-	-		
GLOBAL - LOTE 1					% PREVISTO	25,21%	% EXECUTADO :		25,58%	SOMAS	73.836,49	288.652,40	214.815,91	
OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$288.652,40			
									Medição Acumulada:		73.836,49			
									Total Anterior:		-			
									Valor Desta Medição:		R\$73.836,49			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														
_____ Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de  PREF. MUN. DE PATO BRANCO _____ EDUARDO CHIOQUETA PREFEITO DE PATO BRANCO														



Rua Araribóia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

PROJETO/LOTE: Nº 74 / LOTE 03

PROGRAMA: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

**CONTRATADA: MÁRCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

CONTRATO Nº 19/2024

OBJETO

Revitalização da Praça Parque do Som, na Rua Araribóia, Lote 01 – Quadra 1174 – Bairro Parque do Som. Contendo: área de convivência, pergolado e áreas de jogos e paisagismo. Serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações, estruturas, instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimento de paredes e piso, impermeabilizações, pinturas e argamassa, pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto.

MEDIÇÃO Nº 01

DATA DA VISTORIA: 11/04/2024

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 09/02/2024 até 11/04/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS (mínimo 08 fotos neste relatório, as demais fotos devem estar no Portal dos Municípios - Fotos - Mínimo 8 em formato jpg)




Rua Ararigóia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



F1: PLACA DA OBRA ATUALIZADA (FOTO OBRIGATÓRIA)



F2: DETALHE DA PLACA DA OBRA (QRCODE) (FOTO OBRIGATÓRIA)

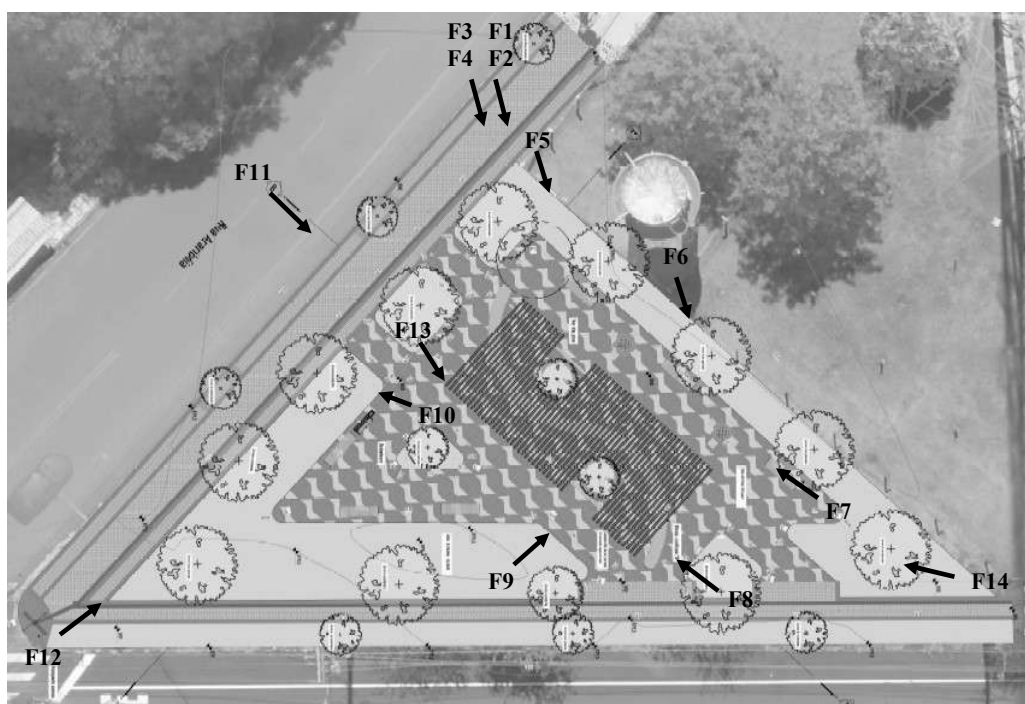

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



F3: POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA



F4: MEDIDOR DE ENTRADA DE ENERGIA



F5: BANCO EM FORMATO DE S, ESTRUTURA DO PERGOLADO



F6: MONTAGEM DOS BANCOS DE CONCRETO



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



F7: MONTAGEM DOS BANCOS DE CONCRETO



F8: BANCO DE CONCRETO EM S



F9: BANCO EM FORMATO DE S, ESTRUTURA DO PERGOLADO



F10: ENTRADA DE ÁGUA, CONTAINER



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



F11: PLACA DE OBRA, TAPUME



F12: TAPUME



F13: ELETRODUTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharia@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br



F14: FOTO PANORÂMICA

Pato Branco, 11 de abril de 2024.

JORGE EDUARDO
CHIOQUETA:05149671
967

Assinado de forma digital por
JORGE EDUARDO
CHIOQUETA:05149671967
Dados: 2024.04.15 11:19:23 -03'00'

Assinado eletronicamente

Jorge Eduardo Chioqueta
CREA-PR 125.426/D
ART de fiscalização: 1720241337961















PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 2ª

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 19/2024

DATA: 09/02/2024

Mês	Jul
SAM	74
Lote	3
Ano	2024

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som
FIRMA EMPREITEIRA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇ

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	--------------	-------------------	---------	----------------	--------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							-
	1.1.2		LOCACAO							-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,25	100,00%	0,0273	2,73%	73,50	7.882,88
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							-
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA							-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS							-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	100,00%	0,0536	5,36%	154,65	15.465,00
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA							-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	83,33%	0,0323	2,69%	1.554,47	7.772,35
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0113	1,13%	3.247,38	3.247,38
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA							-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	774,12	100,00%	0,0012	0,12%	0,46	356,10
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA	M	37,00	100,00%	0,0025	excesso	19,66	727,41
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	104,00	100,00%	0,0025	0,25%	6,82	709,28
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 2ª

Mês Jul

SAM 74

CONTRATO EMPREITADA:

Lote 3

Nº 19/2024

Ano 2024

DATA: 09/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - Parque do Som

FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇ

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0026	0,26%	15,22	761,00
	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00%	0,0069	0,69%	19,81	1.981,00
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	18,74	56,22
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	100,00%	0,0004	0,04%	24,62	123,10
	8.2.5		CABOS		-				-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00		0,0083		4,80	-
	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00		0,0028		17,82	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	117,36	117,36
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0029	0,29%	830,06	830,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 2ª

Mês Jul

SAM 74

Lote 3

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 19/2024

DATA: 09/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - Parque do Som

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇ

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6,00	100,00%	0,0022	0,22%	107,89	647,34
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	4,50	100,00%	0,0010	0,10%	65,42	294,39
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00		0,0007		207,93	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00	100,00%	0,0063	0,63%	130,54	1.827,56
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=4,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00		0,0966		2.145,38	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRACA PARQUE DO SOM	UNID	1,00	20,00%	0,0049	0,10%	1.403,23	280,65
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00		0,0022		52,56	-
5	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			-			-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA			-			-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0010	0,10%	297,61	297,61
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	166,29	166,29
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00		0,0004		102,65	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA			-			-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO			-			-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,65	100,00%	0,0005	0,05%	15,52	149,77
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA			-			-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 2ª

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 19/2024

DATA: 09/02/2024

Mês Jul

SAM 74

Lote 3

Ano 2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - Parque do Som

FIRMA EMPREITERA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇ

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0032	0,32%	912,16	912,16
6	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	150,54		0,0351		67,37	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,02		0,0186		73,55	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	275,46	19,97%	0,1039	2,07%	108,85	5.986,75
7	11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-				-	-
	11.1.2		REGULARIZAÇÃO		-				-	-
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	483,46	56,98%	0,0047	0,27%	2,82	776,80
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-
	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	94,00		0,0159		48,87	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 2ª

Mês Jul

SAM 74

Lote 3

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 19/2024

DATA: 09/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

SUBPROJETO: PRAÇA - Parque do Som

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇ

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	90,00%	0,0085	0,77%	2.457,72	2.211,95
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	62,00%	0,0098	0,61%	2.840,72	1.761,25
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTÍNUO EM "S"(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E TILIMINACÃO	M	19,29	90,98%	0,1113	10,13%	1.665,44	29.228,47
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA	UNID	6,00	92,00%	0,0453	4,17%	2.177,76	12.021,24
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	99,00%	0,2802	27,74%	80.889,71	80.080,81
8	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	399,02		0,0034		2,47	-
									-	-
									-	-
									-	-

GLOBAL - LOTE 1

% PREVIST

38,37%

% EXECUTADO :

66,28%

SOMAS

191.325,42

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:

Medição Acumulada:

Total Anterior:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO
PROJETO : PRAÇA - Parque do Som
CONVÊNIO :Nº. 611/2023 PAM

MEDICÃO Nº: 2
DATA DA MEDIÇÃO : 29/07/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/08/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/02/2025

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
CONTRATO EMPREITADA Nº : 19/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO : 288.652,40
SAM : Nº. 74
LOTE : Nº. 3

DATA : 09/02/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS
Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	37.714,87	95,88%	37.714,87	36.160,40
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	2.724,30	100,00%	2.724,30	2.724,30
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	1.125,57	100,00%	1.125,57	1.125,57
4	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	20,00%	9.759,58	31,65%	48.797,92	15.444,75
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10,00%	205,50	95,00%	2.055,03	1.952,38
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	15,00%	6.824,44	13,16%	45.496,32	5.986,75
7	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	35,00%	52.413,48	85,43%	149.752,81	127.931,27
8	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		985,58	-
9				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
		TOTAL CRONOGRAMA		110.767,74		TOTAL MEDIÇÃO	191.325,42

Importa a presente medição no valor total de R\$ **R\$117.488,93**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 06/08/2024 13:48:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE EDUARDO CHIOQUETA
Data: 02/08/2024 12:06:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON
CANTU:441436
64968
Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.08.07 08:42:51 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de
Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
Fiscal: Jorge Eduardo Chioqueta
ENGº CIVIL - CREA PR-125.425/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 3 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	19/2024
Data da Vistoria:	30/07/2024

Objeto:

Revitalização da Praça Parque do Som, contendo: Área de convivência, Pergolado e área de jogos e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 12/04/2024 até 29/07/2024.


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | Placa de obra



2 | Detalhe da placa de obra

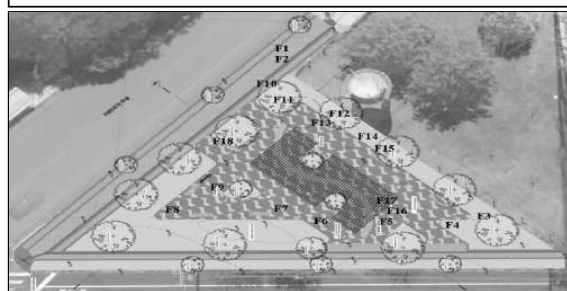

Mapa de localização das fotos



3 | bancos e mesa de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas



4 | base para piso permeável, instalações elétricas



5 | banco de concreto, pergolado, instalações elétricas




6 | piso permeável



7 | piso permeável, bancos de concreto, instalações elétricas



8 | base para piso permeável, instalações elétricas

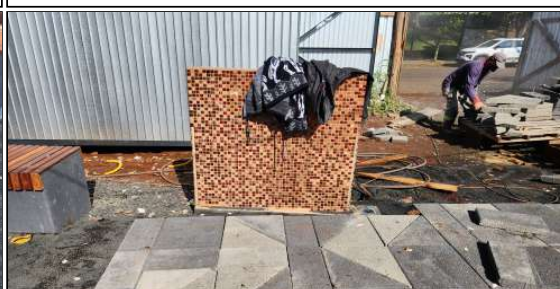

9 | mureta do lavatório




10 | mureta da entrada de energia, quadro de entrada de energia



11 | bancos de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas



12 | base para piso permeável, banco de concreto

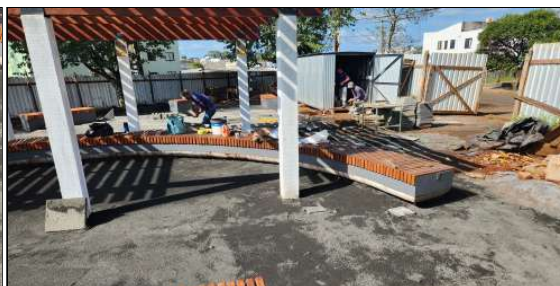

13 | bancos de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas



14 | base para piso permeável, mesa de concreto



15 | bancos e mesa de concreto, pergolado, piso permeável, instalações elétricas




16 | banco de concreto



17 | instalações elétricas



18 | container, mureta do bebedouro, sumidouro



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/ lote/19327/medicao/10834/relatorio-fotografico/293>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 31 de julho de 2024.

Jorge Eduardo Chioqueta
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: CREA PR 125.426/D

Documento assinado digitalmente
 **JORGE EDUARDO CHIOQUETA**
Data: 31/07/2024 15:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>























 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ			
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
									PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
									Mês	Set		
MUNICÍPIO: PATO BRANCO					SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:			
SUBPROJETO: PRAÇA - Parque do Som					Lote	3	Nº	19/2024	Nº			
FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.					Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-
	1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		-					-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-					-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,25	100,00%	0,0273	2,73%	73,50	7.882,88	7.882,88	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-				-	-	-	-
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	100,00	100,00%	0,0536	5,36%	154,65	15.465,00	15.465,00	-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0323	3,23%	1.554,47	9.326,82	9.326,82	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0113	1,13%	3.247,38	3.247,38	3.247,38	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	774,12	100,00%	0,0012	0,12%	0,46	356,10	356,10	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA	M	37,00	100,00%	0,0025	excesso	19,66	727,41	727,41	-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	104,00	100,00%	0,0025	0,25%	6,82	709,28	709,28	-
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	275,46	100,00%	0,0094	0,94%	9,89	2.724,30	2.724,30	-
3	4		ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	9,64	100,00%	0,0039	0,39%	116,76	1.125,57	1.125,57	-
4	8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-				-	-	-	-

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ							
									REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A.)		ASSOCIAÇÃO		Amsop	
									PARCELA		3ª		DATA		16/09/2024 - seg	
MUNICÍPIO:				PATO BRANCO				SAM		74		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		
SUBPROJETO:				PRAÇA - Parque do Som				Lote		3		Nº		19/2024		
FIRMA EMPREITEIRA:				Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.				Ano		2024		DATA:		09/02/2024		
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0026	0,26%	15,22	761,00	761,00	-				
	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00%	0,0069	0,69%	19,81	1.981,00	1.981,00	-				
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-	-	-				
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	100,00%	0,0002	0,02%	18,74	56,22	56,22	-				
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	100,00%	0,0004	0,04%	24,62	123,10	123,10	-				
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-				
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	-				
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	100,00%	0,0083	0,83%	4,80	2.400,00	2.400,00	-				
	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	100,00%	0,0028	0,28%	17,82	801,90	801,90	-				
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-				
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	117,36	117,36	117,36	-				
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-				
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0029	0,29%	830,06	830,06	830,06	-				
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-				
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-				
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	15,52	15,52	15,52	-				
	8.2.11.2		BIPOLARES		-				-	-	-	-				
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	68,26	68,26	68,26	-				
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	100,00%	0,0006	0,06%	84,67	169,34	169,34	-				
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-				
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	46,98	46,98	46,98	-				
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE		-				-	-	-	-				

 PATO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO DO PARANÁ												
													REGIONAL	Francisco Beltrão (P.R.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop					
																		PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
																		Mês	Set		
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO							SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:								
SUBPROJETO:		PRAÇA - Parque do Som							Lote	3	Nº	19/2024	Nº								
FIRMA EMPREITEIRA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.							Ano	2024	DATA:	09/02/2024	DATA								
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO												
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato									
6		COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,0032	0,32%	912,16	912,16	912,16	-									
	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						-	-	-	-									
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-									
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-									
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	150,54	100,00%	0,0351	3,51%	67,37	10.141,88	10.141,88	-									
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,02	100,00%	0,0186	1,86%	73,55	5.370,62	5.370,62	-									
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-									
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	275,46	100,00%	0,1039	10,39%	108,85	29.983,82	29.983,82	-									
7	11		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-									
	11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		-				-	-	-	-									
	11.1.2		REGULARIZAÇÃO		-				-	-	-	-									
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	483,46	100,00%	0,0047	0,47%	2,82	1.363,36	1.363,36	-									
	11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-									
	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	94,00	100,00%	0,0159	1,59%	48,87	4.593,78	4.593,78	-									
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-									
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-									
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	100,00%	0,0062	0,62%	111,62	1.785,92	1.785,92	-									
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	296,97	100,00%	0,0150	1,50%	14,60	4.335,76	4.335,76	-									
	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	95,78	95,78	95,78	-									
	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	84,53	84,53	84,53	-									
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-									
			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) APLICADO EM																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO**

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Francisco Beltrão (P...	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	3ª	DATA	16/09/2024 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	19/2024	Nº	
DATA:	09/02/2024	DATA	

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	SAM	74
SUBPROJETO:	PRAÇA - Parque do Som	Lote	3
FIRMA EMPREITEIRA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0085	0,85%	2.457,72	2.457,72	2.457,72	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	100,00%	0,0098	0,98%	2.840,72	2.840,72	2.840,72	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTINUO EM "S"(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E ILUMINAÇÃO	M	19,29	100,00%	0,1113	11,13%	1.665,44	32.126,34	32.126,34	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA	UNID	6,00	100,00%	0,0453	4,53%	2.177,76	13.066,56	13.066,56	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	100,00%	0,2802	28,02%	80.889,71	80.889,71	80.889,71	
8	12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						-	-	-	
	12.1		LIMPEZAS		-				-	-	-	
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS		-				-	-	-	
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	399,02	100,00%	0,0034	0,34%	2,47	985,58	985,58	
									-	-	-	
									-	-	-	

GLOBAL - LOTE 1	% PREVIST	52,87%	% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	288.652,40	288.652,40	-
------------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-------	-------------------	-------------------	----------

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$288.652,40
	Medição Acumulada:	288.652,40
	Total Anterior:	191.325,40
	Valor Desta Medição:	R\$97.326,98

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 27/09/2024 09:09:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JORGE EDUARDO CHIOQUETA
 Data: 25/09/2024 10:10:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANGELA
PADOAN:06
223004907

Assinado de forma digital por ANGELA PADOAN:06223004907
Dados: 2024.10.02 14:41:34 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

PREFEITO DE PATO BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - Parque do Som

CONVÊNIO Nº. 611/2023 PAM

MEDIÇÃO Nº: 1

DATA DA MEDIÇÃO : 16/09/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 07/08/2024

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/02/2025

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 19/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 288.652,40

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 3

DATA : 09/02/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	37.714,87	100,00%	37.714,87	37.714,87
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	2.724,30	100,00%	2.724,30	2.724,30
3	4	ESTRUTURAS	100,00%	1.125,57	100,00%	1.125,57	1.125,57
4	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	40,00%	19.519,16	100,00%	48.797,92	48.797,92
5		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	35,00%	719,26	100,00%	2.055,03	2.055,03
6	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	35,00%	15.923,71	100,00%	45.496,32	45.496,32
7	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	50,00%	74.876,40	100,00%	149.752,81	149.752,81
8	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	100,00%	985,58	985,58
9				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				152.603,27	TOTAL MEDIÇÃO		288.652,40

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$97.326,98

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

 RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 27/09/2024 09:09:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 JORGE EDUARDO CHIOQUETA

Data: 25/09/2024 10:10:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANGELA

PADOAN:06

223004907

Assinado de forma digital por ANGELA PADOAN:06223004907

Dados: 2024.10.02 14:40:29 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
Fiscal: Jorge Eduardo Chioqueta
ENGº CIVIL - CREA PR-125.425/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 3 / 3
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	19/2024
Data da Vistoria:	16/09/2024

Objeto:

Revitalização da Praça Parque do Som, contendo: Área de conviência, Pergolado e área de jogos e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 30/07/2024 até 30/08/2024.


SERVIÇOS EXECUTADOS



2 | Placa de obra



3 | Detalhe da placa de obra

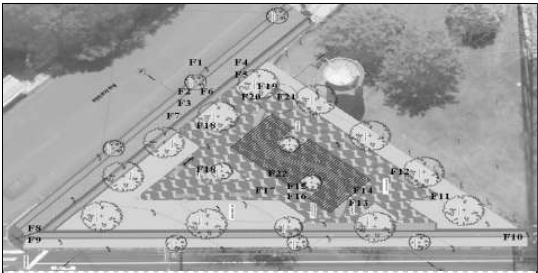

Mapa de localização das fotos



1 | execução de paver e plantio de árvores



4 | entrada de energia, quadro geral, mureta



5 | entrada de energia




6 | Execução de paver, plantio de grama



7 | Execução de paver, plantio de grama e arvores



8 | rampa de acessibilidade

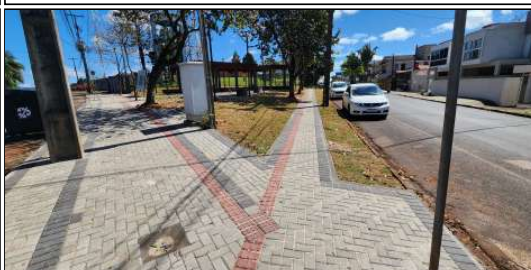

9 | Execução de paver, plantio de grama



10 | Execução de paver, plantio de grama e arvores




11 | banco de concreto, piso permeável, grama, pergolado



12 | mesas e bancos de concreto, grama, piso permeável



13 | pergolado, banco de concreto, piso permeável

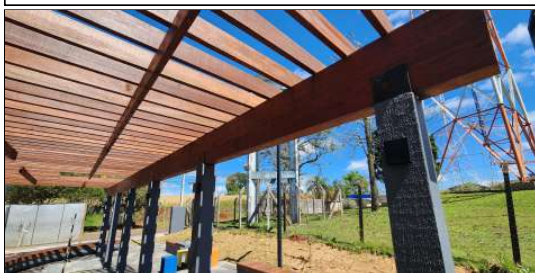

14 | pergolado, instalações elétricas



15 | instalações elétricas no banco



16 | piso permeável



17 | piso permeável, grama, bancos de concreto



18 | bebedouro, piso permeável, paver, grama



19 | piso permeável, bancos de concreto, mesa de concreto



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19327/medicao/12234/relatorio-fotografico/1155>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 18 de setembro de 2024.

Jorge Eduardo Chioqueta
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: CREA PR 125.426/D



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Jorge Eduardo Chioqueta (18/09/2024 16:38:25)

Nome/controlado do arquivo:
2024091816382533.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024091816382533>
