

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2024	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE Esta intervenção foi concluída	Contrato 20/2024	180	09/02/2024	R\$ 521.015,31	100,00%

Nº8/2024
Data Inicial: 09/02/2024

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE

R\$ 521.015,31

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

131917

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1856	2024	26/02/2024	12433
8367	2024	20/06/2024	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1132	580522	26/02/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.2*.6**-94	ART (CREA)	17**2*3**08**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	13**7*5*	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	17**2*3**93**	Orçamento	Sim
CPF	89*.0*.0**-34	ART (CREA)	17**2*2**89**	Fiscalização	Não

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32857	R\$ 588.984,10	27/09/2023	
Contrato	20	2024	76.995.448/0001-54	32858	R\$ 521.015,31	08/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32906	Medição	1	Jurisdicionado	27/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	0,10%
32949	Medição	2	Jurisdicionado	25/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	0,10%
32985	Medição	3	Jurisdicionado	28/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	0,10%
33017	Medição	4	Jurisdicionado	26/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	32,72%

33059	Medição	5	Jurisdicionado	25/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	74,79%
33094	Medição	6	Jurisdicionado	27/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	74,79%
33133	Medição	7	Jurisdicionado	27/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	74,79%
33149	Medição	8	Jurisdicionado	11/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	100,00%
33202	Medição	9	Jurisdicionado	27/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	100,00%
33225	Medição	10	Jurisdicionado	20/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	100,00%
33244	Medição	11	Jurisdicionado	28/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2024	100,00%
33253	Conclusão	12	Jurisdicionado	18/02/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900180776872					

Nº8/2024
Data Inicial: 09/02/2024

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVO HORIZONTE

Documentos

R\$ 521.015,31

Planilha Base

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL							
Município:	PATO BRANCO -PR					SAM	74
Projeto:	PRAÇA NOVO HORIZONTE					LOTE nº	4
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração							27/09/2023 - Wed
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			(R\$) - PM TOTAIS
				QUANT	UNIT	PM (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					33,271.61
1.1.2		LOCACAO					
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	222.47	83.09	18,485.04	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS	0	-	-	-	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6.00	1,757.26	10,543.56	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO	0	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1.00	3,671.01	3,671.01	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA	0	-	-	-	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1,100.00	0.52	572.00	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	18,873.77
2.1		MOVIMENTO DE TERRA	0	-	-	-	
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA	0	-	-	-	
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9.65	19.96	192.62	
101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	67.36	5.36	361.05	
2.1.5		ATERRO MECANIZADO	0	-	-	-	
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84.20	14.78	1,244.48	
2.1.6		REATERRO MECANIZADO	0	-	-	-	
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7.91	45.84	362.59	
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL	0	-	-	-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	180.00	11.18	2,012.40	
2.3.6		DRENOS COM TUBOS DE PVC	0	-	-	-	
102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	56.65	64.36	3,645.99	
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-	
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	50.65	86.32	4,372.11	
COMPOSIÇÃO 55	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO (ARGILA, COM TRANSPORTE ATÉ 10KM), ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	84.45	79.13	6,682.53	
3		FUNDACOES	0	-	-	-	1,626.32
3.9		RADIER / OUTROS		-	-	-	
07007	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA	M2	412.77	3.94	1,626.32	

Planilha Base

100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6.30	131.99	831.54	
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS	0	-	-	-	X
4.6.3		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS	0	-	-	-	X
4.6.3.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO	0	-	-	-	X
98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M	311.54	66.73	20,789.06	
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS	0	-	-	-	X
COMPOSIÇÃO 1	COMPOSIÇÃO	ESCADA EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UNID	1.00	16,800.04	16,800.04	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	0	-	-	-	16,370.32
5.1		ALVENARIA	0	-	-	-	X
5.1.12		ENCUNHAMENTO	0	-	-	-	X
103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	5.00	77.24	386.20	
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	0	-	-	-	X
COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	ALAMBRADO PARA MEIA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO H:4,0M E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	77.36	206.62	15,984.12	
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	0	-	-	-	1,502.05
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	0	-	-	-	X
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO	0	-	-	-	X
99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	10.30	145.83	1,502.05	
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	-	-	-	66,814.44
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0	-	-	-	X
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES	0	-	-	-	X
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS	0	-	-	-	X
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335.00	19.59	6,562.65	
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS	0	-	-	-	X
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.00	21.18	127.08	
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6.00	29.69	178.14	
8.2.5		CABOS	0	-	-	-	X
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V	0	-	-	-	X
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,005.00	8.25	8,291.25	
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV	0	-	-	-	X
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.00	6.03	48.24	
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50.00	12.59	629.50	
8.2.8		CAIXAS	0	-	-	-	X
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1.00	132.67	132.67	
8.2.11		DISJUNTORES	0	-	-	-	X
8.2.11.1		MONOPOLARES	0	-	-	-	X
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	17.54	17.54	
8.2.11.2		BIPOLARES	0	-	-	-	X
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00	77.17	77.17	

Planilha Base

92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2.00	74.55	149.10
8.2.21		REATORES E OUTROS	0	-	-	-
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.00	53.11	53.11
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	0	-	-	-
16.105.000032.SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1.00	3,075.42	3,075.42
COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	234.72	234.72
COMPOSIÇÃO 14	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67	UNID	18.00	1,421.32	25,583.76
COMPOSIÇÃO 15	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETORES LED 200W IP-67	UNID	6.00	2,989.92	17,939.52
COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24.00	147.57	3,541.68
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	0	-	-	-
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	0	-	-	-
9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA	0	-	-	-
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1.00	210.03	210.03
9.3.12		ENTRADA DE AGUA	0	-	-	-
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1.00	336.43	336.43
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾) , 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1.00	187.98	187.98
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1.00	116.04	116.04
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA	0	-	-	-
9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	0	-	-	-
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18.71	17.54	328.18
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15.70	51.24	804.46
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	0	-	-	-
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8.00	35.74	285.92
9.3.30		CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R	0	-	-	-
9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0	-	-	-
89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3.00	158.10	474.30
89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2.00	162.03	324.06
89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9.00	148.10	1,332.90
89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1.00	321.62	321.62
89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1.00	243.72	243.72
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS	0	-	-	-
COMPOSIÇÃO 16	COMPOSIÇÃO	CANAleta DE CONCRETO PARA DRENAGEM 30X35X60CM, INCLUI GRELHA DE CONCRETO FURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75.40	237.81	17,930.87

Planilha Base

87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20.75	9.13	189.45
10.1.3		EMBOCO	0	-	-	-
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20.75	70.50	1,462.88
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS	0	-	-	-
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO	0	-	-	-
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	130.28	76.16	9,922.13
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	74.48	83.14	6,192.26
10.3.12		PISO DE CONCRETO	0	-	-	-
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	238.90	45.81	10,944.01
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	412.77	113.61	46,894.80
10.4		PINTURAS	0	-	-	-
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA	0	-	-	-
10.4.16		PINTURA EM PISO	0	-	-	-
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	32.02	26.35	843.73
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	0	-	-	-
COMPOSIÇÃO 2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	115.20	98.67	11,366.79
COMPOSIÇÃO 3	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	64.80	123.05	7,973.64
COMPOSIÇÃO 4	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DILUENTE	M2	238.90	106.45	25,430.91
COMPOSIÇÃO 5	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	173.85	310.22	53,931.75
COMPOSIÇÃO 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M2	22.00	188.61	4,149.42
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	0	-	-	-
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO	0	-	-	-
11.1.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO	0	-	-	-
97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	311.54	0.54	168.24
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-
11.2.2		PLANTAS		-	-	-
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8.00	126.18	1,009.44
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	430.50	16.50	7,103.25
98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	1.00	233.07	233.07
98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	1.00	173.14	173.14
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	30.54	137.14	4,188.25
810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	297.00	24.74	7,347.78

Planilha Base

COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	1.00	2,799.74	2,799.74
605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4.00	590.99	2,363.96
COMPOSIÇÃO 7	COMPOSIÇÃO	MULTI CORDAS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	107,004.05	107,004.05
COMPOSIÇÃO 8	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.00	1,713.61	1,713.61
COMPOSIÇÃO 9	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	3.00	2,778.34	8,335.02
COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	1.00	5,150.89	5,150.89
COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	1.00	3,211.30	3,211.30
COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	1.00	46,893.61	46,893.61
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	384.00	0.76	291.84
x		TOTAL GERAL				588,984.10

Planilha de Contrato

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli													
Município: PATO BRANCO - PR		CNPJ: 16.700.335/0001-52						SAM		68			
Projeto: PRAÇA NOVO HORIZONTE								LOTE nº		1			
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração													
CODIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					UD	PU TAB	PU+BDI	QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS
ORÇAMENTO													
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											29.432,06
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.2		LOCALAÇÃO											
99059	SINAPI	LOCALAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018					M	67,70	83,09	222,47	73,50	16.351,86	
1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTIEIRO DE OBRAS											
1.2.2		BARRACAÇÃO DE OBRA											
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCALAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO					MES	1.431,69	1.757,26	6,00	1.554,47	9.326,83	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO											
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					UN	2.990,88	3.671,01	1,00	3.247,38	3.247,38	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018					M2	0,42	0,52	1.100,00	0,46	505,99	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS											
2.1		MOVIMENTO DE TERRA											
2.1.2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA											16.695,73
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021					M3	16,26	19,96	9,65	17,66	170,39	
101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M³), AF_07/2020					M3	4,37	5,36	67,36	4,74	319,38	
2.1.5		ATERRO MECANIZADO											
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					M3	12,04	14,78	84,20	13,07	1.100,86	
2.1.6		REATERRO MECANIZADO											
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016					M3	37,35	45,84	7,91	40,55	320,75	
2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS											
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTÊXTIL											
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021					M2	9,11	11,18	180,00	9,89	1.780,17	
2.3.6		DRENOS COM TUBOS DE PVC											
102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021					M	52,44	64,36	56,65	56,93	3.225,25	
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS											
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					M	70,33	86,32	50,65	76,36	3.867,57	
COMPOSIÇÃO 55	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO (ARGILA, COM TRANSPORTE ATÉ 10KM), ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.					M3	64,47	79,13	84,45	70,00	5.911,36	
3		FUNDAÇÕES											
3.9		RADIER / OUTROS											1.438,64
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021					M2	3,21	3,94	412,77	3,49	1.438,64	
4		ESTRUTURAS											
4.4		LASTROS											
4.4.2		CONCRETO SIMPLES											33.986,91

E-mail: mg.construocivil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

Planilha de Contrato

100022	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_07/2019	M3	107,54	131,99	6,30	116,76	735,58
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-
4.6.3		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS		-	-	-	-	-
4.6.3.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO		-	-	-	-	-
98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M	54,37	66,73	311,54	59,03	18.390,01
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	-	-
5	COMPOSIÇÃO	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UNID	13.687,50	16.800,04	1,00	14.861,32	14.861,32
5.1		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	-	-
5.1.12		ALVENARIA		-	-	-	-	-
103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	62,93	77,24	5,00	68,33	341,63
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	-	-
COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	ALAMBRAÇÃO PARA MEIA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO H4,0M E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	168,34	206,62	77,36	182,78	14.139,56
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-	-	-
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	-
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACAO		-	-	-	-	-
98855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	118,81	145,83	10,30	129,00	1.328,71
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	-	-
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-	-	-
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	-	-
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-	-	-	-	-
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,96	19,59	335,00	17,33	5.805,32
8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-	-	-	-	-
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,26	21,18	6,00	18,74	112,41
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,19	29,69	6,00	26,26	157,58
8.2.5		CABOS		-	-	-	-	-
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-	-	-	-	-
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,72	8,25	1.005,00	7,30	7.334,44
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	-	-
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,91	6,03	8,00	5,33	42,67
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,26	12,59	50,00	11,14	556,86
8.2.8		CAIXAS		-	-	-	-	-
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	108,09	132,67	1,00	117,36	117,36
8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-	-	-
8.2.11.1		MONOPOLARES		-	-	-	-	-
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,29	17,54	1,00	15,52	15,52
8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-	-	-
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	62,87	77,17	1,00	68,26	68,26
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	62,87	77,17	1,00	68,26	68,26
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	77,99	95,72	1,00	84,67	84,67
8.2.13		TOMADAS		-	-	-	-	-
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,74	74,55	2,00	65,95	131,89

Proc. Administrativo 20.389/2023 | Anexo: PROPOSTA MARGIO GALINA.pdf (15/36)

947/993

E-mail: mg.construocivil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Marcio Galina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

Planilha de Contrato

8.221	RELETORES E OUTROS	UN	43,27	53,11	1,00	46,98	-
101682	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	43,27	53,11	1,00	46,98	-
16.105.000032.SER	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	UN	2.505,64	3.075,42	1,00	2.720,52	2.720,52
COMPOSIÇÃO 13	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UNID	191,23	234,72	1,00	207,63	207,63
COMPOSIÇÃO 14	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = 95" MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67	UNID	1.157,98	1.421,32	18,00	1.257,30	22.631,39
COMPOSIÇÃO 15	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = 125" MM, COM 3 PROJETORES LED 200W IP-67	UNID	2.435,98	2.989,92	6,00	2.644,88	15.869,30
COMPOSIÇÃO 19	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA FUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	120,23	147,57	24,00	130,54	3.132,97
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						20.254,26
9.3	MANUTENÇÃO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA						
9.3.1	MANUTENÇÃO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA						
89957	MANUTENÇÃO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA	UN	171,12	210,03	1,00	185,79	185,79
9.3.12	MANUTENÇÃO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA						
95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4")	UN	274,10	336,43	1,00	297,61	297,61
95675	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_11/2016	UN	153,15	187,98	1,00	166,29	166,29
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	94,54	116,04	1,00	102,65	102,65
9.3.16	TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA						
9.3.16.2	TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA						
89402	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO						
9.3.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,29	17,54	18,71	15,52	290,31
89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	41,75	51,24	15,70	45,33	711,63
9.3.26	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO						
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,12	35,74	8,00	31,62	252,92
9.3.30	CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R						
9.3.30.2	CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R						
89591	EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS						
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	128,81	158,10	3,00	139,86	419,57
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	132,01	162,03	2,00	143,33	286,66
89679	LULA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	120,66	148,10	9,00	131,01	1.179,08
89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	262,03	321,62	1,00	284,51	284,51
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	196,57	243,72	1,00	215,59	215,59
x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS						
COMPOSIÇÃO 16	CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM 30X35X60CM, INCLUI GRELHA DE CONCRETO FURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	193,75	237,81	75,40	210,37	15.861,65
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						158.610,33
10.1	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						
10.1.2	CHAPISCO						
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	7,44	9,13	20,75	8,08	167,59
10.1.3	EMBOCO						

E-mail: mg.construcaoocivil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Marcio Galina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

8.775	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 08/2022	M2	57,44	70,50	20,75	62,36	1.294,06
10.3.11	REVESTIMENTO DE PISOS	PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-	-	-	-	-
32.356	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	62,05	76,16	130,28	67,37	8.777,12
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	67,74	83,14	74,48	73,55	5.477,67
10.3.12	PISO DE CONCRETO			-	-	-	-	-
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 09/2021	M2	37,32	45,81	238,90	40,52	9.681,07
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_ 08/2022	M2	92,56	113,61	412,77	100,50	41.483,14
10.4	PINTURAS			-	-	-	-	-
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA			-	-	-	-	-
10.4.16	PINTURA EM PISO			-	-	-	-	-
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	21,47	26,35	32,02	23,31	746,36
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-	-	-	-	-
COMPOSIÇÃO 2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	80,39	98,67	115,20	87,28	10.055,06
COMPOSIÇÃO 3	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	100,25	123,05	64,80	108,85	7.053,48
COMPOSIÇÃO 4	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DILUENTE	M2	86,73	106,45	238,90	94,17	22.496,18
COMPOSIÇÃO 5	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	269,10	310,22	173,85	274,42	47.708,02
COMPOSIÇÃO 6	COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA MIRAGEM ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M2	153,67	188,61	22,00	166,84	3.670,58
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-	-	-	-	-
11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-	-	-	-	-
11.1.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		-	-	-	-	-
97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	M	0,44	0,54	311,54	0,48	148,82
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-
11.2.2		PLANTAS		-	-	-	-	-
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_ 05/2018	UN	102,80	126,18	8,00	111,62	892,95
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	M2	13,44	16,50	430,50	14,60	6.283,53
98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_ 05/2018	UN	189,89	233,07	1,00	206,17	206,17
98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_ 05/2018	UN	141,06	173,14	1,00	153,16	153,16
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_ 08/2017	M3	111,73	137,14	30,54	121,31	3.704,93
810250E	DER-PR 6w/23	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	20,16	24,74	297,00	21,89	6.499,85
COMPOSIÇÃO 02449	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	3.228,24	3.962,34	1,00	3.505,09	3.505,09
COTAÇÃO	fevereira/2023	CARRÓCEL	UN	4.201,89	5.157,40	1,00	4.562,24	4.562,24
COTAÇÃO	fevereira/2023	GANGORRA DUPLA	UN	2.281,03	2.799,74	1,00	2.476,65	2.476,65
COTAÇÃO	fevereira/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	2.281,03	2.799,74	1,00	2.476,65	2.476,65
605000G	DER-PR 16w/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁIL (NBR 9050)	UN	481,50	590,99	4,00	522,79	2.091,16
COMPOSIÇÃO 7	COMPOSIÇÃO	MULTI CORDAS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	92.821,00	107.004,05	1,00	94.655,78	94.655,78
COMPOSIÇÃO 8	COMPOSIÇÃO	BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1.396,13	1.713,61	1,00	1.515,86	1.515,86
COMPOSIÇÃO 9	COMPOSIÇÃO	MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO	UNID	2.263,60	2.778,34	3,00	2.457,72	7.373,16
				185.425,29				

E-mail: mg.construcao civil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52

Marcio Galina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70x1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO	UNID	4.196,59	5.150,89	1,00	4.556,48	4.556,48
COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO	UNID	2.616,34	3.211,30	1,00	2.840,72	2.840,72
COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAUBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	38.205,65	46.893,61	1,00	41.482,09	41.482,09
		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			-	-	-	-
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			-	-	-	-
99902	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,62	0,76	384,00	0,67	258,16
x		TOTAL GERAL						521.015,31

Rodrigo Pires Branco
Arquiteto e Urbanista
OAB/PA 91039-2

[Handwritten signature]

E-mail: mg.construçãocivil@hotmail.com - Fone: (46) 3246 1192 - CNPJ: 16.700.335/0001-52
Marcio Galina Construção Civil e Materiais de Construção Eireli- Rua Frei Vito Berscheid, 828 - Centro - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

 REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO	
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)
									PARCELA	1ª
MUNICÍPIO:									Mês	Jun
SUBPROJETO:									SAM	74
FIRMA EMPREITEIRA:									Lote	4
									Ano	2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									CONTRATO EMPREITADA:	
									Nº	20/2024
									DATA:	14/02/2024
									OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	222,47	100,00%	0,0314	3,14%	73,50	16.351,55
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0179	1,79%	1.554,47	9.326,82
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0062	0,62%	3.247,38	3.247,38
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.100,00	100,00%	0,0010	0,10%	0,46	506,00
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,65	100,00%	0,0003	0,03%	17,66	170,42
	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	67,36	100,00%	0,0006	0,06%	4,74	319,29
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,20	100,00%	0,0021	0,21%	13,07	1.100,49
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,91	100,00%	0,0006	0,06%	40,55	320,75
	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	180,00	100,00%	0,0034	0,34%	9,89	1.780,20
	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	56,65	100,00%	0,0062	0,62%	56,93	3.225,08
	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	50,65	100,00%	0,0074	0,74%	76,36	3.867,63



REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 1ª

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

Mês Jun

SAM 74

SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte

Lote 4

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	M	10,30	100,00%	0,0026	0,26%	129,00	1.328,70
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	335,00		0,0111		17,33	-
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00		0,0002		18,74	-
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	6,00		0,0003		26,26	-
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.005,00		0,0141		7,30	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,00		0,0001		5,33	-
	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00		0,0011		11,14	-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00		0,0002		117,36	-
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,0001		68,26	-
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,0001		68,26	-
	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		0,0002		84,67	-
	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00		0,0003		65,95	-

 REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO									ESTADO	
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)
									PARCELA	1ª
MUNICÍPIO:									SAM	74
SUBPROJETO:									Lote	4
FIRMA EMPREITEIRA:									Ano	2024
MÉDIA DOS SERVIÇOS									CONTRATO EMPREITADA:	
									Nº	20/2024
									DATA:	14/02/2024
									ORÇAMENTO	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	297,61	297,61
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	158,71	158,71
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0002		102,65	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,71	100,00%	0,0006	0,06%	15,52	290,38
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	15,70	100,00%	0,0014	0,14%	45,33	711,68
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,00	100,00%	0,0005	0,05%	31,62	252,96
	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	3,00	100,00%	0,0008	0,08%	139,86	419,58
	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	2,00	100,00%	0,0006	0,06%	143,33	286,66
	89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	9,00	100,00%	0,0023	0,23%	131,01	1.179,09
	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00		0,0005		284,51	-
	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00		0,0004		215,59	-

 REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO										ESTADO	
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)
										Mês	Jun
MUNICÍPIO:				PATO BRANCO				SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO:				PRAÇA - Novo Horizonte				Lote	4	Nº	20/2024
FIRMA EMPREITEIRA:				Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.				Ano	2024	DATA:	14/02/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	
	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	412,77	40,00%	0,0796	3,18%	100,50	16.593,36	
	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	32,02		0,0014		23,31	-	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL	M2	115,20		0,0193		87,28	-	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	M2	64,80		0,0135		108,85	-	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DILUENTE	M2	238,90		0,0432		94,17	-	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE	M2	173,85		0,0916		274,42	-	
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M2	22,00	15,00%	0,0070	0,11%	166,84	550,57	
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	311,54		0,0003		0,48	-	
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	8,00		0,0017		111,62	-	
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	430,50	70,00%	0,0121	0,85%	14,60	4.399,71	
	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	206,17	206,17	
	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR OUE 0.60 M.AF 05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	153,16	153,16	
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 08/2017	M3	30,54		0,0071		121,31	-	
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	297,00		0,0125		21,89	-	
			ESTRUTURA METÁLICA DE PACQUETE COM TABELA 120 E DESE ENXADA COM								



REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONALFrancisco Beltrão (P.A)

PARCELA1ª

CONTRATO EMPREITADA:
Nº20/2024
DATA:14/02/2024

Município: Pato Branco

Subprojeto: Praça - Novo Horizonte

Firma Empreiteira: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

MêsJun

SAM74

Lote4

Ano2024

MEDICÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA	UNID	1,00		0,0796		41.482,09	-
99802	SINAPI		LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	384,00		0,0005		0,67	-

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 24/06/2024 17:15:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 26/06/2024 13:34:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBSON CANTU:44143664968

Assinado de f
por ROBSON
CANTU:44143
Dados: 2024.0
14:25:11 -03'0

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO

FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO

ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - Novo Horizonte

CONVÊNIO : Nº. 611/2023

PAM

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

20/2024

521.015,31

74

4

MEDICÃO Nº: 1ª

DATA DA MEDIÇÃO : 19/06/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/05/2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2023

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	29.431,75	100,00%	29.431,75	29.431,75
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	16.695,36	100,00%	16.695,36	16.695,36
3	3	FUNDAÇÕES		-	100,00%	1.440,57	1.440,57
4	4	ESTRUTURAS		-	100,00%	33.987,11	33.987,11
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	2,36%	14.481,51	341,65
6	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	100,00%	1.328,70	1.328,70
7	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	65,14%	59.106,43	38.500,68
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	5,00%	1.012,35	17,76%	20.247,11	3.596,67
9	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	5,00%	7.930,51	22,95%	158.610,34	36.404,40
10	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	20,00%	37.085,83	4,74%	185.429,15	8.780,97
11	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	20,00%	51,45		257,28	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA			92.207,25		TOTAL MEDIÇÃO		170.507,86

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$170.507,86

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

 RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 24/06/2024 17:15:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 26/06/2024 13:34:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON CANTU:44143664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.06.26 14:27:25 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arg. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

Página 1 de 2

Medição 01

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
	29.431,75	100,00%
	16.695,36	100,00%
	1.440,57	100,00%
	33.987,11	100,00%
	341,65	2,36%
	1.328,70	100,00%
	38.500,68	65,14%
	3.596,67	17,76%
	36.404,40	22,95%
	8.780,97	4,74%
	-	
	-	
OK	Parcial	
Acumulado	Desta	
Med. Anterior	Medição	
-	170.507,86	

ROBSON
CANTU:4414366
4968

Assinado de forma digital
por ROBSON
CANTU:44143664968
Dados: 2024.06.26 14:27:35
-03'00'

CO
TO GUIBES
8/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO


Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 4 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	20/2024
Data da Vistoria:	14/06/2024

Objeto:

Construção da Praça Novo Horizonte, contendo: Área de convivência, play-ground, mini-quadra de basquete, pista de caminhada, calçadas e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **14/02 a 14/06**


SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DE OBRA



2 | DETALHE DA PLACA(QR CODE)

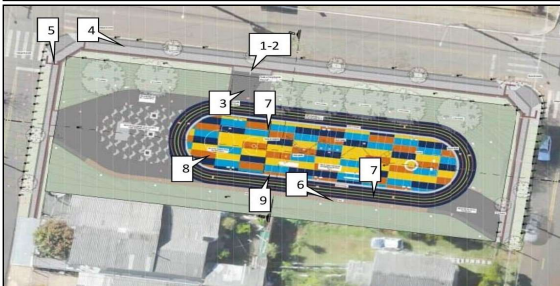

MAPA



3 | ESCADARIA



4 | DETALHE CALÇADA



5 | DETALHE CALÇADA



6 | BANCOS



7 | TABELA DE BASQUETE



8 | PISO E QUADRAS



9 | PISO E QUADRAS



10 | PISO E QUADRAS

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/ lote/19328/medicao/9554/relatorio-fotografico/122>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Medição 01

Pato Branco, 21 de junho de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D





















PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

PARCELA 2ª

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MUNICÍPIO: PATO BRANCO
 SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte
 FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Mês Jul
 SAM 74
 Lote 4
 Ano 2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	--------------	-------------------	---------	----------------	--------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
	1.1.2		LOCAÇÃO		-					-
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	222,47	100,00%	0,0314	3,14%	73,50	16.351,55
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-					-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-					-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0179	1,79%	1.554,47	9.326,82
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-					-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0062	0,62%	3.247,38	3.247,38
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-					-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.100,00	100,00%	0,0010	0,10%	0,46	506,00
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-					-
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECANICA		-					-
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,65	100,00%	0,0003	0,03%	17,66	170,42
	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	67,36	100,00%	0,0006	0,06%	4,74	319,29
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-					-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

PARCELA 2ª

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

Mês Jul

SAM 74

SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte

Lote 4

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	50,65	100,00%	0,0074	0,74%	76,36	3.867,63
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO (ARGILA, COM TRANSPORTE ATÉ 10KM), ESCAVACÃO. CARGA E TRANSPORTE.	M3	84,45	100,00%	0,0113	1,13%	70,00	5.911,50
3	3		FUNDACOES							-
	3.9		RADIER / OUTROS		-					-
	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	412,77	100,00%	0,0028	0,28%	3,49	1.440,57
4	4		ESTRUTURAS							-
	4.4		LASTROS		-					-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-					-
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,30	100,00%	0,0014	excesso	116,76	735,58
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-					-
	4.6.3		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS		-					-
	4.6.3.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO		-					-
	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF 06/2018	M	311,54	100,00%	0,0353	3,53%	59,03	18.390,21
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-					-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ESCADA EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UNID	1,00	100,00%	0,0285	2,85%	14.861,32	14.861,32
5	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-
	5.1		ALVENARIA		-					-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-					-
	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	5,00	100,00%	0,0007	0,07%	68,33	341,65
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-					-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

PARCELA 2ª

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

Mês Jul

SAM 74

SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte

Lote 4

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	100,00%	0,0002	0,02%	18,74	112,44
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	100,00%	0,0003	0,03%	26,26	157,56
	8.2.5		CABOS		-					-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-					-
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.005,00		0,0141		7,30	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-					-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00		0,0001		5,33	-
	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0011	0,11%	11,14	557,00
	8.2.8		CAIXAS		-					-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	117,36	117,36
	8.2.11		DISJUNTORES		-					-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-					-
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00				15,52	-
	8.2.11.2		BIPOLARES		-					-
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		0,0001		68,26	-
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	1,00		0,0001		68,26	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 2ª

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

Mês Jul

SAM 74

SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte

Lote 4

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETOES LED 200W IP-67	UNID	6,00	100,00%	0,0305	3,05%	2.644,88	15.869,28
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00	100,00%	0,0060	0,60%	130,54	3.132,96
8	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS							-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-					-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-					-
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO FM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	185,79	185,79
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-					-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	297,61	297,61
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	158,71	158,71
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		0,0002		102,65	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-					-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-					-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,71	100,00%	0,0006	0,06%	15,52	290,38
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-					-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	15,70	100,00%	0,0014	0,14%	45,33	711,68
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-					-
			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

PARCELA 2ª

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Mês	Jul
SAM	74
Lote	4
Ano	2024

CONTRATO EMPREITADA:	
Nº	20/2024
DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
9	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS		-					-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM 30X35X60CM, INCLUI GRELHA DE CONCRETO FURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,40	100,00%	0,0304	3,04%	210,37	15.861,90
	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-					-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-					-
	10.1.2		CHAPISCO		-					-
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,75	100,00%	0,0003	0,03%	8,08	167,66
	10.1.3		EMBOCO		-					-
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20,75	100,00%	0,0025	0,25%	62,36	1.293,97
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-					-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-					-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	130,28	100,00%	0,0168	1,68%	67,37	8.776,96
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	74,48	100,00%	0,0105	1,05%	73,55	5.477,93
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-					-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	238,90	100,00%	0,0186	1,86%	40,52	9.679,82
	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8	M2	412,77	100,00%	0,0796	7,96%	100,50	41.483,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

PARCELA 2ª

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

Mês Jul

SAM 74

SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte

Lote 4

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
10	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	
	11.1.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	311,54	100,00%	0,0003	0,03%	0,48	149,54
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	
	11.2.2		PLANTAS		-				-	
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018	UN	8,00		0,0017		111,62	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	430,50	76,97%	0,0121	0,93%	14,60	4.837,71
	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	206,17	206,17
	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	153,16	153,16
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 08/2017	M3	30,54	100,00%	0,0071	0,71%	121,31	3.704,81
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	297,00	67,34%	0,0125	0,84%	21,89	4.378,00
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,0067	0,67%	3.505,09	3.505,09
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	1,00		0,0088		4.562,24	-
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.476,65	2.476,65
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.476,65	2.476,65
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4,00	100,00%	0,0040	0,40%	522,79	2.091,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

										Mês	Jul	PARCELA		2ª
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO								SAM	74	CONTRATO EMPREITADA:		
SUBPROJETO:		PRAÇA - Novo Horizonte								Lote	4	Nº	20/2024	
FIRMA EMPREITERA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.								Ano	2024	DATA:	14/02/2024	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											OR			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS					Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
														-
														-
GLOBAL - LOTE 1								% PREVISTO	35,91%	% EXECUTADO :		74,79%	SOMAS	389.647,49
OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:			
											Medição Acumulada:			
											Total Anterior:			
											Valor Desta Medição:			

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 12/08/2024 16:31:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 12/08/2024 16:43:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBSON
CANTU:44143664
968
Assinado de forma
ROBSON
CANTU:44143664
Dados: 2024.08.1
-03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - Novo Horizonte

CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

MEDICÇÃO Nº: 2ª

DATA DA MEDIÇÃO : 25/07/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/05/2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2023

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 20/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 521.015,31

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 4

DATA : 14/02/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	29.431,75	100,00%	29.431,75	29.431,75
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	16.695,36	100,00%	16.695,36	16.695,36
3	3	FUNDACOES	100,00%	1.440,57	100,00%	1.440,57	1.440,57
4	4	ESTRUTURAS	100,00%	33.987,11	100,00%	33.987,11	33.987,11
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, Muros E FECHOS	20,00%	2.896,30	100,00%	14.481,51	14.481,51
6	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	100,00%	1.328,70	1.328,70
7	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	20,00%	11.821,28	81,86%	59.106,43	48.383,55
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10,00%	2.024,71	99,49%	20.247,11	20.144,46
9	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	15,00%	23.791,55	44,48%	158.610,34	70.550,21
10	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	35,00%	64.900,20	82,62%	185.429,15	153.204,27
11	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	35,00%	90,04		257,28	-
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				187.078,87		TOTAL MEDIÇÃO	389.647,49

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$219.139,63

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

 RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 12/08/2024 16:31:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

 ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 12/08/2024 16:43:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON

CANTU:4414366

4968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.08.12 17:13:19 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO
	(R\$) (%)
29431,75	-
16695,36	-
1440,57	-
33987,11	-
341,65	14.139,86 97,64%
1328,70	-
38500,68	9.882,87 16,72%
3596,67	16.547,79 81,73%
36404,40	34.145,81 21,53%
8780,97	144.423,30 77,89%
-	-
-	-
OK	Parcial
Acumulado	Dest
Med. Anterior	Medição
170.507,86	219.139,63

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 4 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	20/2024
Data da Vistoria:	30/07/2024

Objeto:

Construção da Praça Novo Horizonte, contendo: Área de convivência, play-ground, mini-quadra de basquete, pista de caminhada, calçadas e paisagismo.


Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 17/06/2024 até 25/07/2024.

SERVIÇOS EXECUTADOS





4 | PAVER

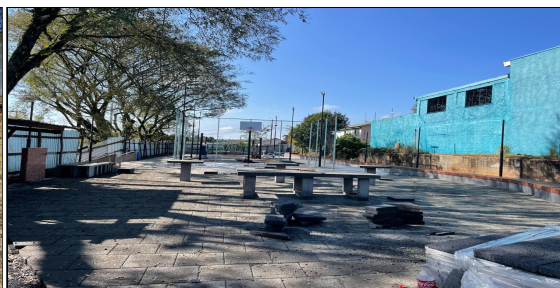

5 | BANCOS




6 | BANCOS E BEBEDOURO




7 | MEIA QUADRA



8 | BRINQUEDOS

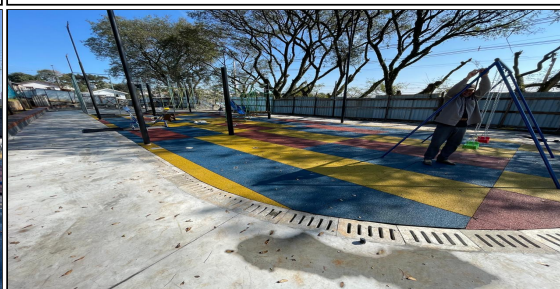

9 | BRINQUEDOS

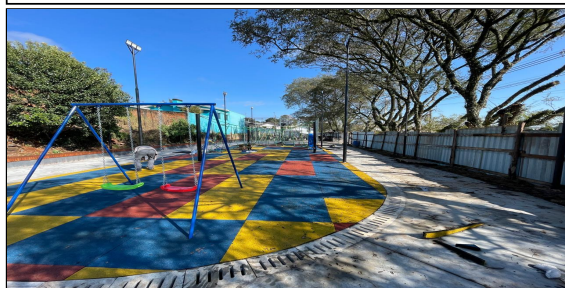

10 | BRINQUEDOS



11 | BRINQUEDOS



12 | ESCADARIA

Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19328/medicao/11630/relatorio-fotografico/292>


Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.


Pato Branco, 31 de julho de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
engenheiro civil
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 31/07/2024 16:07:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



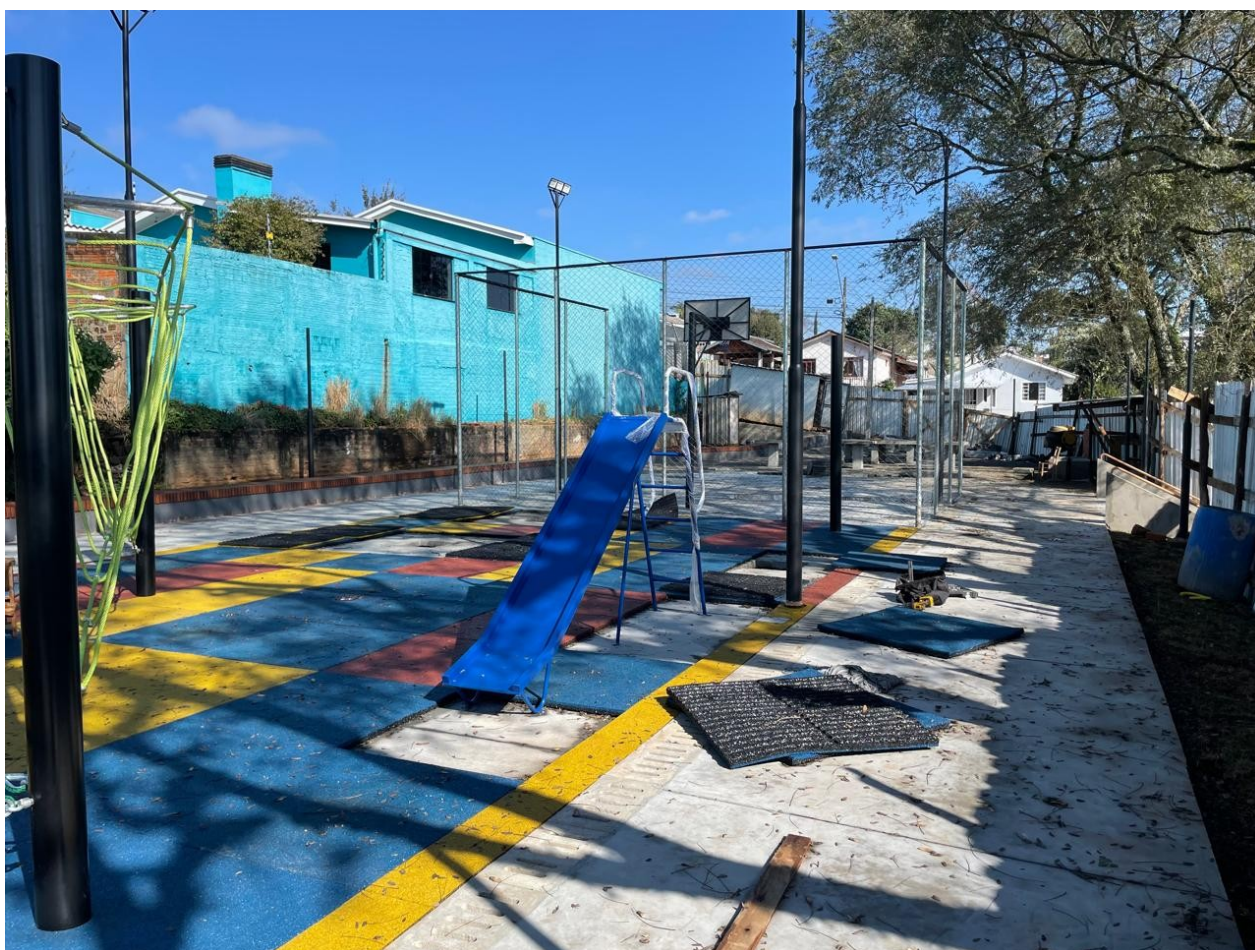

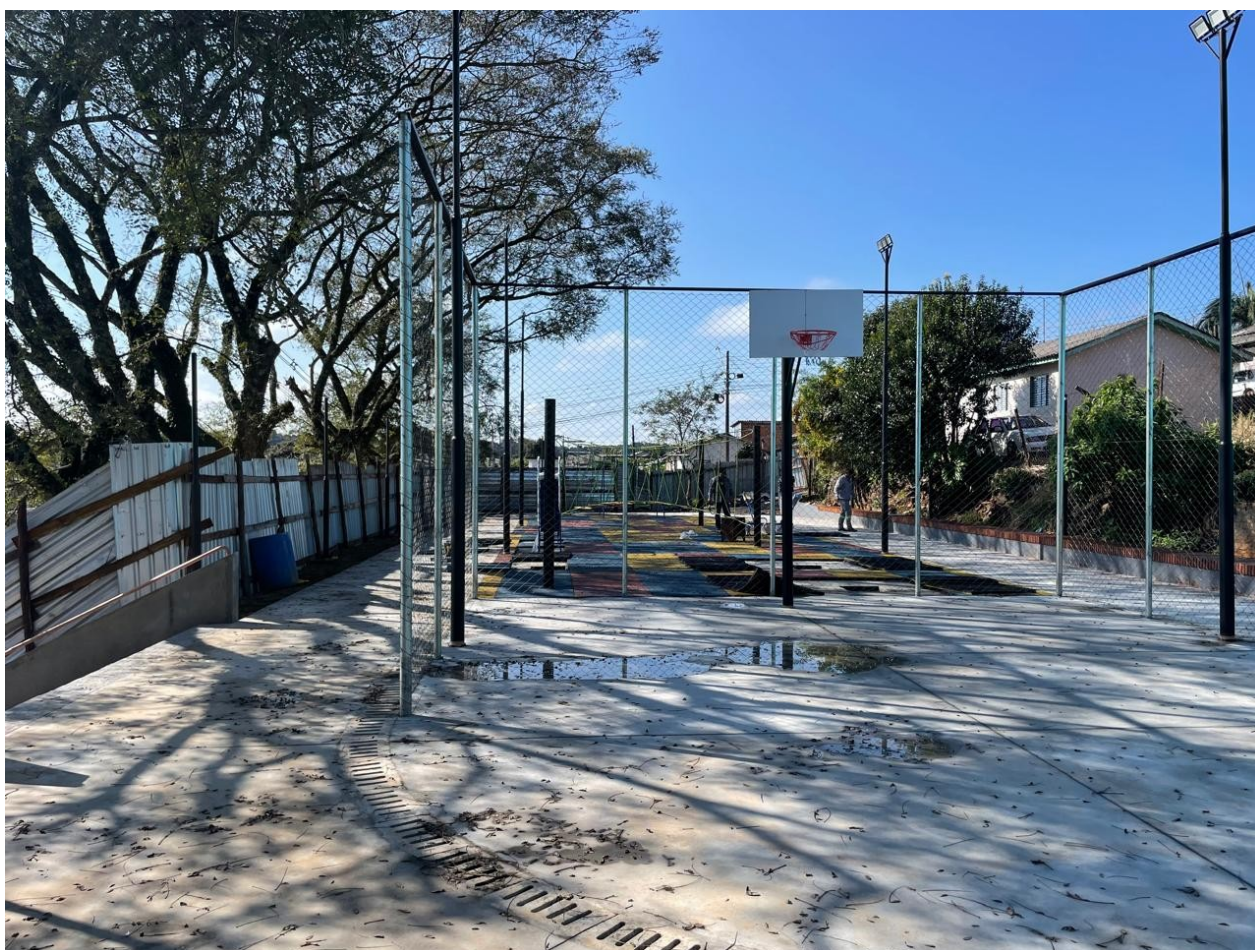











PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A)	
PARCELA		3ª	
CONTRATO EMPREITADA:			
Nº		20/2024	
DATA:		14/02/2024	

MUNICÍPIO:									Mês	Ago
SUBPROJETO:									SAM	74
FIRMA EMPREITEIRA:									Lote	4
									Ano	2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido

GLOBAL - LOTE 1

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-
	1.1.2		LOCACAO		-					-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	222,47	100,00%	0,0314	3,14%	73,50	16.351,55
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-					-
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-					-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	100,00%	0,0179	1,79%	1.554,47	9.326,82
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-					-
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	100,00%	0,0062	0,62%	3.247,38	3.247,38
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-					-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.100,00	100,00%	0,0010	0,10%	0,46	506,00
2	2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-					-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-					-
	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,65	100,00%	0,0003	0,03%	17,66	170,42
	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	67,36	100,00%	0,0006	0,06%	4,74	319,29
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-					-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A.)

PARCELA 3ª

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

Mês Ago

SAM 74

SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte

Lote 4

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	50,65	100,00%	0,0074	0,74%	76,36	3.867,63
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO (ARGILA, COM TRANSPORTE ATÉ 10KM), ESCAVACÃO. CARGA E TRANSPORTE.	M3	84,45	100,00%	0,0113	1,13%	70,00	5.911,50
3	3		FUNDACOES							-
	3.9		RADIER / OUTROS		-					-
	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	412,77	100,00%	0,0028	0,28%	3,49	1.440,57
4	4		ESTRUTURAS							-
	4.4		LASTROS		-					-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-					-
	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,30	100,00%	0,0014	excesso	116,76	735,58
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-					-
	4.6.3		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS		-					-
	4.6.3.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO		-					-
	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF 06/2018	M	311,54	100,00%	0,0353	3,53%	59,03	18.390,21
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-					-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	ESCADA EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	UNID	1,00	100,00%	0,0285	2,85%	14.861,32	14.861,32
5	5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							-
	5.1		ALVENARIA		-					-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-					-
	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	5,00	100,00%	0,0007	0,07%	68,33	341,65
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-					-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

PARCELA 3ª

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte
FIRMA EMPREITEIRA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Mês	Ago
SAM	74
Lote	4
Ano	2024

CONTRATO EMPREITADA:	
Nº	20/2024
DATA:	14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	100,00%	0,0002	0,02%	18,74	112,44
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	100,00%	0,0003	0,03%	26,26	157,56
	8.2.5		CABOS		-					-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-					-
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.005,00	100,00%	0,0141	1,41%	7,30	7.336,50
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-					-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	100,00%	0,0001	0,01%	5,33	42,64
	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	100,00%	0,0011	0,11%	11,14	557,00
	8.2.8		CAIXAS		-					-
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	117,36	117,36
	8.2.11		DISJUNTORES		-					-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-					-
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%			15,52	15,52
	8.2.11.2		BIPOLARES		-					-
	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	68,26	68,26
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	68,26	68,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL Francisco Beltrão (P.A)

PARCELA 3ª

MUNICÍPIO: PATO BRANCO

Mês Ago

SAM 74

SUBPROJETO: PRAÇA - Novo Horizonte

Lote 4

FIRMA EMPREITEIRA: Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

Ano 2024

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 20/2024

DATA: 14/02/2024

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETOES LED 200W IP-67	UNID	6,00	100,00%	0,0305	3,05%	2.644,88	15.869,28
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00	100,00%	0,0060	0,60%	130,54	3.132,96
8	9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS							-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-					-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-					-
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO FM A VFNARTA. AF 12/2014	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	185,79	185,79
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-					-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0006	0,06%	297,61	297,61
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	158,71	158,71
	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,0002	0,02%	102,65	102,65
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-					-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-					-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,71	100,00%	0,0006	0,06%	15,52	290,38
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-					-
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	15,70	100,00%	0,0014	0,14%	45,33	711,68
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-					-
			JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A)	
PARCELA		3ª	
MUNICÍPIO:		PATO BRANCO	
SUBPROJETO:		PRAÇA - Novo Horizonte	
FIRMA EMPREITERA:		Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	
Mês		Ago	
SAM		74	
Lote		4	
Ano		2024	
CONTRATO EMPREITADA:		Nº	
		20/2024	
DATA:		14/02/2024	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									OR	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
9	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-					-
	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM 30X35X60CM, INCLUI GRELHA DE CONCRETO FURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,40	100,00%	0,0304	3,04%	210,37	15.861,90
	10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-					-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-					-
	10.1.2		CHAPISCO		-					-
	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20,75	100,00%	0,0003	0,03%	8,08	167,66
	10.1.3		EMBOCO		-					-
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20,75	100,00%	0,0025	0,25%	62,36	1.293,97
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-					-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-					-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	130,28	100,00%	0,0168	1,68%	67,37	8.776,96
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	74,48	100,00%	0,0105	1,05%	73,55	5.478,00
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-					-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	238,90	100,00%	0,0186	1,86%	40,52	9.680,22
	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8	M2	412,77	100,00%	0,0796	7,96%	100,50	41.483,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

REGIONAL		Francisco Beltrão (P.A)	
PARCELA		3ª	
Mês		Ago	
SAM		74	
Lote		4	
Ano		2024	
CONTRATO EMPREITADA:			
Nº		20/2024	
DATA:		14/02/2024	

MEDICÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido
10	11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	
	11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	
	11.1.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-				-	
	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	311,54	100,00%	0,0003	0,03%	0,48	149,54
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	
	11.2.2		PLANTAS		-				-	
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018	UN	8,00	100,00%	0,0017	0,17%	111,62	892,96
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	430,50	100,00%	0,0121	1,21%	14,60	6.285,30
	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	206,17	206,17
	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.40 M E MENOR QUE 0.60 M.AF 05/2018	UN	1,00	100,00%	0,0003	0,03%	153,16	153,16
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF 08/2017	M3	30,54	100,00%	0,0071	0,71%	121,31	3.704,81
	810250E	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	297,00	100,00%	0,0125	1,25%	21,89	6.501,33
	COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,0067	0,67%	3.505,09	3.505,09
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	1,00	100,00%	0,0088	0,88%	4.562,24	4.562,24
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.476,65	2.476,65
	COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	100,00%	0,0048	0,48%	2.476,65	2.476,65
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4.00	100,00%	0,0040	0,40%	522,79	2.091,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO

MUNICÍPIO:	PATO BRANCO	Mês	Ago
SUBPROJETO:	PRAÇA - Novo Horizonte	SAM	74
FIRMA EMPREITERA:	Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.	Lote	4
		Ano	2024

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A)
PARCELA	3ª
CONTRATO EMPREITADA:	
Nº	20/2024
DATA:	14/02/2024

MEDICÃO DOS SERVIÇOS

OR

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total

Custo Unitário	Valor Medido
	-
	-

GLOBAL - LOTE 1	% PREVISTO	51,28%	% EXECUTADO :	100,00%
-----------------	------------	--------	---------------	---------

SOMAS	521.015,31
-------	------------

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:
Medição Acumulada:
Total Anterior:
Valor Desta Medição:

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO PIRES FRANCO
Data: 09/10/2024 11:34:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
Data: 11/10/2024 08:32:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBSON
CANTU:441436
64968
Assinado de forma por ROBSON
CANTU:44143664968
Dados: 2024.10.15 11:13:26 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : PATO BRANCO

PROJETO : PRAÇA - Novo Horizonte

CONVÊNIO : Nº. 611/2023 PAM

MEDICÃO Nº: 3ª

DATA DA MEDIÇÃO : 30/08/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/08/2024

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/02/2025

EMPRESA VENCEDORA : Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.

CONTRATO EMPREITADA Nº : 20/2024 DATA : 14/02/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 521.015,31

SAM : Nº. 74

LOTE : Nº. 4

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

Nº DA LICITAÇÃO: 011/2023

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	29.431,75	100,00%	29.431,75	29.431,75
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	16.695,36	100,00%	16.695,36	16.695,36
3	3	FUNDACOES	100,00%	1.440,57	100,00%	1.440,57	1.440,57
4	4	ESTRUTURAS	100,00%	33.987,11	100,00%	33.987,11	33.987,11
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, Muros e FECHOS	45,00%	6.516,67	100,00%	14.481,51	14.481,51
6	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	100,00%	1.328,70	1.328,70
7	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	40,00%	23.642,57	100,00%	59.106,43	59.106,43
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	35,00%	7.086,48	100,00%	20.247,11	20.247,11
9	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	35,00%	55.513,61	100,00%	158.610,34	158.610,34
10	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	50,00%	92.714,57	100,00%	185.429,15	185.429,15
11	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	50,00%	128,64	100,00%	257,28	257,28
12				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				267.157,33		TOTAL MEDIÇÃO	521.015,31

Importa a presente medição no valor total de R\$

R\$131.367,82

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS, nº 011/2023, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Documento assinado digitalmente

RODRIGO PIRES FRANCO

Data: 09/10/2024 11:34:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES

Data: 11/10/2024 08:32:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBSON

CANTU:44143

664968

Assinado de forma digital por ROBSON CANTU:44143664968
Dados: 2024.10.15 11:14:12 -03'00'

Márcio Gallina Construção Civil e Materiais de Construção Ltda.
Rodrigo Pires Franco
Arq. Urb. CAU A91039-2

PREF. MUN. DE PATO BRANCO
FISCAL: ANTONIO ALEXANDRE OTTO GUIBES
ENGº CIVIL - CREA PR-178408/D

PREFEITO DE PATO BRANCO
ROBSON CANTU

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO (R\$)	(%)
29431,75	-	
16695,36	-	
1440,57	-	
33987,11	-	
14481,51	-	
1328,70	-	
48383,55	10.722,88	18,14%
20144,46	102,65	0,51%
70550,21	88.060,13	55,52%
153204,27	32.224,88	17,38%
	257,28	100,00%
	-	
OK	Parcial	
Acumulado	Destá	
Med. Anterior	Medição	
389.647,49	131.367,82	

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Pato Branco
Projeto/Lote/Medição:	74 / 4 / 3
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	20/2024
Data da Vistoria:	30/08/2024

Objeto:


Construção da Praça Novo Horizonte, contendo: Área de convivência, play-ground, mini-quadra de basquete, pista de caminhada, calçadas e paisagismo.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/07/2024 até 30/08/2024.


SERVIÇOS EXECUTADOS




1 | PLACA DA OBRA

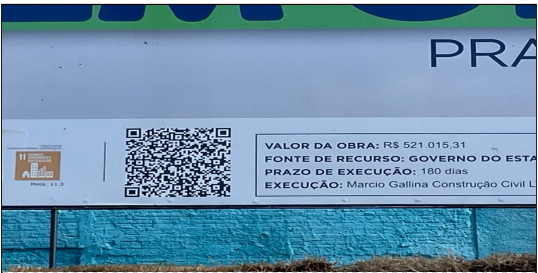


1 | DETALHE DA PLACA

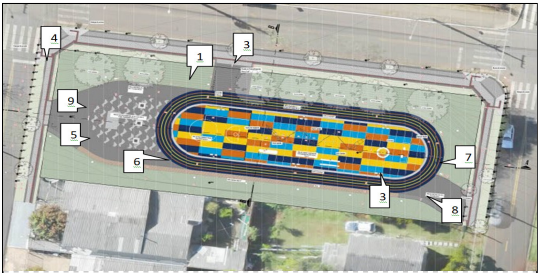

10 | Mapa

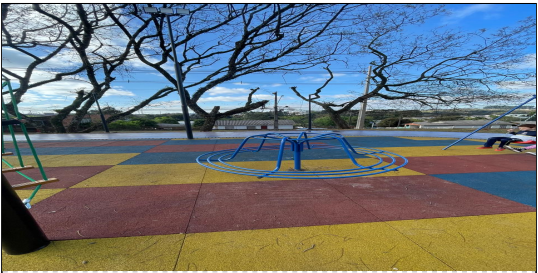

2 | CARROSEL

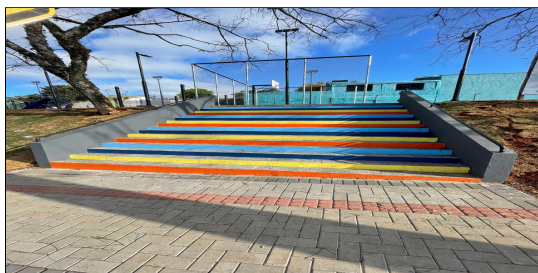


3 | ESCADARIA



4 | CALÇADAS E GRAMADO




5 | MESAS

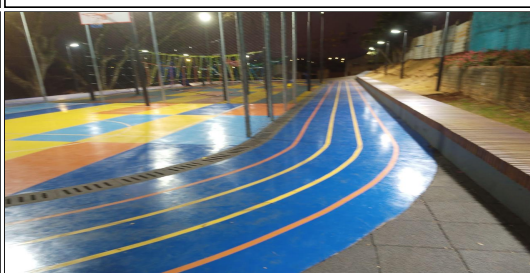

6 | BRINQUEDOS




7 | BRINQUEDOS

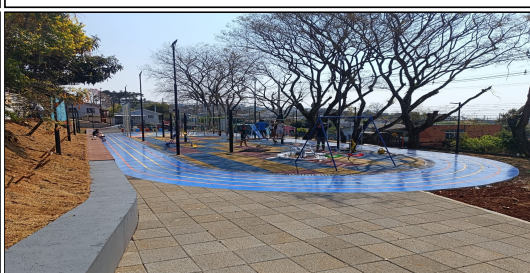

8 | BRINQUEDOS



9 | MESAS



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/15282/lote/19328/medicao/12433/relatorio-fotografico/1016>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Pato Branco, 17 de setembro de 2024.

Antonio Alexandre Otto Guibes
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR-178408/D



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Antonio Alexandre Otto Guibes (17/09/2024 16:06:43)

Nome/controlado do arquivo:
2024091716064304.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2024091716064304>







