

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
28	2023	REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MARIA JUREMA CENI Esta intervenção foi concluída	Contrato 94/2023	180	12/07/2023	R\$ 834.569,70	100,00%

Nº28/2023
Data Inicial: 12/07/2023

REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MARIA JUREMA CENI

R\$ 834.569,70

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

59024

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10135	2023	04/07/2023	12433
10136	2023	04/07/2023	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	580522	04/07/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.7*.4**-08	ART (CREA)	17**2*1**67**	Orçamento	Sim
CPF	09*.3*.9**-60	ART (CREA)	17**2*3**59**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.2*.7**-43	ART (CREA)	17**2*3**84**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				32603	R\$ 1.180.284,14	23/03/2022	
Contrato	94	2023	76.995.448/0001-54	32604	R\$ 834.569,70	14/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
32631	Medição	1	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2023	58,58%
32667	Medição	2	Jurisdicionado	27/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2023	58,58%
32688	Medição	3	Jurisdicionado	05/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2023	95,66%
32720	Medição	4	Jurisdicionado	28/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2023	95,66%

32761	Medição	5	Jurisdicionado	20/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2023	100,00%
32818	Conclusão	6	Jurisdicionado	09/01/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900160246674					

Nº28/2023
Data Inicial: 12/07/2023


REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MARIA JUREMA CENI

Documentos

R\$ 834.569,70




31 de ago. de 2023 10:28:45
Rua Itapuã, 700
La Salle
Pato Branco PR
85505-180
Brasil
Escola Jurema Ceni

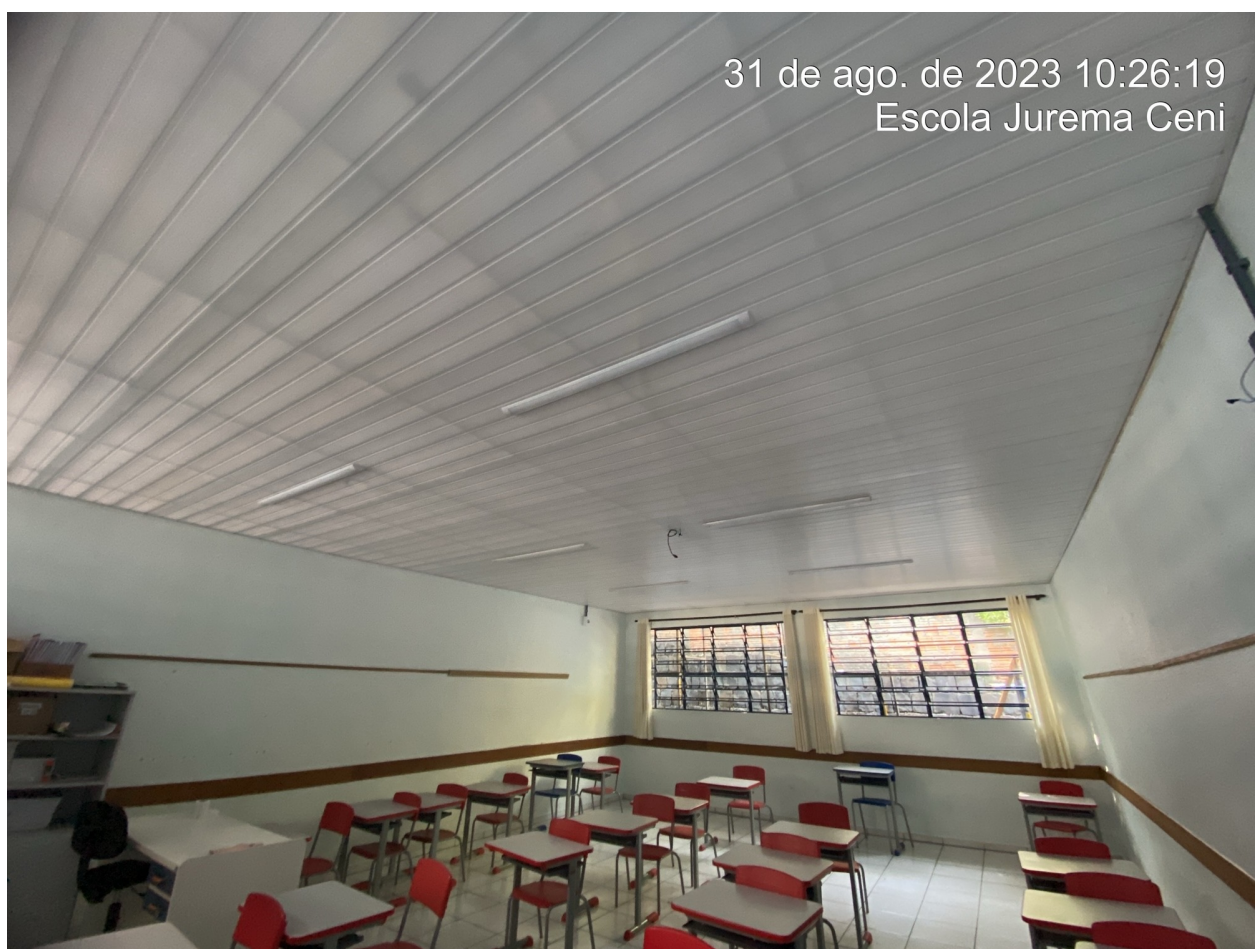





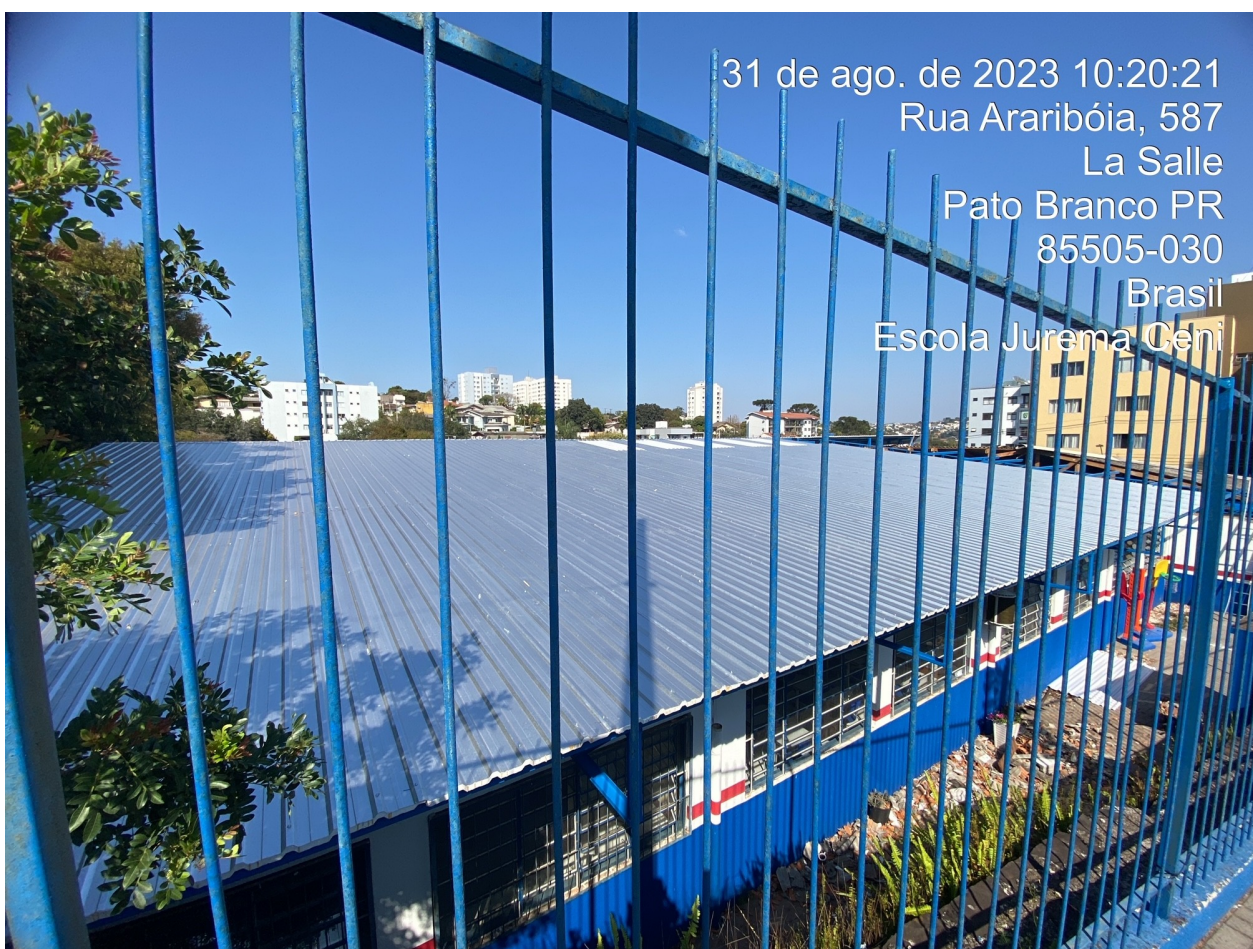

31 de ago. de 2023 10:20:21
Rua Araribóia, 587
La Salle
Pato Branco PR
85505-030
Brasil
Escola Jurema Geni

I



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / Tomador		Nº SICONV		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
0		0		0 TROCA DE TELHADOS		#PÚBLICO	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
94		LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA		(SELECIONAR)		12/07/2023 a 31/08/2023	
		CNPJ				Nº MEDIÇÃO	
		10.783.598/0001-96				1	

Realizado Acumulado: 58,58%

Orçamento Contratado				Evolução Física (Qtde.)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
1. TELHADOS				TOTAL:	834.569,70	-	-	-	-	488.856,16	488.856,16
1.1.	Serviços Iniciais	-	-	-	834.569,70	-	-	-	-	488.856,16	488.856,16
1.1.1.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	25,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,00	4.600,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	676.144,00	-	-	-	-	448.536,85	448.536,85
1.2.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.840,00	62,00	114.080,00	-	1.288,00	1.288,00	-	79.856,00	79.856,00
1.2.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	4,00	7.360,00	-	1.840,00	1.840,00	-	7.360,00	7.360,00
1.2.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	7,00	12.880,00	-	1.840,00	1.840,00	-	12.880,00	12.880,00
1.2.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.840,00	225,00	414.000,00	-	1.288,00	1.288,00	-	288.800,00	288.800,00
1.2.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	240,00	120,00	28.800,00	-	60,00	60,00	-	7.200,00	7.200,00
1.2.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	380,00	75,00	28.500,00	-	60,00	60,00	-	4.500,00	4.500,00
1.2.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.840,00	30,00	55.200,00	-	1.288,00	1.288,00	-	38.640,00	38.640,00
1.2.8.	CUMEJEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	40,00	86,64	3.465,60	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	6.480,00	1,83	11.858,40	-	4.535,99	4.535,99	-	8.300,85	8.300,85
1.3.	Forno de PVC	-	-	-	138.367,20	-	-	-	-	36.347,16	36.347,16
1.3.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	2,12	3.900,80	-	1.288,00	1.288,00	-	2.730,56	2.730,56
1.3.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.840,00	70,03	128.855,20	-	460,00	460,00	-	32.213,80	32.213,80
1.3.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	840,00	6,68	5.611,20	-	210,00	210,00	-	1.402,80	1.402,80
1.4.	OUTROS	-	-	-	10.458,50	-	-	-	-	3.972,15	3.972,15
1.4.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	585,00	9,70	5.674,50	-	409,50	409,50	-	3.972,15	3.972,15
1.4.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.840,00	2,60	4.784,00	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total;

Medição 01



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
94	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	(SELECIONAR)		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			12/07/2023 a 31/08/2023		

Realizado Acumulado: 58,58%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	-	488.856,16	488.856,16
TOTAL:						-	-	-	-	488.856,16	488.856,16

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 185508/D
ART/RRT: 1720233708468

JAKELINE
LOUREIRO:09
802974943
Assinado de forma digital por JAKELINE LOUREIRO:09802974943
Dados: 2023.09.06 09:39:14 -03'00'

Medição 01



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharía@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados na *ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUREMA CENI*, Rua Araribóia, nº 700, Bairro La Salle, no município de Pato Branco/PR, CEP: 85.505-031

Contrato nº 94/2023/GP**Relatório de Medição nº 01**

Empresa Contratada: *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*
Responsável: *Lincoln Fernando Machado de Souza*

Medição 01

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:
















31 de ago. de 2023 10:23:05
Rua Itapuã, 700
La Salle
Pato Branco PR
85505-180
Brasil
Escola Jurema Geni




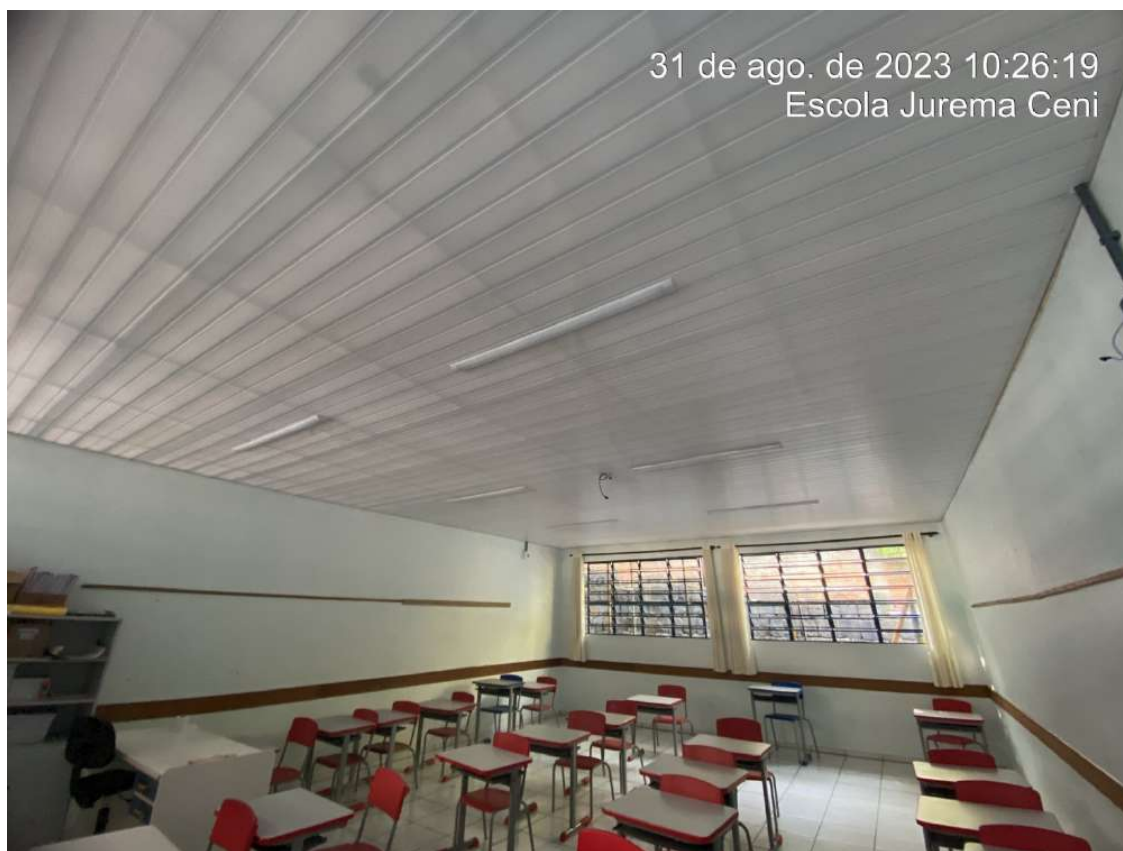

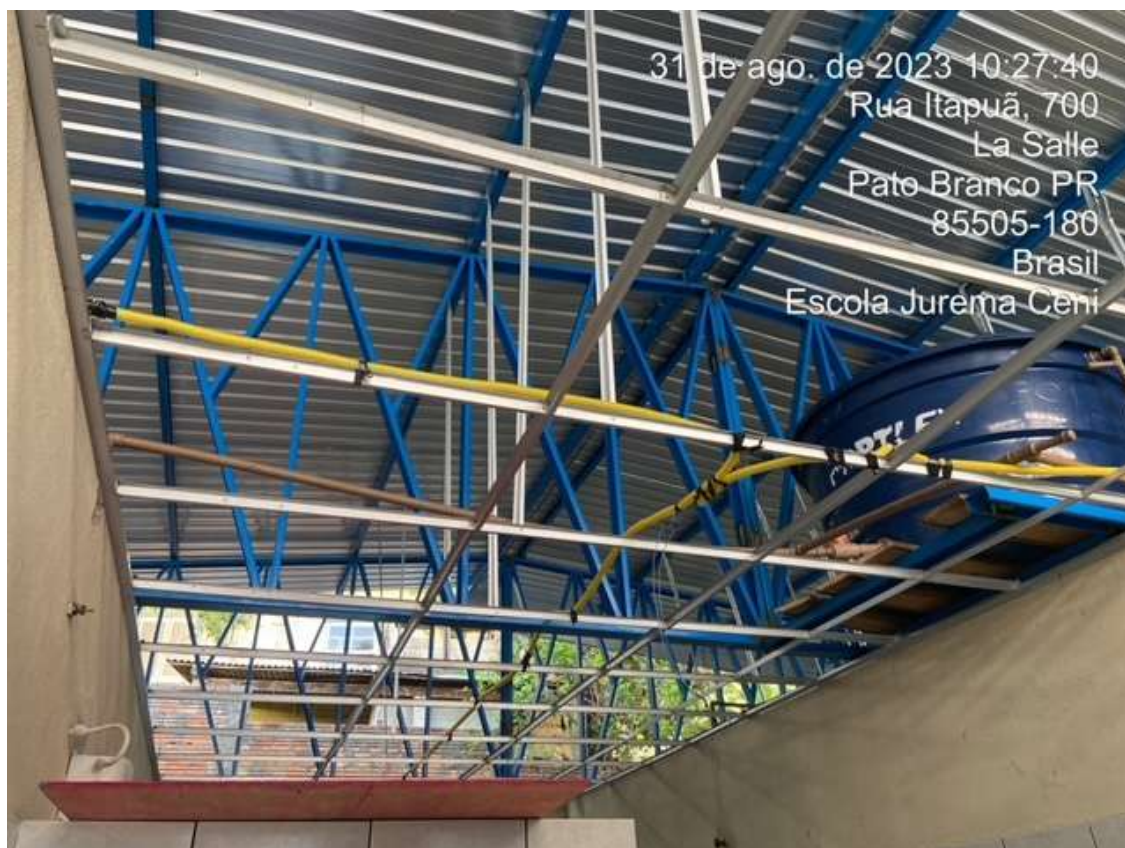

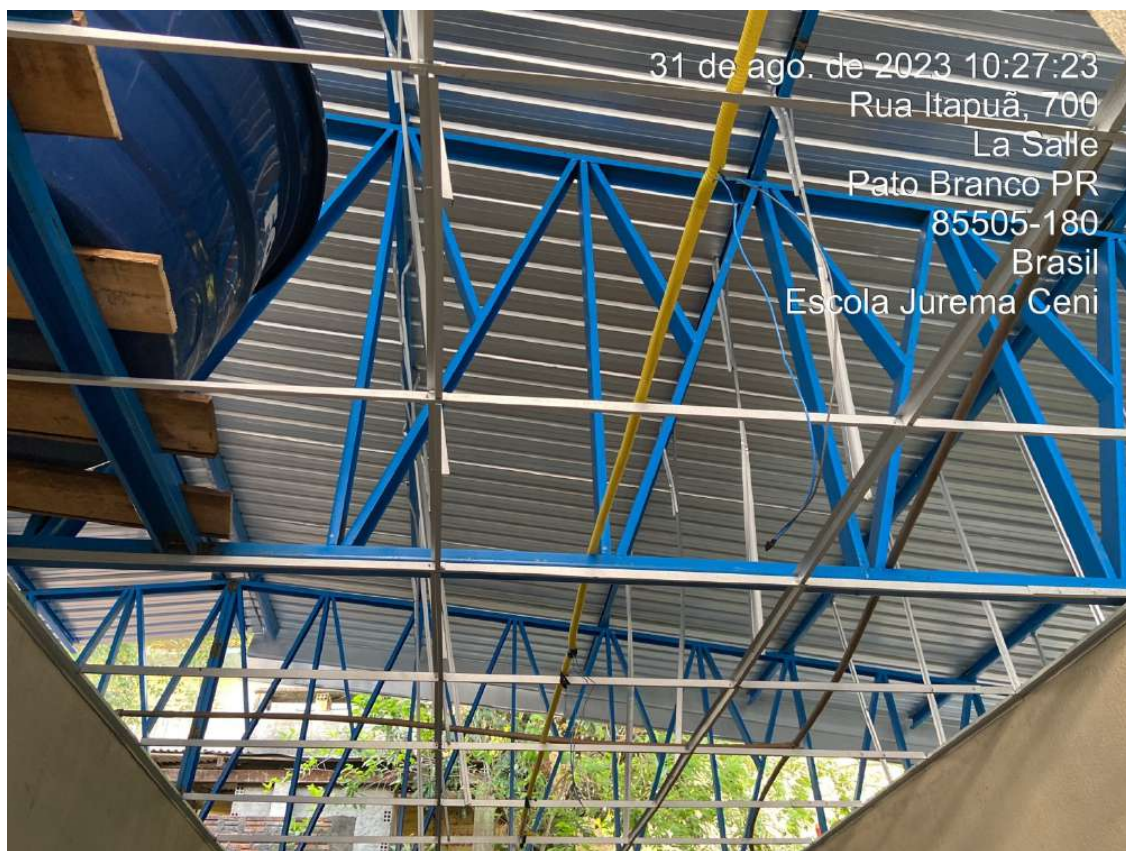



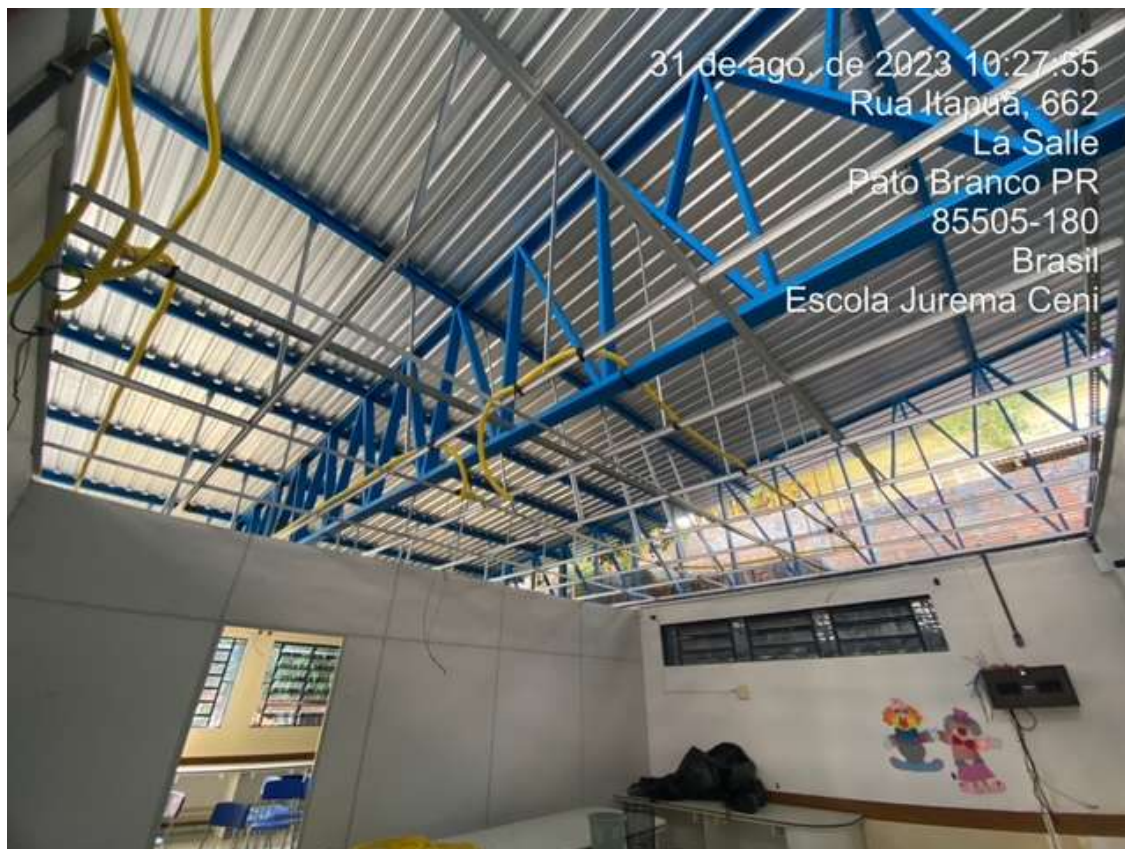

31 de ago. de 2023 10:27:55
Rua Itapua, 662
La Salle
Pato Branco PR
85505-180
Brasil
Escola Jurema Ceni



31 de ago. de 2023 10:28:08
Rua Itapuã, 662
La Salle
Pato Branco PR
85505-180
Brasil
Escola Jurema Ceni











Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.


Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 488.856,16**.

Pato Branco, 31 de agosto de 2023.

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D





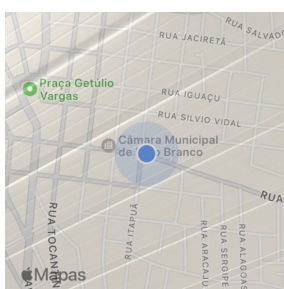



04/10/2023, 09:35
-26.229398,-52.667228
12° N
Rua Araribóia, 577
Pato Branco
Escola Jurema Ceni








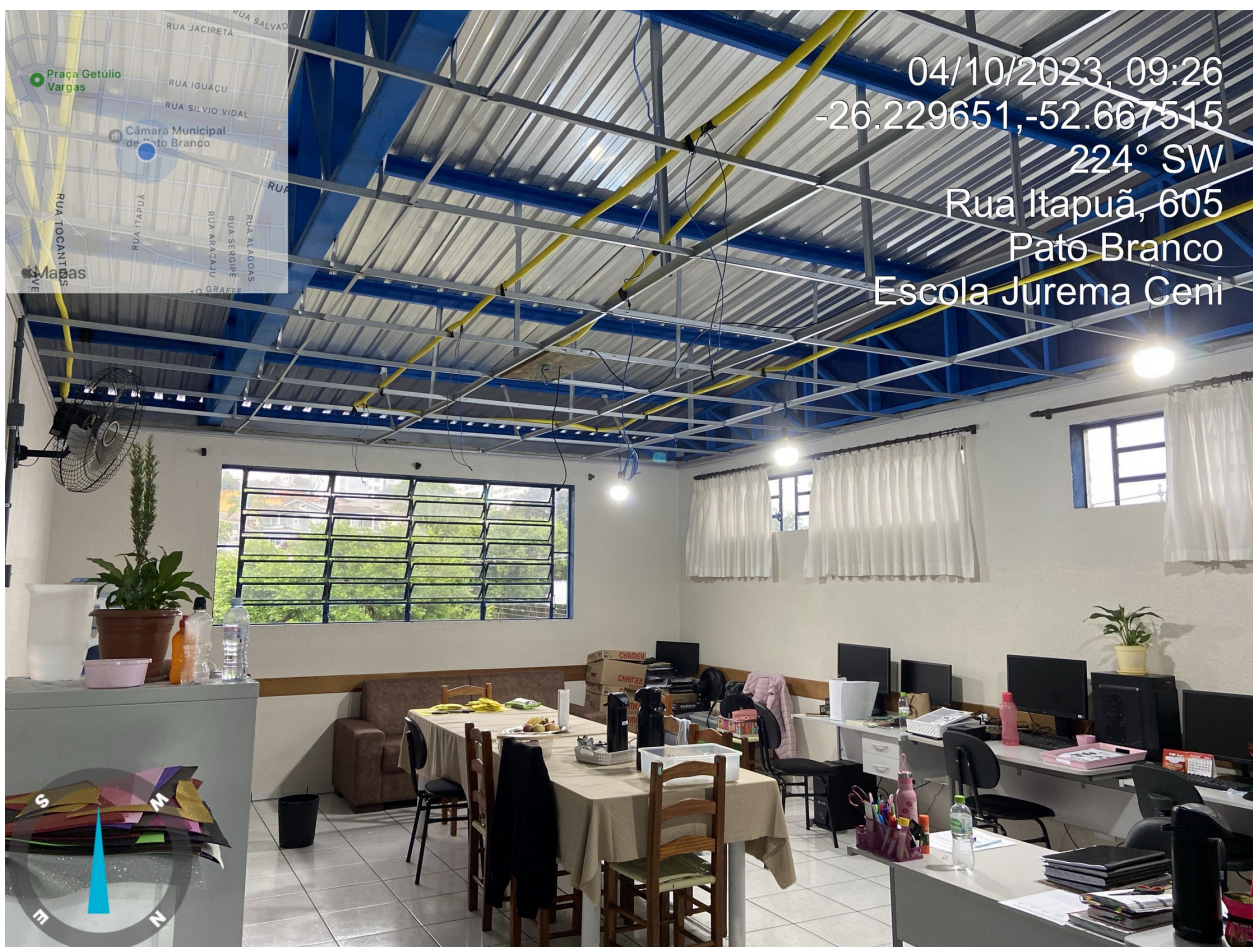

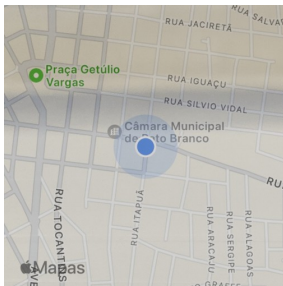

04/10/2023, 09:28
-26.229722,-52.667475
186° S
Rua Itapuã, 620
Pato Branco
Escola Jurema Ceni





BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
94	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	(SELECIONAR)		2
		PERÍODO DA MEDIÇÃO		01/09/2023 a 04/10/2023	

Realizado Acumulado: 95,65%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Escola Municipal Maria Jurema Ceni					TOTAL:	-	-	-	488.856,16	309.442,44	798.298,60
1.	TELHADOS	-	-	-	834.569,70	-	-	-	488.856,16	309.442,44	798.298,60
1.1.	Serviços Iniciais	-	-	-	9.600,00	-	-	-	-	9.120,00	9.120,00
1.1.1.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	25,00	5.000,00	-	190,00	190,00	-	4.750,00	4.750,00
1.1.2.	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,00	4.600,00	-	190,00	190,00	-	4.370,00	4.370,00
1.2.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	676.144,00	-	-	-	448.536,85	217.497,14	666.033,99
1.2.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.840,00	62,00	114.080,00	1.288,00	552,00	1.840,00	79.856,00	34.224,00	114.080,00
1.2.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	4,00	7.360,00	1.840,00	-	1.840,00	7.360,00	-	7.360,00
1.2.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	7,00	12.880,00	1.840,00	-	1.840,00	12.880,00	-	12.880,00
1.2.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.840,00	225,00	414.000,00	1.288,00	552,00	1.840,00	289.800,00	124.200,00	414.000,00
1.2.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	240,00	120,00	28.800,00	60,00	150,00	210,00	7.200,00	18.000,00	25.200,00
1.2.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	380,00	75,00	28.500,00	60,00	280,00	340,00	4.500,00	21.000,00	25.500,00
1.2.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.840,00	30,00	55.200,00	1.288,00	435,00	1.723,00	38.640,00	13.050,00	51.690,00
1.2.8.	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	40,00	86,64	3.465,60	-	40,00	40,00	-	3.465,60	3.465,60
1.2.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6.480,00	1,83	11.858,40	4.535,99	1.944,01	6.480,00	8.300,85	3.557,54	11.858,39
1.3.	Forro de PVC	-	-	-	138.367,20	-	-	-	36.347,16	82.340,30	118.687,46
1.3.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	2,12	3.900,80	1.288,00	-	1.288,00	2.730,56	-	2.730,56
1.3.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.840,00	70,03	128.855,20	460,00	1.130,00	1.590,00	32.213,80	79.133,90	111.347,70
1.3.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	840,00	6,68	5.611,20	210,00	480,00	690,00	1.402,80	3.206,40	4.609,20
1.4.	OUTROS	-	-	-	10.458,50	-	-	-	3.972,15	485,00	4.457,15
1.4.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	585,00	9,70	5.674,50	409,50	50,00	459,50	3.972,15	485,00	4.457,15
1.4.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.840,00	2,60	4.784,00	-	-	-	-	-	-

Observações:

Medição 02



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
94	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	(SELECIONAR)		2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			01/09/2023 a 04/10/2023		

Realizado Acumulado: 95,65%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Escola Municipal Maria Jurema Ceni					TOTAL:	-	-	-	488.856,16	309.442,44	798.298,60

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local

quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 185508/D
ART/RRT: 1720233708468

JAKELINE
LOUREIRO:098
02974943
Assinado de forma digital por JAKELINE LOUREIRO:09802974943
Dados: 2023.10.05 08:26:56 -03'00'



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenharía@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados na *ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUREMA CENI*, Rua Araribóia, nº 700, Bairro La Salle, no município de Pato Branco/PR, CEP: 85.505-031

Contrato nº 94/2023/GP

Relatório de Medição nº 02

Empresa Contratada: *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*
Responsável: *Lincoln Fernando Machado de Souza*

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:





























Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 309.442,44**.

Pato Branco, 04 de outubro de 2023.

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
94	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	(SELECIONAR)		3
				PERÍODO DA MEDIÇÃO	
				05/10/2023 a 20/12/2023	

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Escola Municipal Maria Jurema Ceni					TOTAL:	-	-	-	798.298,61	36.271,09	834.569,70
1.	TELHADOS	-	-	-	834.569,70	-	-	-	798.298,61	36.271,09	834.569,70
1.1.	Serviços Iniciais	-	-	-	9.600,00	-	-	-	9.120,00	480,00	9.600,00
1.1.1.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	25,00	5.000,00	190,00	10,00	200,00	4.750,00	250,00	5.000,00
1.1.2.	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	23,00	4.600,00	190,00	10,00	200,00	4.370,00	230,00	4.600,00
1.2.	Estrutura do Telhado e Telhamento	-	-	-	676.144,00	-	-	-	666.034,00	10.110,00	676.144,00
1.2.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.840,00	62,00	114.080,00	1.840,00	-	1.840,00	114.080,00	-	114.080,00
1.2.2.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	4,00	7.360,00	1.840,00	-	1.840,00	7.360,00	-	7.360,00
1.2.3.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	7,00	12.880,00	1.840,00	-	1.840,00	12.880,00	-	12.880,00
1.2.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.840,00	225,00	414.000,00	1.840,00	-	1.840,00	414.000,00	-	414.000,00
1.2.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	240,00	120,00	28.800,00	210,00	30,00	240,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00
1.2.6.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	380,00	75,00	28.500,00	340,00	40,00	380,00	25.500,00	3.000,00	28.500,00
1.2.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1.840,00	30,00	55.200,00	1.723,00	117,00	1.840,00	51.690,00	3.510,00	55.200,00
1.2.8.	CUMEEIRA DE CHAPA GALVANIZADA, #24, 0,60 MM, CORTE 60 CM, MÃO DE OBRA INCLUSA PARA INSTALAÇÃO	M	40,00	86,64	3.465,60	40,00	-	40,00	3.465,60	-	3.465,60
1.2.9.	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6.480,00	1,83	11.858,40	6.480,00	-	6.480,00	11.858,40	-	11.858,40
1.3.	Forro de PVC	-	-	-	138.367,20	-	-	-	118.687,46	19.679,74	138.367,20
1.3.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.840,00	2,12	3.900,80	1.288,00	552,00	1.840,00	2.730,56	1.170,24	3.900,80
1.3.2.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.840,00	70,03	128.855,20	1.590,00	250,00	1.840,00	111.347,70	17.507,50	128.855,20
1.3.3.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	840,00	6,68	5.611,20	690,00	150,00	840,00	4.609,20	1.002,00	5.611,20
1.4.	OUTROS	-	-	-	10.458,50	-	-	-	4.457,15	6.001,35	10.458,50
1.4.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	585,00	9,70	5.674,50	459,50	125,50	585,00	4.457,15	1.217,35	5.674,50
1.4.2.	LIMPEZA DE OBRA	M2	1.840,00	2,60	4.784,00	-	1.840,00	1.840,00	-	4.784,00	4.784,00

Observações:

Medição 03



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	TROCA DE TELHADOS	12/07/23
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
94	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA	10.783.598/0001-96	(SELECIONAR)		05/10/2023 a 20/12/2023
					3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Escola Municipal Maria Jurema Ceni					TOTAL:	-	-	-	798.298,61	36.271,09	834.569,70

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO
Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JAKELINE LOUREIRO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 185508/D
ART/RRT: 1720233708468

JAKELINE
LOUREIRO:0
9802974943

Assinado de forma digital por JAKELINE LOUREIRO:09802974943
Dados: 2023.12.20 12:03:04 -03'00'

Medição 03



Rua Ararigboia, 94, Centro • CEP 85.501-260 • Pato Branco • PR
46 3223.2509 engenhar@patobranco.pr.gov.br www.patobranco.pr.gov.br

Prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Serviços executados na *ESCOLA MUNICIPAL MARIA JUREMA CENI*, Rua Araribóia, nº 700, Bairro La Salle, no município de Pato Branco/PR, CEP: 85.505-031

Contrato nº 94/2023/GP

Relatório de Medição nº 03

Empresa Contratada: *LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA*
Responsável: *Lincoln Fernando Machado de Souza*

Medição 03

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a primeira medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra:







































29/11/2023, 13:47
-26.229631,-52.667048
138° SE
Rua Araribóia, 587
Pato Branco
Escola Jurema Ceni









12/12/2023, 09:15
-26.229606,-52.667379
164° S
Escola Jurema Ceni





Conforme Cláusula Décima Terceira do referido contrato, a contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de 60 meses.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta etapa no valor de **R\$ 36.271,10**.

Pato Branco, 20 de dezembro de 2023.

JAKELINE LOUREIRO
Engenheira Civil
CREA-PR 185508/D
